

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

C. I N° 0834/2021

Da: Secretaria de Desen. Agrário e Urbano.

Para: Secretaria Municipal de Saúde

Venho através desta, encaminhar documentos descritos na tabela abaixo, para **análise e conhecimentos**, conforme documentos em anexo.

Descrição	Dados da Empresa	Documentos em anexo
18° BM - Referente à Execução de Serviços de Construção da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO , neste município.	RDG CONSTRUTORA EIRELLI - ME; CNPJ: 23.159.046/0001-53; Dados Bancário Ag. 2208; C/c. 4006-1 Banco Bradesco	<ul style="list-style-type: none">• Nota Fiscal 294;• 18° BM;• Memória de Cálculo;• Relatório Fotográfico;• Plano de Trabalho.

Atenciosamente,


Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat: 48.911

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário de Desenvolvimento Urbano e Agrário
Matricula 48.911.

Recebido
16/10/2021
Muelene Santos
as 14:43



PREFEITURA M. DE PAUDALHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

AV. RAUL BANDEIRA N° 21 - CENTRO, CEP 55825-000 - PAUDALHO - PE
TEL.: (81) 3636.1156 CNPJ: 11.097.383/0001-84



Número da Nota:

00000294

Competência:

SET/2021

Data e Hora Emissão:

15/09/2021 07:57:50

Código de Verificação:

V9VF-ES52H

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS: **EXIGÍVEL** Regime de Tributação: **SIMPLES NACIONAL** Município de Incidência do ISS: **PAUDALHO - PE** Local da Prestação: **PAUDALHO - PE**
Número do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão do RPS: ISS Retido: **SIM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.159.046/0001-53** Inscrição Municipal: **60103161**
Nome/Razão Social: **RDG CONSTRUTORA EIRELI-ME**
Endereço: **RUA TRÊS, GUADALAJARA. 50**
Município: **PAUDALHO** UF: **PE** CEP: **55825000**
E-mail: **construtoradguilherme@gmail.com** TEL: **(00)0000-0000**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.868.234/0001-02** Inscrição Municipal: **---** Inscrição Estadual: **---**
Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
Endereço: **PRAÇA PEDRO COUTINHO, 18 CENTRO**
Município: **PAUDALHO** UF: **PE** CEP: **55825000**
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 RM 18
QTD.:1 - VAL.UND.:R\$21.010,67 - TOTAL:R\$21.010,67 - RETENCOES:R\$0,00 - DEDUCAO:R\$12.606,40

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE, NOS TERMOS DA PROPOSTA N 07868.234001/17-711. BM 18.

MATERIAL 60%
MAO DE OBRA 40%

BRABESCO
AG 2208
CC 4006-1

ISS RETIDO PELO TOMADOR
INSS RETIDO PELO TOMADOR
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

15/09/21
ENTREGUE

Paulo Vantuzi de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 1565 D/PE
Mat. 4498

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 21.010,67

Atividade Prestada:		Código CNAE:			
4213800 -					
702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras					
Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
19.665,99	12.606,40	8.404,27	5,00%	420,21	
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)	
0,00	924,47	0,00	0,00	0,00	
Outras Retenções(R\$)					
0,00					

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Código Tributário Municipal
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- Optante pelo Simples Nacional.

24347194857722

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-Paudalho/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica.



BOLETIM DE MEDIÇÃO BM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição	Nº do CT	Data do CT
		18	9/9/2021	De 1/7/2021 até 31/7/2021	021/2019	20/5/2019
Início da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada	CNPJ	Tomador		
28/5/2019	10/1/2022	RDG CONSTRUTORA EIRELE	23.159.046/0001-53	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		
Valor contr. inicial (R\$)	Data da assinatura	Objeto do CTEF (resumido)				
R\$ 642.994,60	20/5/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO				
Acum. Valor Contrato(R\$)	Medido no período (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	CT-Dt último Adit.	Local da obra (Bairro / Município / UF)	Valor Boletim	
R\$ 622.450,27	R\$ 21.010,67	R\$ 20.544,33		CENTRO - PAUDALHO/PE	R\$ 21.010,67	

Item Sub	Descrição	Unid	Qtdes	Previsto no Orçamento		Diferenças a atualizar	Preço total a atualizar	Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio (%)
				Preço Unitário	Preço Total			Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 10.583,23						R\$ 10.523,35	R\$ -	R\$ 10.523,35	
1.1	CANTEIRO DE OBRAS													
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	R\$ 385,53	R\$ 2.313,18			6,00		6,00	R\$ 2.313,18		R\$ 2.313,18	100,00%
1.1.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM. COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	55,74	R\$ 55,94	R\$ 3.118,09			54,67		54,67	R\$ 3.058,23		R\$ 3.058,23	98,08%
1.1.3	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍEDOS SOBRE AREIA.	M²	228,79	R\$ 13,72	R\$ 3.138,99			228,79		228,79	R\$ 3.138,99		R\$ 3.138,99	100,00%
1.1.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	352,88	R\$ 4,44	R\$ 1.566,79			352,88		352,88	R\$ 1.566,77		R\$ 1.566,77	100,00%
1.1.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	10,12	R\$ 44,09	R\$ 446,18			10,12		10,12	R\$ 446,18		R\$ 446,18	100,00%
2.0	INFRAESTRUTURA:				R\$ 51.032,64						R\$ 50.549,96		R\$ 50.549,96	
2.1	ESCAVAÇÃO/REATERRO/ATERRO				R\$ 6.745,49						R\$ 6.742,22		R\$ 6.742,22	
2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	93,59	R\$ 65,30	R\$ 6.111,42			93,54		93,54	R\$ 6.108,15		R\$ 6.108,15	99,95%
2.1.2	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	15,73	R\$ 40,31	R\$ 634,07			15,73		15,73	R\$ 634,07		R\$ 634,07	100%
2.2	LASTRO/FORMA/ARMAÇÃO/CONCRETAGEM/IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 44.287,15						R\$ 43.807,74		R\$ 43.807,74	
2.2.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	5,05	R\$ 283,10	R\$ 1.429,66			4,95		4,95	R\$ 1.401,34		R\$ 1.401,34	98,02%
2.2.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	47,95	R\$ 356,36	R\$ 17.067,47			47,42		47,42	R\$ 16.898,54		R\$ 16.898,54	98,8943%
2.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	19,09	R\$ 103,12	R\$ 1.968,56			19,09		19,09	R\$ 1.968,56		R\$ 1.968,56	100,00%
2.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	83,22	R\$ 47,16	R\$ 3.924,65			83,22		83,22	R\$ 3.924,64		R\$ 3.924,64	100,00%
2.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	378,00	R\$ 7,08	R\$ 2.676,24			378,00		378,00	R\$ 2.676,24		R\$ 2.676,24	100,00%
2.2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	-	R\$ 10,33	R\$ -									
2.2.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	48,92	R\$ 174,73	R\$ 8.547,79			47,42		47,42	R\$ 8.285,66		R\$ 8.285,66	96,93%
2.2.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	673,21	R\$ 5,42	R\$ 3.648,79			673,21		673,21	R\$ 3.648,78		R\$ 3.648,78	100,00%
2.2.9	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	73,74	R\$ 67,86	R\$ 5.003,99			73,74		73,74	R\$ 5.003,98		R\$ 5.003,98	100,00%
2.2.10	LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO	M2			R\$ -									
3.0	PAREDES E PAINÉIS				R\$ 45.467,43						R\$ 45.428,30		R\$ 45.428,30	
3.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO/ALVENARIA DE VEDAÇÃO													
3.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	47,64	R\$ 66,26	R\$ 3.156,62			47,05		47,05	R\$ 3.117,52		R\$ 3.117,52	98,76%
3.1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	646,46	R\$ 65,45	R\$ 42.310,81			646,46		646,46	R\$ 42.310,78		R\$ 42.310,78	100,00%
4.0	VERGAS, CONTRAVERGAS E PEITORIS				R\$ 4.296,06						R\$ 4.296,05		R\$ 4.296,05	
4.1	VERGAS/CONTRA VERGAS													

Francisco Henrique C. I. da S

Eng. Civil
CREA - PE 38306

RDG CONSTRUTORA EIRELI

Carlos Fritsch
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mar - 43 911



BOLETIM DE MEDIÇÃO BM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição		Nº do CT	Data do CT							
		18	9/9/2021	De 1/7/2021	até 31/7/2021	021/2019	20/5/2019							
Início da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada		CNPJ		Tomador								
28/5/2019	10/1/2022	RDG CONSTRUTORA EIRELE		23.159.046/0001-53		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO								
Valor contr. inicial (R\$)		Data da assinatura	Objeto do CTEF (resumido)											
R\$ 642.994,60		20/5/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO											
Acum. Valor Contrato(R\$)	Medido no período (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	CT-Dt último Adit.	Local da obra (Bairro / Município / UF)		Valor Boletim								
R\$ 622.450,27	R\$ 21.010,67	R\$ 20.544,33		CENTRO - PAUDALHO/PE		R\$ 21.010,67								
Discriminação dos serviços do Orçamento			Previsto no Orçamento		Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio	
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
4.1.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	128,00	R\$ 29,59	R\$ 3.787,52			128,00		128,00	R\$ 3.787,52		R\$ 3.787,52	100,00%
4.1.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	28,05	R\$ 18,13	R\$ 508,54			28,05		28,05	R\$ 508,53		R\$ 508,53	100,00%
5.0	COBERTURAS E PROTEÇÃO				R\$ 26.791,63						R\$ 26.351,40		R\$ 26.351,40	
5.1	ESTRUTURA DE COBERTA/TELHAMENTO/IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 20.967,97						R\$ 20.967,94		R\$ 20.967,94	
5.1.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	237,06	R\$ 16,48	R\$ 3.906,75			237,06		237,06	R\$ 3.906,74		R\$ 3.906,74	100,00%
5.1.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	237,06	R\$ 15,60	R\$ 3.698,14			237,06		237,06	R\$ 3.698,13		R\$ 3.698,13	100,00%
5.1.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 14 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	237,06	R\$ 56,37	R\$ 13.363,08			237,06		237,06	R\$ 13.363,07		R\$ 13.363,07	100,00%
5.2	CALHAS/RUFOS/PINGADEIRAS				R\$ 5.823,66						R\$ 5.383,46		R\$ 5.383,46	
5.2.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_08/2016	M	-	R\$ 84,55	R\$ -									
5.2.2	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	62,00	R\$ 65,53	R\$ 4.062,86			62,00		62,00	R\$ 4.062,86		R\$ 4.062,86	100,00%
5.2.3	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	62,00	R\$ 28,40	R\$ 1.760,80			46,50		46,50	R\$ 1.320,60		R\$ 1.320,60	75,00%
6.0	ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS				R\$ 43.336,24						R\$ 32.749,91	R\$ 7.843,08	R\$ 40.592,99	
6.1	PORTAS/JANELAS				R\$ 34.876,70						R\$ 29.118,79	R\$ 5.476,29	R\$ 34.595,08	
6.1.1	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	-	R\$ 885,25	R\$ -			1,44		1,44	R\$ 957,96		R\$ 957,96	
6.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6,00	R\$ 708,20	R\$ 4.249,20			6,00		6,00	R\$ 4.249,20		R\$ 4.249,20	100,00%
6.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	15,00	R\$ 739,98	R\$ 11.099,70			15,00		15,00	R\$ 11.099,70		R\$ 11.099,70	100,00%
6.1.4	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2	21,11	R\$ 925,05	R\$ 19.527,80			13,85	5,92	19,77	R\$ 12.811,93	R\$ 5.476,29	R\$ 18.288,22	93,65%
6.2	VIDROS/ESPELHOS/FERRAGENS				R\$ 4.549,47						R\$ 2.139,35		R\$ 2.139,35	
6.2.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	18,65	R\$ 243,94	R\$ 4.549,47				8,77	8,77	R\$ 2.139,35		R\$ 2.139,35	47,02%
6.2.2	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	-	R\$ 302,16	R\$ -									
6.3	PINTURA DE ESQUADRIAS				R\$ 3.910,07						R\$ 3.631,12	R\$ 227,44	R\$ 3.858,56	
6.3.1	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	100,80	R\$ 22,42	R\$ 2.259,94			100,80		100,80	R\$ 2.259,93		R\$ 2.259,93	100,00%
6.3.2	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	42,95	R\$ 38,42	R\$ 1.650,13			35,69	5,92	41,61	R\$ 1.371,19	R\$ 227,44	R\$ 1.598,63	96,88%
7.0	FORROS E REVESTIMENTO DE TETOS				R\$ 23.315,32						R\$ 21.604,35	R\$ 1.690,28	R\$ 23.294,63	
7.1	PARA LAJES(REGULARIZAÇÕES/ACABAMENTOS)													

Francisco Henrique Silva
Eng. Civ

CREA - PE 38306

RDG CONSTRUTORA EIREL!

Carlos Pinheiro Alves Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbanismo e Arqueologia
Mat. 46.511



BOLETIM DE MEDIÇÃO BM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição		Nº do CT	Data do CT							
		18	9/9/2021	De 1/7/2021	até 31/7/2021	021/2019	20/5/2019							
Início da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada		CNPJ		Tomador								
28/5/2019	10/1/2022	RDG CONSTRUTORA EIRELE		23.158.046/0001-53		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO								
Valor contr. inicial (R\$)		Data da assinatura	Objeto do CTEF (resumido)											
R\$ 642.984,60		20/5/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO											
Acum. Valor Contrato(R\$)	Medido no período (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	CT-Dt último Adit.	Local da obra (Bairro / Município / UF)		Valor Boletim								
R\$ 622.450,27	R\$ 21.010,67	R\$ 20.544,33		CENTRO - PAUDALHO/PE		R\$ 21.010,67								
Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Diferença a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
7.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	6,51	R\$ 3,17	R\$ 20,64									
7.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	416,87	R\$ 15,57	R\$ 6.490,66			416,87		416,87	R\$ 6.490,65		R\$ 6.490,65	100,00%
7.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	416,87	R\$ 12,57	R\$ 5.240,05			282,40	134,47	416,87	R\$ 3.549,76	R\$ 1.690,28	R\$ 5.240,04	100,00%
7.1.4	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	416,87	R\$ 27,74	R\$ 11.563,97			416,87		416,87	R\$ 11.563,94		R\$ 11.563,94	100,00%
8.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS				R\$ 106.945,97						R\$ 104.438,44		R\$ 104.438,44	
8.1	PARA REGULARIZAÇÕES DE PAREDES(CHAPISCO/EMBOÇO/ETC)				R\$ 54.652,39						R\$ 54.515,79		R\$ 54.515,79	
8.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.321,31	R\$ 3,17	R\$ 4.188,55			1.312,89		1.312,89	R\$ 4.161,86		R\$ 4.161,86	99,36%
8.1.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	701,86	R\$ 26,20	R\$ 18.388,73			701,86		701,86	R\$ 18.388,73		R\$ 18.388,73	100,00%
8.1.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	818,28	R\$ 30,27	R\$ 24.769,33			814,65		814,65	R\$ 24.659,43		R\$ 24.659,43	99,56%
8.1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO LATERAL (PLATIBANDAS - LADO TERRA E LADO AR) EM ESTRUTURA EM PAINÉIS DE ALUMINUM COMPOSITE MATERIAL - ACM REYNOBOND, DE FABRICAÇÃO ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COMPOSTO POR COM DUAS CHAPAS DE ALUMÍNIO DE 0,5MM DE ESPESSURA CADA E UM NÚCLEO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ACABAMENTO COM PINTURA EXTERNA EM PDVF - FLUÓR CARBONO - KYNAR 500 - E INTERNA EM POLIÉSTER, CHAPAS COM DIMENSÕES (125x350)CM, FIXADO EM ESTRUTURA AUXILIAR DE METALON, NA COR SEAFOAM GREEN METALIC (REF.: 604), ALUCOBOND OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE ESTRUTURA AUXILIAR EM METALON	M2	20,99	R\$ 348,06	R\$ 7.305,78			20,99		20,99	R\$ 7.305,77		R\$ 7.305,77	100,00%
8.2	PARA ACABAMENTOS DE PAREDES (PINTURA/REVESTIMENTO CERÂMICO)				R\$ 52.293,58						R\$ 49.922,65		R\$ 49.922,65	
8.2.1	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, BRANCA, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOÇO PRONTO	M2	701,86	R\$ 51,82	R\$ 36.370,38			701,86		701,86	R\$ 36.356,88		R\$ 36.356,88	99,96%
8.2.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	716,65	R\$ 11,03	R\$ 7.893,61			538,98		538,98	R\$ 5.944,94		R\$ 5.944,94	75,31%
8.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	716,65	R\$ 11,22	R\$ 8.029,59			679,22		679,22	R\$ 7.620,83		R\$ 7.620,83	94,91%
9.0	PAVIMENTAÇÃO INTERNA				R\$ 54.120,78						R\$ 53.836,17		R\$ 53.836,17	
9.1	LASTROS/CONTRAPISOS/PISOS				R\$ 54.120,78						R\$ 53.836,17		R\$ 53.836,17	
9.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS. AF_08/2017	M3	11,44	R\$ 440,47	R\$ 5.038,98			11,44		11,44	R\$ 5.038,97		R\$ 5.038,97	100,00%

Francisco Henrique de M. Filho
Eng. Civil

RDG CONSTRUTORA EIRELI

Paulo Varizete de M. Filho
Engenheiro Civil
REA 180638634-8/PE
Mat. 48.386Carlos Fimino Guimarães
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat. 48.311



BOLETIM DE MEDIÇÃO BM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição		Nº do CT	Data do CT								
		18	9/9/2021	De	1/7/2021 até 31/7/2021	021/2019	20/5/2019								
Início da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada		CNPJ		Tomador									
28/5/2019	10/1/2022	RDG CONSTRUTORA EIRELE		23.159.046/0001-53		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO									
Valor contr. inicial (R\$)	Data da assinatura		Objeto do CTEF (resumido)												
R\$ 642.994,60	20/5/2019		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO												
Acum. Valor Contrato(R\$)	Medido no período (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	CT-Dt último Adit.		Local da obra (Bairro / Município / UF)		Valor Boletim								
R\$ 622.450,27	R\$ 21.010,67	R\$ 20.544,33			CENTRO - PAUDALHO/PE		R\$ 21.010,67								
Discriminação dos serviços do Orçamento			Previsto no Orçamento			Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio		
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)	
9.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	M2	381,51	R\$ 36,58	R\$ 13.955,64			381,51		381,51	R\$ 13.955,62		R\$ 13.955,62	100,00%	
9.1.3	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	416,93	R\$ 84,25	R\$ 35.126,16			413,55		413,55	R\$ 34.841,58		R\$ 34.841,58	99,19%	
9.2	SOLEIRAS/RODAPÉS				R\$ -										
9.2.1	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	-	R\$ 64,23	R\$ -										
10.0	LOUÇAS E METAIS				R\$ 14.201,95						R\$ 10.340,58		R\$ 2.661,12	R\$ 13.001,70	
10.1	VASOS SANITÁRIOS/LAVATÓRIO/CUBA/CHUVEIRO/TORNEIRAS														
10.1.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00	R\$ 406,66	R\$ 1.219,98			3,00		3,00	R\$ 1.219,98		R\$ 1.219,98	100,00%	
10.1.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00	R\$ 642,84	R\$ 2.571,36			4,00		4,00	R\$ 2.571,36		R\$ 2.571,36	100,00%	
10.1.3	BANCADA/BANCAPIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE "0,55 X 2,00" M	UN	-	R\$ 469,17	R\$ -										
10.1.4	BANCADA/BANCAPIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA LISA (SEM ESCORREDOR), DE "0,55 X 1,20" M	UN	-	R\$ 168,83	R\$ -										
10.1.5	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	9,00	R\$ 96,46	R\$ 866,14			9,00		9,00	R\$ 866,14		R\$ 866,14		
10.1.6	BANCADA/TAMPO AÇO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PÉS DE APOIO)	M	-	R\$ 747,54	R\$ -										
10.1.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, MOLDENOX OU SIMILAR, COM PAREDE DE 3MM E COMPRIMENTO DE 60 CM.	UN	12,00	R\$ 224,40	R\$ 2.692,80			8,00		8,00	R\$ 1.795,20		R\$ 1.795,20	66,67%	
10.1.8	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ COLUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= "2,5" CM	M2	6,25	R\$ 521,79	R\$ 3.261,17			0,75	5,10	5,85	R\$ 391,34		R\$ 2.661,12	R\$ 3.052,46	93,60%
10.1.9	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 74,62	R\$ 74,62			1,00		1,00	R\$ 74,62		R\$ 74,62	100,00%	
10.1.10	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	R\$ 70,81	R\$ 1.274,58			18,00		18,00	R\$ 1.274,58		R\$ 1.274,58	100,00%	
10.1.11	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	18,00	R\$ 56,87	R\$ 1.023,66			18,00		18,00	R\$ 1.023,66		R\$ 1.023,66	100,00%	
10.1.12	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00	R\$ 110,37	R\$ 1.103,70			10,00		10,00	R\$ 1.103,70		R\$ 1.103,70	100,00%	

Francisco Henrique C. K. da Silva

Eng. Civil

CREA - PE 20200

RDG CONSTRUTORA EIRELI

Luís José Vda. Marinho
Engenheiro Civil
CREA 100639634-3/PE
Mat. 48.386

Carlos Fimberly Lopes Gouvêa
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat. 43.311



BOLETIM DE MEDIÇÃO BM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição	Nº do CT	Data do CT							
			18	9/9/2021	De 1/7/2021 até 31/7/2021	021/2019	20/5/2019							
Inicio da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada	CNPJ		Tomador									
28/5/2019	10/1/2022	RDG CONSTRUTORA EIRELE	23.159.046/0001-53		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO									
Valor contr. inicial (R\$)	Data da assinatura	Objeto do CTEF (resumido)												
R\$ 642.994,60	20/5/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO												
Acum. Valor Contrato (R\$)	Medido no período (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	CT-Dt último Adit.	Local da obra (Bairro / Município / UF)			Valor Boletim							
R\$ 622.450,27	R\$ 21.010,67	R\$ 20.544,33		CENTRO - PAUDALHO/PE			R\$ 21.010,67							
Discriminação dos serviços do Orçamento			Previsão no Orçamento				Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
10.1.13	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	11,00	R\$ 8,54	R\$ 93,94									
11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				R\$ 6.045,54						62,00	R\$ 4.332,53		R\$ 4.332,53
11.1	INSTALAÇÕES DE ÁGUA													
11.1.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	38,00	R\$ 111,03	R\$ 4.219,14			33,00		33,00	R\$ 3.663,99		R\$ 3.663,99	86,84%
11.1.2	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (4) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	R\$ 107,62	R\$ 107,62									
11.1.3	HIDRÔMETRO DN 25 (4), 5,0 M/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	R\$ 133,89	R\$ 133,89									
11.1.4	RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO ELEVADO CILÍNDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M COMPLETO E CISTERNA CAP.=4,5 M3	UN	-	R\$ 25.541,48	R\$ -									
11.1.5	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	R\$ 39,73	R\$ 39,73			1,00		1,00	R\$ 39,73		R\$ 39,73	100,00%
11.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	36,00	R\$ 11,79	R\$ 424,44									
11.1.7	KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO COM REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	-	R\$ 172,83	R\$ -									
11.1.8	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 26,57	R\$ 53,14			1,00		1,00	R\$ 26,57		R\$ 26,57	50,00%
11.1.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	17,00	R\$ 31,22	R\$ 530,74			17,00		17,00	R\$ 530,74		R\$ 530,74	100,00%
11.1.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	R\$ 132,25	R\$ 132,25									
11.1.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	R\$ 80,78	R\$ 80,78									
11.1.12	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	R\$ 66,70	R\$ 66,70									
11.1.13	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	R\$ 53,11	R\$ 53,11									
11.1.14	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00	R\$ 7,15	R\$ 71,50			10,00		10,00	R\$ 71,50		R\$ 71,50	100,00%

Francisco Henrique C. da Silva
Eng. Civil

RDG CONSTRUTORA EIRELI

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 180638634-8/PE
Mat. 48.386

Celso Farias dos Santos Couveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbanos e Agrário
Mat. 48.911



BOLETIM DE MEDIÇÃO BM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição		Nº do CT	Data do CT
		18	9/9/2021	De 1/7/2021 até 31/7/2021		021/2019	20/5/2019
Início da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada		CNPJ	Tomador		
28/5/2019	10/1/2022	RDG CONSTRUTORA EIRELE		23.159.046/0001-53	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		
Valor contr. inicial (R\$)	Data da assinatura		Objeto do CTEF (resumido)				
R\$ 642.994,60	20/5/2019		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO				
Acum. Valor Contrato(R\$)	Medido no período (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	CT-Dt último Adit.	Local da obra (Bairro / Município / UF)			Valor Boletim
R\$ 622.450,27	R\$ 21.010,67	R\$ 20.544,33		CENTRO - PAUDALHO/PE			R\$ 21.010,67

Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
11.1.15	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 5,83	R\$ 46,64									
11.1.16	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 6,05	R\$ 12,10									
11.1.17	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 2,88	R\$ 17,28									
11.1.18	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 4,19	R\$ 8,38									
11.1.19	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 7,92	R\$ 15,84									
11.1.20	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 7,28	R\$ 14,56									
11.1.21	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015	UN	2,00	R\$ 8,85	R\$ 17,70									
12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				R\$ 15.547,83						R\$ 14.376,41		R\$ 14.376,41	
12.1	INSTALAÇÕES DE ESGOTO													
12.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	63,00	R\$ 44,67	R\$ 2.814,21			42,79		42,79	R\$ 1.911,42		R\$ 1.911,42	67,92%
12.1.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	48,38	R\$ 48,85	R\$ 2.363,36			48,34		48,34	R\$ 2.361,40		R\$ 2.361,40	99,92%
12.1.3	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	R\$ 198,27	R\$ 1.189,62			5,00		5,00	R\$ 991,35		R\$ 991,35	83,33%
12.1.4	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 8,54	R\$ 8,54			1,00		1,00	R\$ 8,54		R\$ 8,54	100,00%
12.1.5	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1,00	R\$ 9.103,70	R\$ 9.103,70			1,00		1,00	R\$ 9.103,70		R\$ 9.103,70	100,00%
12.1.6	RALO FOFO SEMIESFÉRICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	4,00	R\$ 17,10	R\$ 68,40									
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICA, TELEFONICA, TV E LÓGICA				R\$ 61.276,52						R\$ 59.715,22		R\$ 59.715,22	
13.1	INSTALAÇÕES ELETRICAS				R\$ 58.859,82						R\$ 57.790,57		R\$ 57.790,57	
13.1.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	110,00	R\$ 121,45	R\$ 13.359,50			110,00		110,00	R\$ 13.359,50		R\$ 13.359,50	100,00%

Francisco Henrique C. I. da Silva

Eng. Civil
CREA - PE 38306

RDG CONSTRUTORA EIRELI

Carlos Pinheiro
Secretaria Municipal de Planejamento
Urbanismo e Agrário
Local: 48.911



BOLETIM DE MEDIÇÃO BM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição	Nº do CT	Data do CT
		18	9/9/2021	De 1/7/2021 até 31/7/2021	021/2019	20/5/2019
Início da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada		CNPJ	Tomador	
28/5/2019	10/1/2022	RDG CONSTRUTORA EIRELE		23.158.046/0001-53	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	
Valor contr. inicial (R\$)		Data da assinatura	Objeto do CTEF (resumido)			
R\$ 642.994,60		20/5/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO			
Acum. Valor Contrato(R\$)	Medido no período (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	CT-Dt último Adit.	Local da obra (Bairro / Município / UF)		Valor Boletim
R\$ 622.450,27	R\$ 21.010,67	R\$ 20.544,33		CENTRO - PAUDALHO/PE		R\$ 21.010,67

Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Previsto no Orçamento		Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio (%)	
				Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período		Acum inclui o período
13.1.2	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	R\$ 55,44	R\$ 221,76			4,00		4,00	R\$ 221,76		R\$ 221,76	100,00%
13.1.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00	R\$ 25,48	R\$ 484,12			19,00		19,00	R\$ 484,12		R\$ 484,12	100,00%
13.1.4	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	56,00	R\$ 142,87	R\$ 8.000,72			56,00		56,00	R\$ 8.000,72		R\$ 8.000,72	100,00%
13.1.5	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	41,00	R\$ 145,61	R\$ 5.970,01			41,00		41,00	R\$ 5.970,01		R\$ 5.970,01	100,00%
13.1.6	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	R\$ 198,27	R\$ 991,35									
13.1.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	6,00	R\$ 13,40	R\$ 80,40			5,00		5,00	R\$ 67,00		R\$ 67,00	83,33%
13.1.8	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	-	R\$ 67,26	R\$ -									
13.1.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	-	R\$ 69,14	R\$ -									
13.1.10	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	-	R\$ 1.113,79	R\$ -									
13.1.11	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 900,22	R\$ 900,22			1,00		1,00	R\$ 900,22		R\$ 900,22	100,00%
13.1.12	FORNECIMENTO DE LUMINARIA QUADRADA DE EMBUTIR DE ALUMINIO PINTADO, DIFUSOR ACRILICO LEITOSO COR BRANCA, EDO 42-2X20W, LUMALUX OU SIM, INC LUSIVE LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA DE 20W, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO	UN	110,00	R\$ 137,84	R\$ 15.162,40			110,00		110,00	R\$ 15.162,40		R\$ 15.162,40	100,00%
13.1.13	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm	M	122,00	R\$ 103,98	R\$ 12.685,56			122,00		122,00	R\$ 12.685,56		R\$ 12.685,56	100,00%
13.1.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	31,00	R\$ 14,30	R\$ 443,30			31,00		31,00	R\$ 443,30		R\$ 443,30	100,00%
13.1.15	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	15,00	R\$ 4,30	R\$ 64,50									
13.1.16	POSTE DE CONCRETO SECCAO DUPLO T, 100/6, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO DE 1,40 M, INCLUSIVE COLOCACAO.	UN	1,00	R\$ 495,98	R\$ 495,98			1,00		1,00	R\$ 495,98		R\$ 495,98	100,00%
13.2	INSTALAÇÕES TELEFONICA/TV/LÓGICA				R\$ 2.416,70						R\$ 1.924,65		R\$ -	R\$ 1.924,65

Francisco Henrique C. I. da Silva
 Eng. Civil
 CREA - PE 30306

RDG CONSTRUTORA EIRELI

Carlos Pinheiro Campy
 Secretário Municipal de Desenvolvimento
 Urbano e Agrário
 MPA: 48.911



BOLETIM DE MEDIÇÃO BM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição		Nº do CT	Data do CT							
		18	9/9/2021	De	1/7/2021 até 31/7/2021	021/2019	20/5/2019							
Início da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada		CNPJ		Tomador								
28/5/2019	10/1/2022	RDG CONSTRUTORA EIRELE		23.159.046/0001-53		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO								
Valor contr. inicial (R\$)		Data da assinatura	Objeto do CTEF (resumido)											
R\$ 842.994,60		20/5/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO											
Acum. Valor Contrato(R\$)	Medido no período (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	CT-Dt último Adit.		Local da obra (Bairro / Município / UF)		Valor Boletim							
R\$ 622.450,27	R\$ 21.010,67	R\$ 20.544,33			CENTRO - PAUDALHO/PE		R\$ 21.010,67							
Discriminação dos serviços do Orçamento			Previsto no Orçamento		Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio	
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
13.2.1	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE RJ11 INCLUINDO TOMADA 10A/250V, TOMADA, CABOS, RASGO NA ALVENARIA E CHUMBAMENTO, ELETRODUTO, CABO.	PT	5,00	R\$ 98,41	R\$ 492,05									
13.2.2	PONTO DE TOMADA PARA REDE LÓGICA INCLUINDO TOMADA, CABOS, RASGO NA ALVENARIA E CHUMBAMENTO, ELETRODUTO, CABO	PT	13,00	R\$ 148,05	R\$ 1.924,65			13,00		13,00	R\$ 1.924,65		R\$ 1.924,65	100,00%
14.0	COMPLEMENTAÇÕES				R\$ 5.985,75						R\$ 4.779,75	R\$ 1.061,44	R\$ 5.841,19	
14.1	CORRIMÃO/ACESSIBILIDADE/SINALIZAÇÃO/LIMPESA FINAL DA OBRA													
14.1.1	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	M	24,10	R\$ 198,33	R\$ 4.779,74			24,10		24,10	R\$ 4.779,75		R\$ 4.779,75	100,00%
14.1.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	459,56	R\$ 2,63	R\$ 1.206,01				403,59	403,59		R\$ 1.061,44	R\$ 1.061,44	88,01%
16.1	REPLANILHAMENTO				R\$ 174.047,71						R\$ 158.117,18	R\$ 7.754,75	R\$ 165.871,93	
16.1	ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ CAIXAS D'ÁGUA DE 5.000 LITROS, COMPOSTA DE CAPTEL PIAPOIO DA CAIXA D'ÁGUA E PILAR FORNECIMENTO E MONTAGEM NO LOCAL.	UND	1,00	R\$ 6.279,99	R\$ 6.279,99			1,00		1,00	R\$ 6.279,99		R\$ 6.279,99	100,00%
16.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES, SUB-SOLOS, JARDINEIRAS, RESERVATÓRIOS E CANAIS DE IRRIGAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ESP 4 MM, APLICADA COM MACARICO, PINTADO COM PRIMER, INCLUINDO PROTEÇÃO MECÂNICA, MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	57,08	R\$ 77,06	R\$ 4.398,58			56,00		56,00	R\$ 4.315,36		R\$ 4.315,36	98,11%
16.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA.	M2	16,40	R\$ 500,47	R\$ 8.207,70			16,40		16,40	R\$ 8.207,70		R\$ 8.207,70	100,00%
16.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO D'ÁGUA CILÍNDRICO, CAPACIDADE DE 5000 L, INCLUSIVE COLOCAÇÃO E MONTAGEM DAS TUBULAÇÕES E CONEXÕES (ADAPTADORES DE PVC COM FLANGES E ANÉIS DE 3/4"Ø1 UN), 1"Ø2UN) E 1 1/2"Ø1 UN))	UND	1,00	R\$ 2.055,33	R\$ 2.055,33			1,00		1,00	R\$ 2.055,33		R\$ 2.055,33	100,00%
16.5	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE '20' KA (TIPO AC)	UND	4,00	R\$ 88,25	R\$ 353,00			4,00		4,00	R\$ 353,00		R\$ 353,00	100,00%
16.6	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2016	UND	1,00	R\$ 104,58	R\$ 104,58			1,00		1,00	R\$ 104,58		R\$ 104,58	100,00%
16.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A	UND	1,00	R\$ 153,03	R\$ 153,03			1,00		1,00	R\$ 153,03		R\$ 153,03	100,00%
16.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DR, TIPO AC, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30mA, TETRAPOLAR, CORRENTE NOMINAL 63A, FAB. SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	1,00	R\$ 262,11	R\$ 262,11									
16.9	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 16A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UND	6,00	R\$ 87,62	R\$ 525,72			6,00		6,00	R\$ 525,72		R\$ 525,72	100,00%
16.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$ 14,88	R\$ 29,36									
16.11	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PONTO SECO EMBUTIDO DE ANTENA EXTERNA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4"	UND	2,00	R\$ 98,24	R\$ 196,48			2,00		2,00	R\$ 196,48		R\$ 196,48	100,00%

Francisco Henrique C. I. da Sil
Eng. Civil
CREA - PE 38306

RDG CONSTRUTORA EIRELI

Paulo Vidal Mariano
Engenheiro Civil
CREA 188938634-8/PE
Mat. 48.386

Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbanismo e Agrário
Mat. 48.911



BOLETIM DE MEDIÇÃO BM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição		Nº do CT	Data do CT						
			18	9/9/2021	De	1/7/2021 até	021/2019	20/5/2019						
Início da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada		CNPJ		Tomador								
28/5/2019	10/1/2022	RDG CONSTRUTORA EIRELE		23.159.046/0001-53		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO								
Valor contr. inicial (R\$)	Data da assinatura		Objeto do CTEF (resumido)											
R\$ 642.994,60	20/5/2019		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO											
Acum. Valor Contrato (R\$)	Medido no período (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	CT-Dt último Adit.		Local da obra (Bairro / Município / UF)		Valor Boletim							
R\$ 622.450,27	R\$ 21.010,67	R\$ 20.544,33			CENTRO - PAUDALHO/PE		R\$ 21.010,67							
Discriminação dos serviços do Orçamento			Previsto no Orçamento		Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio		
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
16.12	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS, DIAM.100 MM, PARA COLUNAS DE ESGOTO, VENTILACAO OU AGUAS PLUVIAIS.	M	12,30	R\$ 24,26	R\$ 298,39			7,75		7,75	R\$ 188,01		R\$ 188,01	63,01%
16.13	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDAVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 32 MM, INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA.	M	76,00	R\$ 15,96	R\$ 1.197,00			23,44		23,44	R\$ 374,10		R\$ 374,10	31,25%
16.14	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M2	176,37	R\$ 47,66	R\$ 8.405,79			163,20		163,20	R\$ 7.778,10		R\$ 7.778,10	92,53%
16.15	FORNECIMENTO DE BOMBA 3/4 HP, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO.	CJ	1,00	R\$ 840,83	R\$ 840,83				1,00	1,00		R\$ 840,83	R\$ 840,83	100,00%
16.16	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDAVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA	M	20,00	R\$ 21,31	R\$ 426,20									
16.17	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDAVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA	M	12,00	R\$ 11,31	R\$ 135,72			12,00		12,00	R\$ 135,72		R\$ 135,72	100,00%
16.18	SUPORTE PARA DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm	CJ	65,00	R\$ 11,94	R\$ 776,10			65,00		65,00	R\$ 776,10		R\$ 776,10	100,00%
16.19	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANÇADO EM LAJES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	1,60	R\$ 1.620,89	R\$ 2.592,04			1,58		1,58	R\$ 2.561,00		R\$ 2.561,00	98,80%
16.20	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM,LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	228,79	R\$ 6,31	R\$ 1.443,66			228,79		228,79	R\$ 1.443,66		R\$ 1.443,66	100,00%
16.21	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	UND	24,91	R\$ 39,44	R\$ 982,45									
16.22	GRADE DE PROTECAO DE JANELA EM FERRO COM VAROES DE 1/2", ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1" X 1/4" INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	M2	29,19	R\$ 199,80	R\$ 5.826,32			20,72		20,72	R\$ 4.135,70		R\$ 4.135,70	70,98%
16.23	LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KNM2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M3	201,82	R\$ 105,78	R\$ 21.348,51			201,82		201,82	R\$ 21.348,51		R\$ 21.348,51	100,00%
16.24	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KNM2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	M3	237,06	R\$ 86,40	R\$ 20.481,98			237,06		237,06	R\$ 20.481,98		R\$ 20.481,98	100,00%
16.25	BANCADA/BANCAPIA DE AÇO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE "0,55 X 1,60" M	UND	3,00	R\$ 242,74	R\$ 728,22									
16.26	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. DE 1/2 POL. COM AREJADOR, REF. 1188, LINHA C-33 SIGMA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO.	UND	10,00	R\$ 65,29	R\$ 652,90			10,00		10,00	R\$ 652,90		R\$ 652,90	100,00%
16.27	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	88,00	R\$ 28,23	R\$ 2.484,24			60,00		60,00	R\$ 1.693,80		R\$ 1.693,80	68,18%
16.28	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	R\$ 13,21	R\$ 198,15			15,00		15,00	R\$ 198,15		R\$ 198,15	68,18%

Francisco Henrique C.M. da S

Eng. Civil

05A DE 20206

RDG CONSTRUTORA EIRELI

Carlos Príncipe Camargo
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Bairro: a Aviação
191 - 45211



BOLETIM DE MEDIÇÃO BM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição	Nº do CT	Data do CT							
			18	9/9/2021	De 1/7/2021 até 31/7/2021	021/2019	20/5/2019							
Início da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada	CNPJ		Tomador									
28/5/2019	10/1/2022	RDG CONSTRUTORA EIRELE	23.159.046/0001-53		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO									
Valor contr. inicial (R\$)	Data da assinatura	Objeto do CTEF (resumido)												
R\$ 642.994,60	20/5/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO												
Acum. Valor Contrato(R\$)	Medido no período (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	CT-Dt último Adit.	Local da obra (Bairro / Município / UF)			Valor Boletim							
R\$ 622.450,27	R\$ 21.010,67	R\$ 20.544,33		CENTRO - PAUDALHO/PE			R\$ 21.010,67							
Discriminação dos serviços do Orçamento			Previsto no Orçamento			Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio	
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Otdes a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
16.29	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DR, TIPO AC, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30mA, TETRAPOLAR, CORRENTE NOMINAL 100A, FAB SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	1,00	R\$ 416,74	R\$ 416,74									
16.30	PREPARO DE SOLO PARA GRAMADO COM 10,0 CM DE ESPESSURA , FEITO COM BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO CURTIDO, TRACO 4 1, COM TODO MATERIAL FORNECIDO PELOEMPREENHEIRO	M2	36,00	R\$ 16,70	R\$ 601,20									
16.31	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	36,00	R\$ 12,92	R\$ 465,12									
16.32	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	R\$ 489,79	R\$ 489,79			1,00		1,00	R\$ 489,79		R\$ 489,79	100,00%
16.33	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000 Btus EM PAREDE , SEM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE: INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (SPLIT E CONDENSADOR NO SUPORTE); EXECUÇÃO DUTOS DE REFRIGERAÇÃO E ELETRICA, FORNECIMENTO DO GÁS; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	6,00	R\$ 731,18	R\$ 4.387,08			6,00		6,00	R\$ 4.387,08		R\$ 4.387,08	100,00%
16.34	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 a 18000 Btus EM PAREDE , SEM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE: INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (SPLIT E CONDENSADOR NO SUPORTE); EXECUÇÃO DUTOS DE REFRIGERAÇÃO E ELETRICA, FORNECIMENTO DO GÁS; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	7,00	R\$ 822,25	R\$ 5.755,75			7,00		7,00	R\$ 5.755,75		R\$ 5.755,75	100,00%
16.35	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24000 Btus EM PAREDE , SEM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE: INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (SPLIT E CONDENSADOR NO SUPORTE); EXECUÇÃO DUTOS DE REFRIGERAÇÃO E ELETRICA, FORNECIMENTO DO GÁS; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	R\$ 1.017,42	R\$ 1.017,42			1,00		1,00	R\$ 1.017,42		R\$ 1.017,42	100,00%
16.36	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO.	M2	416,87	R\$ 3,07	R\$ 1.279,79			416,87		416,87	R\$ 1.279,79		R\$ 1.279,79	100,00%
16.37	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPa 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	10,00	R\$ 390,35	R\$ 3.903,50			10,00		10,00	R\$ 3.903,50		R\$ 3.903,50	100,00%
16.38	BANCADA DE GRANITO POLIDO 200 X 55 CM, COM DUAS CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	R\$ 1.526,96	R\$ 1.526,96			1,00		1,00	R\$ 1.526,96		R\$ 1.526,96	100,00%
16.39	BANCADA DE GRANITO POLIDO 200 X 55 CM, COM UMA CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	R\$ 1.294,74	R\$ 1.294,74			1,00		1,00	R\$ 1.294,74		R\$ 1.294,74	100,00%

Francisco Henrique C. I. da Silva

Eng. Civil

CREA - PE 38306

RDG CONSTRUTORA EIRELE

Eng.ºs Francisco Campos Gouveia
Bureau Municipal de Assessoramento
Planejamento e Agrário
Tel.: 48.311



BOLETIM DE MEDIÇÃO BM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição		Nº do CT	Data do CT						
			18	9/9/2021	De	1/7/2021 até	31/7/2021	021/2019 20/5/2019						
Início da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada		CNPJ		Tomador								
28/5/2019	10/1/2022	RDG CONSTRUTORA EIRELE		23.159.046/0001-53		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO								
Valor contr. inicial (R\$)	Data da assinatura		Objeto do CTEF (resumido)											
R\$ 642.994,60	20/5/2019		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO											
Acum. Valor Contrato(R\$)	Medido no período (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	CT-Dt último Adit. Local da obra (Bairro / Município / UF)				Valor Boletim							
R\$ 622.450,27	R\$ 21.010,67	R\$ 20.544,33	CENTRO - PAUDALHO/PE				R\$ 21.010,67							
Discriminação dos serviços do Orçamento			Previsto no Orçamento			Diferenças e Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio	
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
16.40	BANCADA DE GRANITO POLIDO 160 X 55 CM. COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00	R\$ 1.113,77	R\$ 2.227,54			2,00		2,00	R\$ 2.227,54		R\$ 2.227,54	100,00%
16.41	BANCADA DE GRANITO POLIDO 265 X 55 CM. COM DUAS CUBAS DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	R\$ 1.818,36	R\$ 1.818,36			1,00		1,00	R\$ 1.818,36		R\$ 1.818,36	100,00%
16.42	BANCADA DE GRANITO POLIDO 120 X 55 CM. COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	R\$ 929,56	R\$ 929,56			1,00		1,00	R\$ 929,56		R\$ 929,56	100,00%
16.43	BANCADA DE GRANITO POLIDO 245 X 65 CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 1.394,33	R\$ 1.394,33			1,00		1,00	R\$ 1.394,33		R\$ 1.394,33	100,00%
16.44	BANCADA DE GRANITO POLIDO 140 X 55 CM. COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00	R\$ 1.013,67	R\$ 2.027,34			2,00		2,00	R\$ 2.027,34		R\$ 2.027,34	100,00%
16.45	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA.	M2	4,32	R\$ 432,58	R\$ 1.868,74			4,32		4,32	R\$ 1.868,74		R\$ 1.868,74	100,00%
16.46	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COMM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	33,81	R\$ 1.163,07	R\$ 39.323,39			28,14	5,67	33,81	R\$ 32.728,78	R\$ 6.594,60	R\$ 39.323,38	100,00%
16.47	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	R\$ 18,46	R\$ 276,90			15,00		15,00	R\$ 276,90		R\$ 276,90	100,00%
16.48	ASSENTAMENTO DE HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2.40 M COPPERWELD OU SIMILAR, COM CONECTOR PA- RALELO E PARAFUSOS (INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL).	UND	4,00	R\$ 79,83	R\$ 319,32				4,00	4,00		R\$ 319,32	R\$ 319,32	100,00%

Eduardo José Vda Marinho
Engenheiro Civil
CREA 0538634-8/PE
Mat. 48.366

Paulo Vanderlei de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 0538634-8/PE
Mat. 48.366

Francisco Henrique C. I. da Silva
Eng. Civil
CREA - PE 38306

RDG CONSTRUTORA EIRELI

Carlos Pinheiro
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário



BOLETIM DE MEDIÇÃO BM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição	Nº do CT	Data do CT							
			18	9/9/2021	De 1/7/2021 até 31/7/2021	021/2019	20/5/2019							
Início da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada			CNPJ	Tomador								
28/5/2019	10/1/2022	RDG CONSTRUTORA EIRELE			23.159.046/0001-53	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO								
Valor contr. inicial (R\$)	Data da assinatura		Objeto do CTEF (resumido)											
R\$ 642.994,60	20/5/2019		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO											
Acum. Valor Contrato(R\$)	Medido no período (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	CT-Dt último Adit.	Local da obra (Bairro / Município / UF)			Valor Boletim							
R\$ 622.450,27	R\$ 21.010,67	R\$ 20.544,33		CENTRO - PAUDALHO/PE			R\$ 21.010,67							
Discriminação dos serviços do Orçamento			Previsto no Orçamento			Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio	
Item Sub	Descrição	Unid	Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Qtdes a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
16.49	PORTA DE CORRER 0,80 CM , INCLUSO TRILHOS, PUXADOR E FECHADURA	M2	3,36	R\$ 327,18	R\$ 1.099,32			3,36		3,36	R\$ 1.099,32		R\$ 1.099,32	100,00%
16.50	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UND	5,00	R\$ 152,17	R\$ 760,85			5,00		5,00	R\$ 760,85		R\$ 760,85	100,00%
16.51	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, COM ALTURA DE 15 CM, MONTADA NA OBRA)	M	83,86	R\$ 31,22	R\$ 2.618,10			83,36		83,36	R\$ 2.602,49		R\$ 2.602,49	99,40%
16.52	CISTERNA POLIETILENO 5000 LITROS	UND	1,00	R\$ 6.769,02	R\$ 6.769,02			1,00		1,00	R\$ 6.769,02		R\$ 6.769,02	100,00%
TOTAIS					R\$ 642.994,60					TOTAL	R\$ 601.439,60	R\$ 21.010,67	R\$ 622.450,27	

BDI(25%)* INCLUIDOS NOS PREÇOS

Observações

Paulo Vanderlei de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA PE 48.385

Resp. Técnico pela Fiscalização
Nome:
Profissão:
CREA Nº

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário

Representante: Secretário de Desenvolvimento Urbano e Agrário
Nome:
Cargo:

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA PE 48.385

Responsável pelo apontamento
Nome:
Cargo:

Responsável Legal da Empresa
Nome:
Profissão:

RDG CONSTRUTORA EIRELI

Francisco Henrique de S. Silva
Eng. Civil
CREA - PE 38306



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO

CONTRATO: 021/2019 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO

MEMÓRIA DE CALCULO BM -18										
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	COMPR.	LARG.	ALTURA	QUANT.	TOTAL			
16.0	SERVIÇOS EXTRAS - REPLANILHAMENTO									
6.1.4	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2								
	PORTÃO ENTRADA		2,96		X 2,00	X 1,00	= 5,92			
	Total item 6.1.4	M2					= 5,92			
6.2.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2								
	BALCÃO-ESTOCAGEM		1,20	x 1,50			= 1,80			
	CORREMÃO									
	LANCE 01		1,32	x 0,40			= 0,52			
			1,27	x 0,40			= 0,50			
			1,64	x 0,40			= 0,65			
			1,63	x 0,40			= 0,65			
	CENTRAL		1,02	x 0,50			= 0,51			
	LANCE 02		1,60	x 0,40			= 0,64			
			1,32	x 0,40			= 0,52			
	HALL		1,18	x 0,50			= 0,59			
			1,18	x 0,50			= 0,59			
			1,18	x 0,50			= 0,59			
			1,23	x 0,50			= 0,61			
			1,21	x 0,50			= 0,60			
	Total item 6.2.1	M2					TOTAL = 8,77			
6.3.2	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0)	M2								
	PORTÃO ENTRADA		2,96		X 2,00	X 1,00	= 5,92			
	Total item 6.3.2	M2					= 5,92			
7.0	FORROS E REVESTIMENTO DE TETOS:									
7.1	Para lajes(Regularizações/Acabamentos):									
7.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2								
	TERREO									
	CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 1			3,00	X 2,96	X	= 8,88			
	SALA INALAÇÃO		2,26	X 2,73	X	= 6,16				
	CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO		3,43	X 6,00	X	= 20,58				
	WC PCD FEM,		1,78	X 1,80	X	= 3,20				
	BANHEIRO PCD		2,98	X 1,80	X	= 4,76				
	SALA OBSERVAÇÃO		2,98	X 3,85	X	= 11,47				
	SALA ESTERILIZAÇÃO		2,23	X 2,46	X	= 5,48				
	ESPURGO		3,43	X 1,50	X	= 5,14				
	BANHEIRO FUNCIONARIOS		1,62	X 1,60	X	= 2,59				
	ESTOCAGEM		3,57	X 3,85	X	= 13,74				
	CONSULTORIO ACOLHIMENTO 2		3,65	X 2,90	X	= 10,58				
	WC PCD MAS.		1,78	X 1,80	X	= 3,20				
	CONSULTORIO C/ SANITARIO		2,63	X 5,90	X	= 15,51				
	WC PCD CONSULTORIO		1,80	X 1,60	X	= 2,88				
	DML		1,62	X 1,30	X	= 2,10				
	SALA CURATIVOS		3,51	X 2,73	X	= 9,58				
	SALA VACINAS		3,00	X 2,90	X	= 8,70				
	CIRCULAÇÃO 1		12,85	X 1,80	X	= 23,13				
	CIRCULAÇÃO 2		1,04	X 2,61	X	= 2,71				
	CIRCULAÇÃO 3		1,10	X 2,88	X	= 3,16				
	RECPCÃO		4,38	X 6,15	X	= 26,93				
			1,80	X 3,01	X	= 5,41				
	1º PAVIMENTO									

Carlos Pinheiro Gomes Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat. 48.911

Paulo Vanderlei de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22085/PE
Mat. 41.498

~~RDG CONSTRUTORA EIRELI~~

Francisco Henrique C. I. da Silva
Eng. Civil
CREA - PE 38306

Eduardo José
Engenheiro Civil
CREA 180638634 - PE
Mat. 48.386

Relatório Fotográfico

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO	DATA DE EMISSÃO:	09/09/2021
LOCAL:	PAUDALHO	Nº DA MEDIÇÃO:	18
EMPRESA:	RDG CONSTRUTORA EIRELE	Nº CONTRATO:	021/2019



Descrição: PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO.



Descrição: PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO.



Descrição: VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO.



Descrição: VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Francisco Henrique C. I. da Silva
Eng. Civil
CREA - PE 38306

Paulo Vantuzi de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 2.335.041/E
Mat. 48.386

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 18.663.6634 - 8 / PE
Mat. 48.386

RDG CONSTRUTORA EIRELI

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

Carlos Príncipe Campos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat. 49.911

Relatório Fotográfico

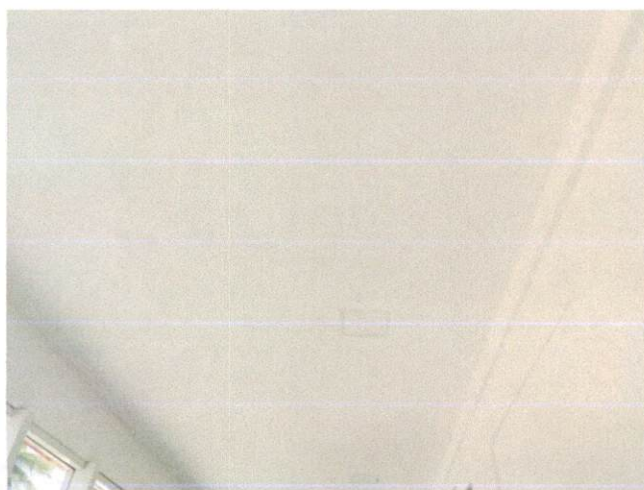
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO	DATA DE EMISSÃO:	09/09/2021
LOCAL:	PAUDALHO	Nº DA MEDIÇÃO:	18
EMPRESA:	RDG CONSTRUTORA EIRELE	Nº CONTRATO:	021/2019



Descrição: PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)



Descrição APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014



Descrição: APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014



Descrição: GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM

Francisco Henrique C. I. da Silva
Eng. Civil
CREA - PE 38306

Paulo Vanderlei de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22000-D/PE
Mat: 41.498

Eduardo José Viana
Engenheiro Civil
CREA 18000-6634-8/PE
Mat: 48.386

RDG CONSTRUTORA EIRELI

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO

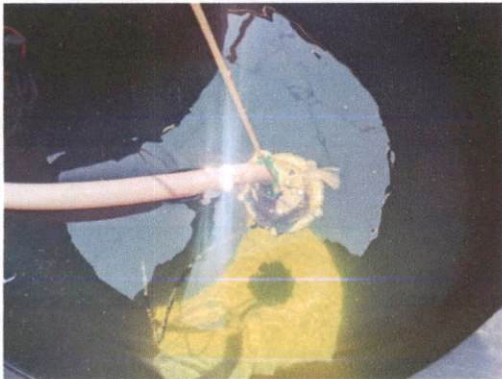
Rua BR-408 - km 76 - Chã de Capoeira, Paudalho

Rua BR-408 - km 76, Chã de Capoeira, Paudalho - PE.

Carlos Pinheiro Campos
Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat. 48.911

Relatório Fotográfico

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO	DATA DE EMISSÃO:	09/09/2021
LOCAL:	PAUDALHO	Nº DA MEDIÇÃO:	18
EMPRESA:	RDG CONSTRUTORA EIRELE	Nº CONTRATO:	021/2019



Descrição: FORNECIMENTO DE BOMBA 3/4 HP, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO.



Descrição PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COMM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015



Descrição: PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COMM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015



Descrição: ASSENTAMENTO DE HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8"X 2.40 M COPPERWELD OU SIMILAR, COM CONECTOR PARALELO E PARAFUSOS (INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL).

Francisco Henrique C. J. da Silva
Eng. Civil
CREA - PE 38306

Paulo Vanderlei de M. Filho
Eng. Eletricista
CREA 2035 D / PE
Mat. 11.438

Eduardo *[Signature]*
Engenheiro
CREA 18063853-1-PE
Mat. 48.390

[Signature]
Carlos Pinheiro
Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat. 48.511

RDG CONSTRUTORA EIRELI

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

RDG CONSTRUTORA EIRELI				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	Francisco Henrique Conrado Inácio da Silva	CREA	CREA-PE 38306	Data:	01/07/2021	Pág	765
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	166	Prazo Restante:	14	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	07:00 a 17:00			Tarde	B		
Prazo da Obra	15/07/2021			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro		Eletricista				
	Pedreiro	1	Pintor				
	Armador		Vidraceiro				
	Servente	2	Gesseiro				
Serviços Executados							
	REVESTIMENTO						
	INSTALAÇÃO DE GRANITO						
	EMASSAMENTO						
	PINTURA						
	ACABAMENTO DE REJUNTE						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	Paulo Vitorino de M. Filho Engenheiro Civil CREA PE 11438			Visto Contratada:	FRANCISCO HENRIQUE C. F. DA SILVA ENG. CIVIL CREA-PE 38306		01/07/2021

RDG CONSTRUTORA EIRELI				DIÁRIO DE OBRAS					
Resp. Técnico		Francisco Henrique Conrado Inácio da Silva		CREA	CREA-PE 38306	Data:	02/07/2021	Pág	766
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva	
							Fraca	Forte	
Prazo Decorrido:		167	Prazo Restante:		13	Manhã	B		
Horário de Trabalho:			07:00 a 16:00			Tarde	B		
Prazo da Obra			15/07/2021			Noite	B		
Equipam.									
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição			Quant.		
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador					
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro					
	Carpinteiro			Eletricista					
	Pedreiro		1	Pintor				1	
	Armador			Vidraceiro					
	Servente		2	Gesseiro					
Serviços Executados									
	REVESTIMENTO								
	INSTALAÇÃO DE GRANITO								
	EMASSAMENTO								
	PINTURA								
	ACABAMENTO DE REJUNTE								
Anotação da Fiscalização									
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:					
Paulo Vinícius de M. Filho Engenheiro CREA 22065 PE Mat.: 41.438				FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA ENG. CIVIL CREA-PE 38306			02/07/2021		


RDG CONSTRUTORA EIRELI				DIÁRIO DE OBRAS					
Resp. Técnico		Francisco Henrique Conrado Inácio da Silva		CREA	CREA-PE 38306	Data:	03/07/2021	Pág	767
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte	
Prazo Decorrido:		168	Prazo Restante:		12	Manhã	B		
Horário de Trabalho:			SÁBADO		Tarde	B			
Prazo da Obra			15/07/2021		Noite	B			
Equipam.									
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.			
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador					
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro					
	Carpinteiro			Eletricista					
	Pedreiro			Pintor					
	Armador			Vidraceiro					
	Servente			Gesseiro					
Serviços Executados	DIA NÃO TRABALHADO								
Anotação da Fiscalização									
Visto Fiscalização:		Paulo Vandenberg de M. Filho Engenheiro Civil CREA 23.564/PE Mat. 41.118		Visto Contratada:			FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA ENG. CIVIL CREA-PE 38306		03/07/2021

RDG CONSTRUTORA EIRELI				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	Francisco Henrique Conrado Inácio da Silva	CREA	CREA-PE 38306	Data:	04/07/2021	Pág	768
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	169	Prazo Restante:	11	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	DOMINGO			Tarde	B		
Prazo da Obra	15/07/2021			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Vidraceiro			
	Servente			Gesseiro			
Serviços Executados	DIA NÃO TRABALHADO						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	Paulo VANDERLEI DE M. PIRO Engenheiro Civil CREA 22040/D/PE 14/07/2021			Visto Contratada:	FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA ENG. CIVIL CREA-PE 38306		04/07/2021

RDG CONSTRUTORA EIRELI				DIÁRIO DE OBRAS					
Resp. Técnico		Francisco Henrique Conrado Inácio da Silva		CREA	CREA-PE 38306	Data:	05/07/2021	Pág	769
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva	Fraca Forte
Prazo Decorrido:	170	Prazo Restante:	10	Manhã	B				
Horário de Trabalho:		07:00 a 17:00			Tarde	B			
Prazo da Obra		15/07/2021			Noite	B			
Equipam.									
Pessoal	Descrição			Quant.	Descrição			Quant.	
	Engenheiro				Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado			1	Bombeiro				
	Carpinteiro				Eletricista				
	Pedreiro			1	Pintor				1
	Armador				Vidraceiro				
	Servente			2	Gesseiro				
Serviços Executados									
	REVESTIMENTO								
	INSTALAÇÃO DE GRANITO								
	EMASSAMENTO								
	PINTURA								
	ACABAMENTO DE REJUNTE								
Anotação da Fiscalização									
Visto Fiscalização:		Paulo Vitor da M. Filho Engenheiro Civil CREA-PE 38306 M. 11438		Visto Contratada:			FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA ENG. CIVIL CREA-PE 38306		05/07/2021


RDG CONSTRUTORA EIRELI				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	Francisco Henrique Conrado Inácio da Silva	CREA	CREA-PE 38306	Data:	06/07/2021	Pág	770
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	171	Prazo Restante:	9	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	07:00 a 17:00			Tarde	B		
Prazo da Obra	15/07/2021			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro		Eletricista				
	Pedreiro	1	Pintor	1			
	Armador		Vidraceiro				
	Servente	2	Gesseiro				
Serviços Executados	REVESTIMENTO						
	INSTALAÇÃO DE GRANITO						
	EMASSAMENTO						
	PINTURA						
	ACABAMENTO DE REJUNTE						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	Paulo Vanu... de M. Filho Eng. Civil CREA-PE 38306 Nº 41342		Visto Contratada:	FRANCISCO HENRIQUE C. J. DA SILVA ENG. CIVIL CREA-PE 38306		06/07/2021	


RDG CONSTRUTORA EIRELI				DIÁRIO DE OBRAS					
Resp. Técnico		Francisco Henrique Conrado Inácio da Silva		CREA	CREA-PE 38306	Data:	07/07/2021	Pág	771
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte	
Prazo Decorrido:		172	Prazo Restante:		8	Manhã	B		
Horário de Trabalho:			07:00 a 17:00		Tarde	B			
Prazo da Obra			15/07/2021		Noite	B			
Equipam.									
Pessoal	Descrição			Quant.	Descrição			Quant.	
	Engenheiro				Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado			1	Bombeiro				
	Carpinteiro				Eletricista				
	Pedreiro			1	Pintor			1	
	Armador				Vidraceiro				
	Servente			2	Gesseiro				
Serviços Executados									
	REVESTIMENTO								
	INSTALAÇÃO DE GRANITO								
	EMASSAMENTO								
	PINTURA								
	ACABAMENTO DE REJUNTE								
Anotação da Fiscalização									
Visto Fiscalização: Paulo V. de M. Filho CREA 38306-1 PE Ma. 4/18				Visto Contratada: FRANCISCO HENRIQUE C. J. DA SILVA ENG. CIVIL CREA-PE 38306			07/07/2021		


RDG CONSTRUTORA EIRELI				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	Francisco Henrique Conrado Inácio da Silva	CREA	CREA-PE 38306	Data:	08/07/2021	Pág	772
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	173	Prazo Restante:	7	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	07:00 a 17:00			Tarde	B		
Prazo da Obra	15/07/2021			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro		Eletricista				
	Pedreiro	1	Pintor				
	Armador		Vidraceiro				
	Servente	2	Gesseiro				
Serviços Executados							
	REVESTIMENTO						
	INSTALAÇÃO DE GRANITO						
	EMASSAMENTO						
	PINTURA						
	ACABAMENTO DE REJUNTE						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	 Paulo Vanderlei de M. Filho CREA 220.041/PE ENGR. CIVIL			Visto Contratada:	FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA ENGR. CIVIL CREA-PE 38306		08/07/2021


RDG CONSTRUTORA EIRELI				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	Francisco Henrique Conrado Inácio da Silva	CREA	CREA-PE 38306	Data:	09/07/2021	Pág	773
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	174	Prazo Restante:	6	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	07:00 a 16:00			Tarde	B		
Prazo da Obra	15/07/2021			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro		Eletricista				
	Pedreiro	1	Pintor	1			
	Armador		Vidraceiro				
	Servente	2	Gesseiro	1			
Serviços Executados							
	GESSO						
	EMASSAMENTO						
	PINTURA						
	ACABAMENTO DE REJUNTE						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	Paulo Vantuzi de M. Filho Engenheiro Civil CREA-PE 38306			Visto Contratada:	FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA ENG. CIVIL CREA-PE 38306		09/07/2021



RDG CONSTRUTORA EIRELI				DIÁRIO DE OBRAS						
Resp. Técnico		Francisco Henrique Conrado Inácio da Silva		CREA	CREA-PE 38306	Data:	10/07/2021	Pág	774	
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva	Fraca Forte	
Prazo Decorrido:		175	Prazo Restante:		5	Manhã	B			
Horário de Trabalho:			SÁBADO		Tarde	B				
Prazo da Obra			15/07/2021		Noite	B				
Equipam.										
Pessoal	Descrição			Quant.	Descrição			Quant.		
	Engenheiro				Almoxarife/Apontador					
	Mestre de Obras/ Encarregado				Bombeiro					
	Carpinteiro				Eletricista					
	Pedreiro				Pintor					
	Armador				Vidraceiro					
	Servente				Gesseiro					
Serviços Executados										
	DIA NÃO TRABALHADO									
Anotação da Fiscalização										
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:			10/07/2021			
				FRANCISCO HENRIQUE C. J. DA SILVA ENG. CIVIL CREA-PE 38306						


RDG CONSTRUTORA EIRELI				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	Francisco Henrique Conrado Inácio da Silva	CREA	CREA-PE 38306	Data:	11/07/2021	Pág	775
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	176	Prazo Restante:	4	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	DOMINGO			Tarde	B		
Prazo da Obra	15/07/2021			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Vidraceiro			
	Servente			Gesseiro			
Serviços Executados	DIA NÃO TRABALHADO						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	 Paulo Valente de M. Filho CREA PE 1438		Visto Contratada:	FRANCISCO HENRIQUE C. J. DA SILVA ENG. CIVIL CREA-PE 38306		11/07/2021	

RDG CONSTRUTORA EIRELI				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	Francisco Henrique Conrado Inácio da Silva	CREA	CREA-PE 38306	Data:	12/07/2021	Pág	776
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	177	Prazo Restante:	3	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	07:00 a 17:00			Tarde	B		
Prazo da Obra	15/07/2021			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro		Eletricista				
	Pedreiro	1	Pintor		1		
	Armador		Vidraceiro				
	Servente	2	Gesseiro		1		
Serviços Executados							
	GESSO						
	PINTURA						
	LIMPEZA GERAL						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	 Francisco Henrique Conrado Inácio da Silva Engenheiro Civil CREA-PE 38306			Visto Contratada:	FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA ENG. CIVIL CREA-PE 38306		12/07/2021


RDG CONSTRUTORA EIRELI					DIÁRIO DE OBRAS				
Resp. Técnico		Francisco Henrique Conrado Inácio da Silva		CREA	CREA-PE 38306	Data:	13/07/2021	Pág	777
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte	
Prazo Decorrido:		178	Prazo Restante:		2	Manhã	B		
Horário de Trabalho:			07:00 a 17:00		Tarde	B			
Prazo da Obra			15/07/2021		Noite	B			
Equipam.									
Pessoa	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.			
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador					
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro					
	Carpinteiro			Eletricista					
	Pedreiro		1	Pintor		1			
	Armador			Vidraceiro					
	Servente		2	Gesseiro		1			
Serviços Executados	GESSO								
	PINTURA								
	LIMPEZA GERAL								
Anotação da Fiscalização									
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:			13/07/2021		
				FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA ENG. CIVIL CREA-PE 38306					

RDG CONSTRUTORA EIRELI				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	Francisco Henrique Conrado Inácio da Silva	CREA	CREA-PE 38306	Data:	14/07/2021	Pág	778
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	179	Prazo Restante:	1	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	07:00 a 17:00			Tarde	B		
Prazo da Obra	15/07/2021			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro		Eletricista				
	Pedreiro	1	Pintor	1			
	Armador		Vidraceiro				
	Servente	2	Gesseiro	1			
Serviços Executados	GESSO						
	PINTURA						
	LIMPEZA GERAL						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	 Engenheiro Civil CREA PE 38306/PE Março 2018			Visto Contratada:	FRANCISCO HENRIQUE C. J. DA SILVA ENG. CIVIL CREA-PE 38306		14/07/2021



RDG CONSTRUTORA EIRELI				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	Francisco Henrique Conrado Inácio da Silva	CREA	CREA-PE 38306	Data:	15/07/2021	Pág	779
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	180	Prazo Restante:	0	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	07:00 a 17:00			Tarde	B		
Prazo da Obra	15/07/2021			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro		Eletricista				
	Pedreiro	1	Pintor		1		
	Armador		Vidraceiro				
	Servente	2	Gesseiro		1		
Serviços Executados	GESSO						
	PINTURA						
	LIMPEZA GERAL						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	 Paulo Vande M. Filho Engenheiro Civil CREA-PE 38306			Visto Contratada:	 FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA ENGR. CIVIL CREA-PE 38306		15/07/2021

RDG CONSTRUTORA EIRELI				DIÁRIO DE OBRAS				
Resp. Técnico	Francisco Henrique Conrado Inácio da Silva		CREA	CREA-PE 38306	Data:	16/07/2021	Pág	780
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	1	Prazo Restante:	179	Manhã	B			
Horário de Trabalho:	07:00 a 16:00			Tarde	B			
Prazo da Obra	11/01/2022			Noite	B			
Equipam.								
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.		
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro				
	Carpinteiro			Eletricista				
	Pedreiro		1	Pintor		1		
	Armador			Vidraceiro				
	Servente		2	Gesseiro		1		
Serviços Executados	GESSO							
	PINTURA							
	LIMPEZA GERAL							
Anotação da Fiscalização								
Visto Fiscalização:	 M. Filho Engenheiro Civil CREA-PE 38306 Matr. 4108			Visto Contratada:	FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA ENG. CIVIL CREA-PE 38306		16/07/2021	

RDG CONSTRUTORA EIRELI				DIÁRIO DE OBRAS						
Resp. Técnico		Francisco Henrique Conrado Inácio da Silva		CREA	CREA-PE 38306	Data:	17/07/2021	Pág	781	
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte		
Prazo Decorrido:		2	Prazo Restante:		178	Manhã	B			
Horário de Trabalho:			SÁBADO			Tarde	B			
Prazo da Obra			11/01/2022			Noite	B			
Equipam.										
Pessoal	Descrição			Quant.	Descrição			Quant.		
	Engenheiro				Almoxarife/Apontador					
	Mestre de Obras/ Encarregado				Bombeiro					
	Carpinteiro				Eletricista					
	Pedreiro				Pintor					
	Armador				Vidraceiro					
	Servente				Gesseiro					
Serviços Executados										
	DIA NÃO TRABALHADO									
Anotação da Fiscalização										
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:						
Francisco H. M. Filho				FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA			17/07/2021			
CREA-PE 38306				ENG. CIVIL						
				CREA-PE 38306						

RDG CONSTRUTORA EIRELI					DIÁRIO DE OBRAS				
Resp. Técnico		Francisco Henrique Conrado Inácio da Silva		CREA	CREA-PE 38306	Data:	18/07/2021	Pág	782
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte	
Prazo Decorrido:		3	Prazo Restante:		177	Manhã	B		
Horário de Trabalho:			DOMINGO		Tarde	B			
Prazo da Obra			11/01/2022		Noite	B			
Equipam.									
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.			
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador					
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro					
	Carpinteiro			Eletricista					
	Pedreiro			Pintor					
	Armador			Vidraceiro					
	Servente			Gesseiro					
Serviços Executados	DIA NÃO TRABALHADO								
Anotação da Fiscalização									
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:			18/07/2021		
 M. Filho Engenheiro Civil CREA 2.033.771-1 Matr. 41.4				FRANCISCO HENRIQUE C. J. DA SILVA ENGENHEIRO CIVIL CREA-PE 38306					


RDG CONSTRUTORA EIRELI				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	Francisco Henrique Conrado Inácio da Silva	CREA	CREA-PE 38306	Data:	19/07/2021	Pág	783
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	4	Prazo Restante:	176	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	07:00 a 17:00			Tarde	B		
Prazo da Obra	11/01/2022			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro		Eletricista				
	Pedreiro	1	Pintor		1		
	Armador		Vidraceiro		1		
	Servente	2	Gesseiro				
Serviços Executados	INSTALAÇÃO DE VIDRO						
	PINTURA						
	LIMPEZA GERAL						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	Paulo Vinícius de M. Filho Engenheiro Civil CREA-PE 38306			Visto Contratada:	FRANCISCO HENRIQUE C. J. DA SILVA ENG. CIVIL CREA-PE 38306		19/07/2021


RDG CONSTRUTORA EIRELI				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	Francisco Henrique Conrado Inácio da Silva	CREA	CREA-PE 38306	Data:	20/07/2021	Pág	784
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	5	Prazo Restante:	175	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	07:00 a 17:00			Tarde	B		
Prazo da Obra	11/01/2022			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro		Eletricista				
	Pedreiro	1	Pintor		1		
	Armador		Vidraceiro		1		
	Servente	2	Gesseiro				
Serviços Executados	INSTALAÇÃO DE VIDRO						
	PINTURA						
	LIMPEZA GERAL						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	 PAULO ROBERTO DE M. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-PE 38306 D/PE			Visto Contratada:	FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA ENG. CIVIL  CREA-PE 38306		20/07/2021



RDG CONSTRUTORA EIRELI				DIÁRIO DE OBRAS						
Resp. Técnico		Francisco Henrique Conrado Inácio da Silva		CREA	CREA-PE 38306	Data:	21/07/2021	Pág	785	
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva		
							Fraca	Forte		
Prazo Decorrido:		6	Prazo Restante:		174	Manhã	B			
Horário de Trabalho:			07:00 a 17:00			Tarde	B			
Prazo da Obra			11/01/2022			Noite	B			
Equipam.										
Pessoal	Descrição			Quant.	Descrição			Quant.		
	Engenheiro				Almoxarife/Apontador					
	Mestre de Obras/ Encarregado			1	Bombeiro					
	Carpinteiro				Eletricista				1	
	Pedreiro			1	Pintor				1	
	Armador				Vidraceiro				1	
	Servente			2	Gesseiro					
Serviços Executados										
	INSTALAÇÃO ELÉTRICA									
	INSTALAÇÃO DE VIDRO									
	PINTURA									
	LIMPEZA GERAL									
Anotação da Fiscalização										
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:						
Paulo Vinícius de M. Filho Engenheiro Civil CREA-PE 38306 Márcio				FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA ENG. CIVIL CREA-PE 38306						21/07/2021

RDG CONSTRUTORA EIRELI				DIÁRIO DE OBRAS				
Resp. Técnico		Francisco Henrique Conrado Inácio da Silva		CREA	CREA-PE 38306			
Data:		22/07/2021		Pág	786			
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		7		Prazo Restante:	173			
Horário de Trabalho:		07:00 a 17:00			Manhã	B		
Prazo da Obra		11/01/2022			Tarde	B		
Noite					B			
Equipam.								
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.				
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador					
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro					
	Carpinteiro		Eletricista	1				
	Pedreiro	1	Pintor	1				
	Armador		Vidraceiro	1				
	Servente	2	Gesseiro					
Serviços Executados	INSTALAÇÃO ELÉTRICA							
	INSTALAÇÃO DE VIDRO							
	PINTURA							
	LIMPEZA GERAL							
Anotação da Fiscalização								
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		22/07/2021		
Paulo Henrique M. Filho ENGENHEIRO CREA 21.755/PE Membro 2018				FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA ENG. CIVIL CREA-PE 38306				



RDG CONSTRUTORA EIRELI				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	Francisco Henrique Conrado Inácio da Silva	CREA	CREA-PE 38306	Data:	23/07/2021	Pág	787
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	8	Prazo Restante:	172	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	07:00 a 16:00			Tarde	B		
Prazo da Obra	11/01/2022			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro		Eletricista	1			
	Pedreiro	1	Pintor	1			
	Armador		Vidraceiro	1			
	Servente	2	Gesseiro				
Serviços Executados	INSTALAÇÃO ELÉTRICA						
	INSTALAÇÃO DE VIDRO						
	PINTURA						
	LIMPEZA GERAL						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	Paulo Vitorino de M. Filho Engenheiro Civil CREA 22000 D/PE Nº 41138			Visto Contratada:	FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA ENGR. CIVIL CREA-PE 38306		23/07/2021


RDG CONSTRUTORA EIRELI				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	Francisco Henrique Conrado Inácio da Silva	CREA	CREA-PE 38306	Data:	24/07/2021	Pág	788
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	9	Prazo Restante:	171	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	SÁBADO			Tarde	B		
Prazo da Obra	11/01/2022			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro				
	Carpinteiro		Eletricista				
	Pedreiro		Pintor				
	Armador		Vidraceiro				
	Servente		Gesseiro				
Serviços Executados	DIA NÃO TRABALHADO						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	 PAULO ROBERTO DE M. FILHO ENGR. CIVIL CREA-PE 38306			Visto Contratada:	FRANCISCO HENRIQUE C. J. DA SILVA ENGR. CIVIL CREA-PE 38306		24/07/2021



RDG CONSTRUTORA EIRELI				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	Francisco Henrique Conrado Inácio da Silva	CREA	CREA-PE 38306	Data:	25/07/2021	Pág	789
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	10	Prazo Restante:	170	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	DOMINGO			Tarde	B		
Prazo da Obra	11/01/2022			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro				
	Carpinteiro		Eletricista				
	Pedreiro		Pintor				
	Armador		Vidraceiro				
	Servente		Gesseiro				
Serviços Executados	DIA NÃO TRABALHADO						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	 M. Filho Engenheiro Civil CREA 2-3-047/PE Matr. 41119			Visto Contratada:	FRANCISCO HENRIQUE C. J. DA SILVA ENG. CIVIL CREA-PE 38306		25/07/2021

RDG CONSTRUTORA EIRELI				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	Francisco Henrique Conrado Inácio da Silva	CREA	CREA-PE 38306	Data:	26/07/2021	Pág	790
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	11	Prazo Restante:	169	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	07:00 a 17:00			Tarde	B		
Prazo da Obra	11/01/2022			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro		Eletricista				
	Pedreiro	1	Pintor				
	Armador		Vidraceiro				
	Servente	2	Gesseiro				
Serviços Executados							
	LIMPEZA GERAL						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	 Paulo V. de Jesus M. Filho Engenheiro Civil CREA 20557/PE Natal, RN			Visto Contratada:	FRANCISCO HENRIQUE C. J. DA SILVA ENG. CIVIL  CREA-PE 38306		26/07/2021

RDG CONSTRUTORA EIRELI				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	Francisco Henrique Conrado Inácio da Silva	CREA	CREA-PE 38306	Data:	27/07/2021	Pág	791
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	12	Prazo Restante:	168	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	07:00 a 17:00			Tarde	B		
Prazo da Obra	11/01/2022			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro		Eletricista				
	Pedreiro	1	Pintor				
	Armador		Vidraceiro				
Servente	2	Gesseiro					
Serviços Executados							
	LIMPEZA GERAL						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	Paulo Varjão M. de M. Filho Engenheiro Civil CREA 21.101/PE Mat. 41138		Visto Contratada:	FRANCISCO HENRIQUE C. J. DA SILVA ENG. CIVIL CREA-PE 38306		27/07/2021	

RDG CONSTRUTORA EIRELI				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	Francisco Henrique Conrado Inácio da Silva	CREA	CREA-PE 38306	Data:	28/07/2021	Pág	792
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	13	Prazo Restante:	167	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	07:00 a 17:00			Tarde	B		
Prazo da Obra	11/01/2022			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro		Eletricista				
	Pedreiro	1	Pintor				
	Armador		Vidraceiro				
	Servente	2	Gesseiro				
Serviços Executados	LIMPEZA GERAL						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	 Paulo Roberto de Azevedo Filho Engenheiro Civil CREA - PE 38306/PE			Visto Contratada:	FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA ENGR. CIVIL  CREA-PE 38306		28/07/2021

RDG CONSTRUTORA EIRELI				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	Francisco Henrique Conrado Inácio da Silva	CREA	CREA-PE 38306	Data:	29/07/2021	Pág	793
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	14	Prazo Restante:	166	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	07:00 a 17:00			Tarde	B		
Prazo da Obra	11/01/2022			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro		1	Pintor			
	Armador			Vidraceiro			
	Servente		2	Gesseiro			
Serviços Executados							
	LIMPEZA GERAL						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:	FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA ENG. CIVIL CREA-PE 38306		29/07/2021

RDG CONSTRUTORA EIRELI				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	Francisco Henrique Conrado Inácio da Silva	CREA	CREA-PE 38306	Data:	30/07/2021	Pág	794
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	15	Prazo Restante:	165	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	07:00 a 16:00			Tarde	B		
Prazo da Obra	11/01/2022			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro		Eletricista				
	Pedreiro	1	Pintor				
	Armador		Vidraceiro				
Servente	2	Gesseiro					
Serviços Executados							
	LIMPEZA GERAL						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:	FRANCISCO HENRIQUE C. J. DA SILVA ENG. CIVIL  CREA-PE 38306		30/07/2021

RDG CONSTRUTORA EIRELI				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	Francisco Henrique Conrado Inácio da Silva	CREA	CREA-PE 38306	Data:	31/07/2021	Pág	795
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	16	Prazo Restante:	164	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	SÁBADO			Tarde	B		
Prazo da Obra	11/01/2022			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Vidraceiro			
	Servente			Gesseiro			
Serviços Executados	DIA NÃO TRABALHADO						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	Paulo ... M. Filho Engenheiro Civil CREA 23300/PE			Visto Contratada:	FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA ENG. CIVIL CREA-PE 38306		31/07/2021
