

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

C.I nº 0527/2023

Da: Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

Para: Secretaria Municipal de Educação

Venho através desta, encaminhar documentos descritos na tabela abaixo, para **análise e conhecimentos**, conforme documentos em anexo.

Descrição	Dados da Empresa	Documentos em anexo
9º BM conforme contrato nº 047/2021 - cujo o objeto e a Contratação de empresa de Engenharia para Execução dos Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Junco, no Município de Paudalho - PE.	GLIDDEN EMPREENDEIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP CNPJ: 22.594.155/0001-36; Dados Bancário Santander Ag. 4059; C/c: 13001685-4	<ul style="list-style-type: none">• Nota Fiscal 1199; 9ºBM;• Memória de Cálculo;• Relatório Fotográfico;• Plano de Trabalho.

Atenciosamente,


Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat.: 48.911

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
Matricula – 48.911

*Recebi em
11.05.2023
as 10h58
Juliana
Cavalcanti*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE S. LOURENÇO**

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Praça Doutor Araújo Sobrinho N° s/n - Centro, CEP 54735-565 - SÃO LOURENÇO DA MATA - PE TEL.: (81)3525-9437 CNPJ: 11.251.832/0001-05



Número da Nota:

00001199

Competência:

MAI/2023

Data e Hora Emissão:

09/05/2023 09:50:57

Código de Verificação:

Y9RD-37XXR**INFORMAÇÕES FISCAIS**

Exigibilidade do ISS:

EXIGÍVEL

Regime de Tributação:

SIMPLES NACIONAL

Município de Incidência do ISS:

PAUDALHO - PE

Local da Prestação:

PAUDALHO - PE

Número do RPS:

Série do RPS:

Tipo do RPS:

Emissão do RPS:

ISS Retido:

SIM**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

22.594.155/0001-36

Inscrição Municipal:

11080

Nome/Razão Social:

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI-EPP

Endereço:

RUA MANOEL JOAQUIM DE SANTANA, CENTRO. 105

Município:

UF:

CEP: **54735335**

E-mail:

glidden@hotmail.comTEL: **8188083793****TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

29.355.454/0001-67

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDALHO

Endereço:

RUA PRAÇA PEDRO COUTINHO, 68 CENTRO

Município:

PAUDALHOUF: **PE**CEP: **58326000**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFORMA E AMPLIACAO #QTD:1 - V.Und.:R\$24.538,79 - TOTAL:R\$24.538,79 - DED.:R\$14.723,27

CONTRATO N° 047/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUNCO NO MUNICIPIO DE PAUDALHO - PE.

BM 09

MATERIAL 60% R\$ 14.723,27

MAO DE OBRAS 40% R\$ 9.815,52

OBS: NAO RETER IMPOSTO NENHUM NA FONTE, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

DADOS BANCARIOS

BANCO SANTANDER

AGENCIA 4059

CONTA CORRENTE 13001685-4

ATESTO 09/05/23
 SERVIÇO FOI EXECUTADO
 MATERIAL FOI ENTREGUE
 Prefeitura Municipal de Paudalho
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Nº: 11.498

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24.538,79

Atividade Prestada:

4120400 -

Código CNAE:

705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias)

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
24.048,01	14.723,27	9.815,52	5,00%	490,78
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar N°003/2009.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.

25405358547968



BOLETIM DE MEDIÇÃO

Proponente		BM - número		BM - Data emissão		BM - Período de referência da medição			Nº do Contrato		Data do Contrato			
PREFEITURA DO PAUDALHO		9		08/05/2023		De	01/02/2023	até	31/03/2023		047/2021	22/10/2021		
Início da obra - data		Término da obra - data		Empresa Contratada				CNPJ		Fontes do recurso				
9/11/2021		3/5/2023		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP				22.594.155/0001-36		Fundo Municipal de Educação				
Medido no período (R\$)		Medido acumulado até o período (R\$)		Objeto do Contrato										
R\$ 24.538,79		R\$ 326.222,60		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUNCO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.										
Valor do contrato (R\$)		Saldo do contrato (R\$)		Local da obra (Bairro / Município / UF)										
R\$ 340.455,93		R\$ 14.233,33		PAUDALHO/PE										
Discriminação dos serviços do Orçamento				Previsto no Orçamento			Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Acumulado		
Item Sub	Descrição			Unid	Qtdes	Preço Unitário(Com BDI)	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 13.109,41			R\$ 13.024,82	R\$ -	R\$ 13.024,82	99,35%	
1.1	FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22.			M2	7,00	R\$ 327,26	R\$ 2.290,82	7,00		R\$ 2.290,82	R\$ -	R\$ 2.290,82	100,00%	
1.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018			M2	43,17	R\$ 73,39	R\$ 3.168,24	43,17		R\$ 3.168,24	R\$ -	R\$ 3.168,24	100,00%	
1.3	CAPINACAO E LIMPEZA SUPERFICIAL DO TERRENO.			M2	0,00	R\$ 3,48	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
1.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017			M3	23,17	R\$ 38,06	R\$ 881,85	23,17		R\$ 881,85	R\$ -	R\$ 881,85	100,00%	
1.5	FORNECIMENTO DE BARRO PARA ATERRO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE COM D.M.T. 6 KM.			M3	32,29	R\$ 34,80	R\$ 1.123,69	32,29		R\$ 1.123,69	R\$ -	R\$ 1.123,69	100,00%	
1.6	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017			M2	208,02	R\$ 13,23	R\$ 2.752,10	208,02		R\$ 2.752,10	R\$ -	R\$ 2.752,10	100,00%	
1.7	APICOAMENTO EM ALVENARIA DE TIJOLO APARENTE			M2	93,13	R\$ 2,15	R\$ 200,24	58,46		R\$ 125,68	R\$ -	R\$ 125,68	62,76%	
1.8	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA OU METALICAS.			M2	16,80	R\$ 11,87	R\$ 199,41	16,80		R\$ 199,41	R\$ -	R\$ 199,41	100,00%	
1.9	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS			UND	6,00	R\$ 10,01	R\$ 60,06	5,00		R\$ 50,05	R\$ -	R\$ 50,05	83,33%	
1.10	TOMBAMENTO MECANICO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 0,30 M, INCLUSIVE O DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO LOCAL (EMLURB)			UND	2,00	R\$ 124,38	R\$ 248,76	2,00		R\$ 248,76	R\$ -	R\$ 248,76	100,00%	
1.11	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017			M2	285,52	R\$ 2,43	R\$ 693,82	285,52		R\$ 693,81	R\$ -	R\$ 693,81	100,00%	
1.12	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017			M2	285,52	R\$ 5,22	R\$ 1.490,42	285,52		R\$ 1.490,41	R\$ -	R\$ 1.490,41	100,00%	
2.0	FUNDAÇÃO						R\$ 26.777,61			R\$ 25.782,49	R\$ -	R\$ 25.782,49	96,28%	
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016			M3	33,11	R\$ 57,83	R\$ 1.914,75	32,53		R\$ 1.881,20	R\$ -	R\$ 1.881,20	98,25%	
2.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016			M3	3,26	R\$ 282,38	R\$ 920,55	3,26		R\$ 920,55	R\$ -	R\$ 920,55	100,00%	
2.3	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:12 - 1 VEZ.			M2	120,38	R\$ 78,22	R\$ 9.416,11	118,82		R\$ 9.294,10	R\$ -	R\$ 9.294,10	98,70%	
2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017			M2	15,37	R\$ 60,39	R\$ 928,19	12,81		R\$ 773,59	R\$ -	R\$ 773,59	83,34%	

Carlos Pinheiro Campos Couveia
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat.: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vandelei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Roney Marcos Lourenço Moreira
Eng. Civil
CREA-PE 034385-D-PE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS
E LOCAÇÕES EIRELI-EPP
CNPJ - 22.594.155/0001-36

Eduardo Melo de A. Lima
Engenheiro Civil
CREA 1818907542/PE



BOLETIM DE MEDIÇÃO

Proponente		BM - número		BM - Data emissão		BM - Período de referência da medição			Nº do Contrato		Data do Contrato			
PREFEITURA DO PAUDALHO		9		08/05/2023		De	01/02/2023	até	31/03/2023		047/2021		22/10/2021	
Início da obra - data		Término da obra - data		Empresa Contratada				CNPJ		Fontes do recurso				
9/11/2021		3/5/2023		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP				22.594.155/0001-36		Fundo Municipal de Educação				
Medido no período (R\$)		Medido acumulado até o período (R\$)		Objeto do Contrato										
R\$ 24.538,79		R\$ 326.222,60		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUNCO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.										
Valor do contrato (R\$)		Saldo do contrato (R\$)		Local da obra (Bairro / Município / UF)										
R\$ 340.455,93		R\$ 14.233,33		PAUDALHO/PE										
Discriminação dos serviços do Orçamento				Previsto no Orçamento			Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Acumulado		
Item Sub	Descrição			Unid	Qtde	Preço Unitário(Com BDI)	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			KG	93,91	R\$ 17,44	R\$ 1.637,79	89,61		89,61	R\$ 1.562,79	R\$ -	R\$ 1.562,79	95,42%
2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			KG	469,19	R\$ 15,81	R\$ 7.417,88	459,19		459,19	R\$ 7.259,79	R\$ -	R\$ 7.259,79	97,87%
2.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			KG	78,68	R\$ 18,62	R\$ 1.465,02	67,87		67,87	R\$ 1.263,73	R\$ -	R\$ 1.263,73	86,26%
2.8	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017			M3	4,01	R\$ 402,72	R\$ 1.614,90	4,01		4,01	R\$ 1.614,90	R\$ -	R\$ 1.614,90	100,00%
2.9	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016			M3	3,53	R\$ 408,03	R\$ 1.440,34	2,97		2,97	R\$ 1.211,84	R\$ -	R\$ 1.211,84	84,14%
2.10	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017			M3	0,63	R\$ 35,05	R\$ 22,08			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.0	ESTRUTURA						R\$ 14.986,73				R\$ 14.638,93	R\$ -	R\$ 14.638,93	97,68%
3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017			M2	10,32	R\$ 60,39	R\$ 623,22	10,32		10,32	R\$ 623,22	R\$ -	R\$ 623,22	100,00%
3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			KG	566,17	R\$ 15,72	R\$ 8.900,18	561,17		561,17	R\$ 8.821,59	R\$ -	R\$ 8.821,59	99,12%
3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015			KG	100,80	R\$ 18,71	R\$ 1.885,96	91,73		91,73	R\$ 1.716,26	R\$ -	R\$ 1.716,26	91,00%
3.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015			M3	3,23	R\$ 382,71	R\$ 1.236,15	2,97		2,97	R\$ 1.136,64	R\$ -	R\$ 1.136,64	91,95%
3.5	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016			M	52,60	R\$ 35,09	R\$ 1.845,73	52,60		52,60	R\$ 1.845,73	R\$ -	R\$ 1.845,73	100,00%
3.6	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016			M	19,50	R\$ 25,41	R\$ 495,49	19,50		19,50	R\$ 495,49	R\$ -	R\$ 495,49	100,00%
4.0	ALVENARIA E REVESTIMENTOS						R\$ 87.274,05				R\$ 86.709,67	R\$ -	R\$ 86.709,67	99,35%

Carlos Pimheiro Campos Souza
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat.: 48.911

Engenheiro Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vandelei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 17.498

Eduardo Melo de A. Lima
Engenheiro Civil
CREA 1818907542/PE

Roney Marcos Lourenço Moreira
Eng. Civil
CREA-PE 034385-D-PE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS
E LOCAÇÕES EIRELI-EPP
CNPJ - 22.594.155/0001-36



BOLETIM DE MEDIÇÃO

Proponente		BM - número		BM - Data emissão		BM - Período de referência da medição			Nº do Contrato		Data do Contrato			
PREFEITURA DO PAUDALHO		9		08/05/2023		De	01/02/2023	até	31/03/2023		047/2021		22/10/2021	
Início da obra - data		Término da obra - data		Empresa Contratada				CNPJ		Fontes do recurso				
9/11/2021		3/5/2023		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP				22.594.155/0001-36		Fundo Municipal de Educação				
Medido no período (R\$)		Medido acumulado até o período (R\$)		Objeto do Contrato										
R\$ 24.538,79		R\$ 326.222,60		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUNCO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.										
Valor do contrato (R\$)		Saldo do contrato (R\$)		Local da obra (Bairro / Município / UF)										
R\$ 340.455,93		R\$ 14.233,33		PAUDALHO/PE										
Discriminação dos serviços do Orçamento				Previsto no Orçamento			Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Acumulado	
Item Sub	Descrição			Unid	Qtdes	Preço Unitário(Com BDI)	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014			M2	560,34	R\$ 57,69	R\$ 32.326,01	557,06		557,06	R\$ 32.136,79	R\$ -	R\$ 32.136,79	99,41%
4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/20 14			M2	1068,88	R\$ 3,29	R\$ 3.516,61	1.042,43		1.042,43	R\$ 3.429,59	R\$ -	R\$ 3.429,59	97,53%
4.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014			M2	988,88	R\$ 28,95	R\$ 28.628,07	984,86		984,86	R\$ 28.511,69	R\$ -	R\$ 28.511,69	99,59%
4.4	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.			M2	330,03	R\$ 61,37	R\$ 20.253,94	330,03		330,03	R\$ 20.253,94	R\$ -	R\$ 20.253,94	100,00%
4.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014			M2	67,09	R\$ 38,00	R\$ 2.549,42	62,57		62,57	R\$ 2.377,66	R\$ -	R\$ 2.377,66	93,26%
5.0	PISOS E REVESTIMENTOS						R\$ 18.178,62				R\$ 17.594,47	R\$ 316,25	R\$ 17.910,72	98,53%
5.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016			M3	16,31	R\$ 282,38	R\$ 4.605,61	16,31		16,31	R\$ 4.605,61	R\$ -	R\$ 4.605,61	100,00%
5.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014			M2	326,35	R\$ 38,00	R\$ 12.401,30	315,57	3,73	319,30	R\$ 11.991,66	R\$ 141,74	R\$ 12.133,40	97,84%
5.3	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020			M	14,10	R\$ 83,10	R\$ 1.171,71	12,00	2,10	14,10	R\$ 997,20	R\$ 174,51	R\$ 1.171,71	100,00%
6.0	COBERTA E REVESTIMENTO						R\$ 26.783,79				R\$ 20.344,79	R\$ 6.364,73	R\$ 26.709,52	99,72%
6.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P			M2	316,35	R\$ 64,47	R\$ 20.395,08	315,57		315,57	R\$ 20.344,79	R\$ -	R\$ 20.344,79	99,75%
6.2	TRAMA DE MADEIRA DE IEI COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPACANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019			M2	39,84	R\$ 58,74	R\$ 2.340,19		39,60	39,60	R\$ -	R\$ 2.326,10	R\$ 2.326,10	99,40%

Carlos Pinheiro Gouveia
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat.: 48.911

Eduardo M. de A. Lima
Engenheiro Civil
Mat.: 4.498
CREA 1818907542/PE

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 4.498

Roney Marcos Lourenço Moreira
Eng. Civil
CREA-PE 034385-D-PE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS
E LOCAÇÕES EIRELI-EPP
CNPJ - 22.594.155/0001-36



BOLETIM DE MEDIÇÃO

Proponente		BM - número		BM - Data emissão		BM - Período de referência da medição			Nº do Contrato		Data do Contrato			
PREFEITURA DO PAUDALHO		9		08/05/2023		De	01/02/2023	até	31/03/2023		047/2021		22/10/2021	
Início da obra - data		Término da obra - data		Empresa Contratada				CNPJ		Fontes do recurso				
9/11/2021		3/5/2023		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP				22.594.155/0001-36		Fundo Municipal de Educação				
Medido no período (R\$)		Medido acumulado até o período (R\$)		Objeto do Contrato										
R\$ 24.538,79		R\$ 326.222,60		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUNCO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.										
Valor do contrato (R\$)		Saldo do contrato (R\$)		Local da obra (Bairro / Município / UF)										
R\$ 340.455,93		R\$ 14.233,33		PAUDALHO/PE										
Discriminação dos serviços do Orçamento				Previsto no Orçamento		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Acumulado		
Item Sub	Descrição			Unid	Qtdes	Preço Unitário(Com BDI)	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
6.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019			M2	39,84	R\$ 41,21	R\$ 1.641,80		39,60	39,60	R\$ -	R\$ 1.631,91	R\$ 1.631,91	99,40%
6.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019			UND	3,00	R\$ 802,24	R\$ 2.406,72		3,00	3,00	R\$ -	R\$ 2.406,72	R\$ 2.406,72	100,00%
7.0	ESQUADRIAS						R\$ 36.503,26				R\$ 35.836,06	R\$ 393,45	R\$ 36.229,52	99,25%
7.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			M2	23,00	R\$ 270,77	R\$ 6.227,71	22,00		22,00	R\$ 5.956,94	R\$ -	R\$ 5.956,94	95,65%
7.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 02 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAO.S.			M2	62,73	R\$ 298,07	R\$ 18.697,92	61,40	1,32	62,72	R\$ 18.301,49	R\$ 393,45	R\$ 18.694,95	99,98%
7.3	ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE E FOLHA EM MADEIRA DE LEI PARA PORTAS EXTERNAS INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS.			M2	25,20	R\$ 459,43	R\$ 11.577,63	25,20		25,20	R\$ 11.577,63	R\$ -	R\$ 11.577,63	100,00%
7.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM PORTÃO DE CORRER/GRADIL SIGRADI OU m2 EQUIVALENTE TÉCNICO FIO 5MM, MALHA 50 X 200MM, GALVANIZADO E COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR VERDE, MEDINDO 3,50 X 2,43M DE ALTURA, INCLUINDO OS MONTANTES (60 X 40 X 1,25MM), PARA FIXAÇÃO			M2	0,00	R\$ 168,47	R\$ -			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
8.0	PINTURA						R\$ 17.399,59				R\$ 2.801,29	R\$ 11.766,27	R\$ 14.567,56	83,72%
8.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO.S. AF_06/2014			M2	227,65	R\$ 10,12	R\$ 2.303,81	27,54	200,11	227,65	R\$ 278,70	R\$ 2.025,11	R\$ 2.303,81	100,00%
8.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO.S. AF_06/2014			M2	227,65	R\$ 10,03	R\$ 2.283,32	27,54	200,11	227,65	R\$ 276,22	R\$ 2.007,10	R\$ 2.283,32	100,00%
8.3	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃO.S. AF_11/2016			M2	456,81	R\$ 12,02	R\$ 5.490,85		221,20	221,20	R\$ -	R\$ 2.658,82	R\$ 2.658,82	48,42%
8.4	PINTURA A OLEO, 2 DEMAO.S			M2	85,83	R\$ 16,40	R\$ 1.407,61	63,00	22,83	85,83	R\$ 1.033,20	R\$ 374,41	R\$ 1.407,61	100,00%
8.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014			M2	343,04	R\$ 17,24	R\$ 5.914,00	70,37	272,67	343,04	R\$ 1.213,17	R\$ 4.700,83	R\$ 5.914,00	100,00%
9.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						R\$ 18.475,67				R\$ 15.377,45	R\$ 426,36	R\$ 15.803,81	85,54%

Carlos Pinheiro Campos Louveira
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat.: 48.911

Eduardo Melo de A. Lima
Engenheiro Civil
Mat.: 11.498

Roney Marcos Lourenço Moreira
Eng. Civil
CREA-PE 034385-D-PE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS
E LOCAÇÕES EIRELI-EPP
CNPJ - 22.594.155/0001-36



BOLETIM DE MEDIÇÃO

Proponente		BM - número		BM - Data emissão		BM - Período de referência da medição			Nº do Contrato		Data do Contrato			
PREFEITURA DO PAUDALHO		9		08/05/2023		De	01/02/2023	até	31/03/2023		047/2021		22/10/2021	
Início da obra - data		Término da obra - data		Empresa Contratada				CNPJ		Fontes do recurso				
9/11/2021		3/5/2023		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP				22.594.155/0001-36		Fundo Municipal de Educação				
Medido no período (R\$)		Medido acumulado até o período (R\$)		Objeto do Contrato										
R\$ 24.538,79		R\$ 326.222,60		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUNCO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.										
Valor do contrato (R\$)		Saldo do contrato (R\$)		Local da obra (Bairro / Município / UF)										
R\$ 340.455,93		R\$ 14.233,33		PAUDALHO/PE										
Discriminação dos serviços do Orçamento				Previsto no Orçamento			Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Acumulado	
Item Sub	Descrição			Unid	Qtde	Preço Unitário(Com BDI)	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
9.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013			UN	4,00	R\$ 216,87	R\$ 867,48	4,00		4,00	R\$ 867,48	R\$ -	R\$ 867,48	100,00%
9.2	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			UN	8,00	R\$ 96,76	R\$ 774,08	8,00		8,00	R\$ 774,08	R\$ -	R\$ 774,08	100,00%
9.3	FORNECIMENTO DE BALCAO EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESURA, INCLUSIVE CORTE PARA DUAS CUBAS, TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO.			M2	6,59	R\$ 320,58	R\$ 2.112,62	6,22		6,22	R\$ 1.994,00	R\$ -	R\$ 1.994,00	94,39%
9.4	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			UN	2,00	R\$ 614,88	R\$ 1.229,76			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
9.5	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013			UN	2,00	R\$ 361,41	R\$ 722,82	2,00		2,00	R\$ 722,82	R\$ -	R\$ 722,82	100,00%
9.6	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM			UN	4,00	R\$ 142,12	R\$ 568,48		3,00	3,00	R\$ -	R\$ 426,36	R\$ 426,36	75,00%
9.7	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020			UND	1,00	R\$ 4.166,29	R\$ 4.166,29	1,00		1,00	R\$ 4.166,29	R\$ -	R\$ 4.166,29	100,00%
9.8	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020			UND	1,00	R\$ 3.422,55	R\$ 3.422,55	1,00		1,00	R\$ 3.422,55	R\$ -	R\$ 3.422,55	100,00%
9.9	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			UND	4,00	R\$ 153,89	R\$ 615,56	3,00		3,00	R\$ 461,67	R\$ -	R\$ 461,67	75,00%
9.10	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.			PT	4,00	R\$ 83,94	R\$ 335,76	4,00		4,00	R\$ 335,76	R\$ -	R\$ 335,76	100,00%
9.11	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.			PT	2,00	R\$ 80,35	R\$ 160,70	2,00		2,00	R\$ 160,70	R\$ -	R\$ 160,70	100,00%

Carlos Pinheiro Campos Souza
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat. 45311

Paulo Vandenolfe de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat. 11.498
Eduardo Melo de A. Lima
Engenheiro Civil
CREA 1618907542/PE

Roney Marcos Lourenço Moreira
Eng. Civil
CREA-PE 034385-D-PE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS
E LOCAÇÕES EIRELI-EPP
CNPJ - 22.594.155/0001-36



BOLETIM DE MEDIÇÃO

Proponente		BM - número		BM - Data emissão		BM - Período de referência da medição			Nº do Contrato		Data do Contrato			
PREFEITURA DO PAUDALHO		9		08/05/2023		De	01/02/2023	até	31/03/2023	047/2021		22/10/2021		
Início da obra - data		Término da obra - data		Empresa Contratada				CNPJ		Fontes do recurso				
9/11/2021		3/5/2023		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP				22.594.155/0001-36		Fundo Municipal de Educação				
Medido no período (R\$)		Medido acumulado até o período (R\$)		Objeto do Contrato										
R\$ 24.538,79		R\$ 326.222,60		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUNCO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.										
Valor do contrato (R\$)		Saldo do contrato (R\$)		Local da obra (Bairro / Município / UF)										
R\$ 340.455,93		R\$ 14.233,33		PAUDALHO/PE										
Discriminação dos serviços do Orçamento				Previsto no Orçamento			Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Acumulado		
Item Sub	Descrição			Unid	Qtde	Preço Unitário(Com BDI)	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
9.12	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUMNA OU O SUB-COLETOR			PT	6,00	R\$ 78,52	R\$ 471,12	5,00		5,00	R\$ 392,60	R\$ -	R\$ 392,60	83,33%
9.13	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUMNA OU O SUBCOLETOR.			PT	6,00	R\$ 75,38	R\$ 452,28	5,00		5,00	R\$ 376,90	R\$ -	R\$ 376,90	83,33%
9.14	PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA,ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.			PT	15,00	R\$ 110,64	R\$ 1.659,60	13,00		13,00	R\$ 1.438,32	R\$ -	R\$ 1.438,32	86,67%
9.15	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF.1416, FABRIMAR O SIMILAR DE 1/2 POL., INCLUSIVE FIXACAO.			PT	3,00	R\$ 68,97	R\$ 206,91	1,00		1,00	R\$ 68,97	R\$ -	R\$ 68,97	33,33%
9.16	FORNECIMENTO DE CHUVEIRO DE METAL,DIAMETRO DE 1/2 POL., INCLUSIVE FIXACAO.			PT	3,00	R\$ 67,67	R\$ 203,01	1,00		1,00	R\$ 67,67	R\$ -	R\$ 67,67	33,33%
9.17	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020			UND	4,00	R\$ 31,91	R\$ 127,64	4,00		4,00	R\$ 127,64	R\$ -	R\$ 127,64	100,00%
9.18	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 CR 353,5			M2	1,16	R\$ 326,74	R\$ 379,01			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
9.19	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS			UND	0,00	R\$ 750,90	R\$ -			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 24.759,32				R\$ 19.793,21	R\$ 726,38	R\$ 20.519,59	82,88%
10.1	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.			PT	66,00	R\$ 102,08	R\$ 6.737,28	52,00	2,00	54,00	R\$ 5.308,16	R\$ 204,16	R\$ 5.512,32	81,82%
10.2	PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.			PT	4,00	R\$ 131,91	R\$ 527,64	4,00		4,00	R\$ 527,64	R\$ -	R\$ 527,64	100,00%
10.3	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR,INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.			PT	13,00	R\$ 86,83	R\$ 1.128,79	9,00	4,00	13,00	R\$ 781,47	R\$ 347,32	R\$ 1.128,79	100,00%
10.4	PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.			PT	63,00	R\$ 155,15	R\$ 9.774,45	63,00		63,00	R\$ 9.774,45	R\$ -	R\$ 9.774,45	100,00%

Carlos Pinheiro Campos Louveira
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat.: 43.911

Eduardo Melo de A. Lima
Engenheiro Civil
CREA 1818907542/PE

Roney Marcos Lourenço Moreira
Eng. Civil
CREA-PE 034385-D-PE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS
E LOCAÇÕES EIRELI-EPP
CNPJ - 22.594.155/0001-36



BOLETIM DE MEDIÇÃO

Proponente		BM - número		BM - Data emissão		BM - Período de referência da medição			Nº do Contrato		Data do Contrato			
PREFEITURA DO PAUDALHO		9		08/05/2023		De	01/02/2023	até	31/03/2023		047/2021		22/10/2021	
Início da obra - data		Término da obra - data		Empresa Contratada				CNPJ		Fontes do recurso				
9/11/2021		3/5/2023		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP				22.594.155/0001-36		Fundo Municipal de Educação				
Medido no período (R\$)		Medido acumulado até o período (R\$)		Objeto do Contrato										
R\$ 24.538,79		R\$ 326.222,60		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUNCO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.										
Valor do contrato (R\$)		Saldo do contrato (R\$)		Local da obra (Bairro / Município / UF)										
R\$ 340.455,93		R\$ 14.233,33		PAUDALHO/PE										
Discriminação dos serviços do Orçamento				Previsto no Orçamento			Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Acumulado		
Item Sub	Descrição			Unid	Qtdes	Preço Unitário(Com BDI)	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
10.5	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, DE LED 36 W - 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			UND	56,00	R\$ 49,03	R\$ 2.745,68	44,00	2,00	46,00	R\$ 2.157,32	R\$ 98,06	R\$ 2.255,38	82,14%
10.6	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020			UND	6,00	R\$ 29,48	R\$ 176,88	4,00		4,00	R\$ 117,92	R\$ -	R\$ 117,92	66,67%
10.7	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020			UND	4,00	R\$ 245,42	R\$ 981,68	4,00		4,00	R\$ 981,68	R\$ -	R\$ 981,68	100,00%
10.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			UND	0,00	R\$ 574,98	R\$ -			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
10.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			UN	5,00	R\$ 10,22	R\$ 51,10	3,00	2,00	5,00	R\$ 30,66	R\$ 20,44	R\$ 51,10	100,00%
10.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			UN	3,00	R\$ 9,66	R\$ 28,98	3,00		3,00	R\$ 28,98	R\$ -	R\$ 28,98	100,00%
10.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			UN	7,00	R\$ 11,28	R\$ 78,96	2,00	5,00	7,00	R\$ 22,56	R\$ 56,40	R\$ 78,96	100,00%
10.12	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC			UN	1,00	R\$ 121,20	R\$ 121,20			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.13	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017			UN	1,00	R\$ 62,37	R\$ 62,37	1,00		1,00	R\$ 62,37	R\$ -	R\$ 62,37	100,00%
10.14	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020			UN	4,00	R\$ 245,42	R\$ 981,68			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.15	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020			UN	8,00	R\$ 29,50	R\$ 236,00			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.16	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P			UND	1,00	R\$ 1.126,63	R\$ 1.126,63			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

Carlos Pinheiro Carneiro Gouveia
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat.: 48.911

Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 44.498
Eduardo Melo de A. Lima
Engenheiro Civil
CREA 1818907542/PE

Roney Marcos Lourenço Moreira
Eng. Civil
CREA-PE 034385-D-PE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS
E LOCAÇÕES EIRELI-EPP
CNPJ - 22.594.155/0001-36



BOLETIM DE MEDIÇÃO

Proponente		BM - número		BM - Data emissão		BM - Período de referência da medição			Nº do Contrato		Data do Contrato			
PREFEITURA DO PAUDALHO		9		08/05/2023		De	01/02/2023	até	31/03/2023		047/2021		22/10/2021	
Início da obra - data		Término da obra - data		Empresa Contratada				CNPJ		Fontes do recurso				
9/11/2021		3/5/2023		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP				22.594.155/0001-36		Fundo Municipal de Educação				
Medido no período (R\$)		Medido acumulado até o período (R\$)		Objeto do Contrato										
R\$ 24.538,79		R\$ 326.222,60		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUNCO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.										
Valor do contrato (R\$)		Saldo do contrato (R\$)		Local da obra (Bairro / Município / UF)										
R\$ 340.455,93		R\$ 14.233,33		PAUDALHO/PE										
Discriminação dos serviços do Orçamento				Previsto no Orçamento			Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Acumulado		
Item Sub	Descrição			Unid	Qtdes	Preço Unitário(Com BDI)	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
11.0	PAISAGISMO						R\$ 28.969,76				R\$ 24.655,01	R\$ 3.376,57	R\$ 28.031,58	96,76%
11.1	COLCHAO DE AREIA, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA DE ESPALHAMENTO E TRANSPORTE COM CARRO DE MAO.			M3	9,09	R\$ 92,01	R\$ 836,37	8,06	1,03	9,09	R\$ 741,60	R\$ 94,77	R\$ 836,37	100,00%
11.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA MEDINDO 6,00X3,60M, ESTRUTURA INTERNA EM TUBO INDUSTRIAL DE 30X30, CANTONEIRA L DE 11/2"X1/8", TUBO PATENTE DE 3/4", TRATADO COM ANTI CORROSIVO E COM APLICAÇÃO DE ESMALTE SINTÉTICO, ILUMINADA INTERNAMENTE COM 10 CONJUNTO			M2	10,00	R\$ 1.203,40	R\$ 12.034,00	10,00		10,00	R\$ 12.034,00	R\$ -	R\$ 12.034,00	100,00%
11.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015			M2	117,88	R\$ 55,88	R\$ 6.587,13	117,88		117,88	R\$ 6.587,13	R\$ -	R\$ 6.587,13	100,00%
11.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA JARDIM, DIMENSOES (1,00 X 0,20 X 0,075)M, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2			M	45,00	R\$ 19,10	R\$ 859,50	45,00		45,00	R\$ 859,50	R\$ -	R\$ 859,50	100,00%
11.5	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014			UN	2,00	R\$ 101,43	R\$ 202,86	2,00		2,00	R\$ 202,86	R\$ -	R\$ 202,86	100,00%
11.6	FORNECIMENTO DE TORNEIRA AMARELA PARA JARDIM, DIAMETRO 3/4 POL., INCLUSIVE FIXAÇÃO.			UND	2,00	R\$ 27,56	R\$ 55,12	2,00		2,00	R\$ 55,12	R\$ -	R\$ 55,12	100,00%
11.7	PREPARO DE SOLO PARA GRAMADO COM 10,0 CM DE ESPESSURA, FEITO COM BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO CURTIDO, TRACO 4 1, COM TODO MATERIAL FORNECIDO PELO EMPREITEIRO			M3	147,00	R\$ 16,55	R\$ 2.432,85	147,00		147,00	R\$ 2.432,85	R\$ -	R\$ 2.432,85	100,00%
11.8	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018			M2	147,00	R\$ 11,85	R\$ 1.741,95	147,00		147,00	R\$ 1.741,95	R\$ -	R\$ 1.741,95	100,00%
11.9	FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA PHOENIX (ESTIPE DE 0,60M), INCLUINDO A PREPARAÇÃO DE COVA DE 40,0 X 40,0 X 40,0 CM, COM BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO CURTIDO.			UND	3,00	R\$ 92,33	R\$ 276,99			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.10	FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS HERBACEAS TIPO FOLHAGEM - GRUPO 2 (CANA DA INDIA, BRASILEIRINHO, NUVEM, PANAMA, PAQUEVIRA, PINGO DE OURO, ACALIFA, CHUMBINHO, IXORA, BEIJO, SÁVIA AZUL, TINHORAO, ETC)-ALTURA DA MUDA 40CM.			UND	3,00	R\$ 19,03	R\$ 57,09			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

Carlos Pinheiro Campesinato
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat.: 48.911

Eduardo Melo de A. Lima
Eng. Civil
CREA 1818907542/PE

Paulo Vanciel de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Roney Marcos Lourenço Moreira
Eng. Civil
CREA-PE 034385-D-PE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS
E LOCAÇÕES EIRELI-EPP
CNPJ - 22.594.155/0001-36



BOLETIM DE MEDIÇÃO

Proponente		BM - número		BM - Data emissão		BM - Período de referência da medição			Nº do Contrato		Data do Contrato			
PREFEITURA DO PAUDALHO		9		08/05/2023		De	01/02/2023	até	31/03/2023		047/2021		22/10/2021	
Início da obra - data		Término da obra - data		Empresa Contratada				CNPJ		Fontes do recurso				
9/11/2021		3/5/2023		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP				22.594.155/0001-36		Fundo Municipal de Educação				
Medido no período (R\$)		Medido acumulado até o período (R\$)		Objeto do Contrato										
R\$ 24.538,79		R\$ 326.222,60		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUNCO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.										
Valor do contrato (R\$)		Saldo do contrato (R\$)		Local da obra (Bairro / Município / UF)										
R\$ 340.455,93		R\$ 14.233,33		PAUDALHO/PE										
Discriminação dos serviços do Orçamento				Previsto no Orçamento			Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Acumulado		
Item Sub	Descrição			Unid	Qtdes	Preço Unitário(Com BDI)	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
11.11	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANCO MODELO RECIFE ANTIGO REF. B-112, GRAMETAL OU SIMILAR PINTADO E COM ROSCAS PARA CHUMBAMENTO, INCLUSIVE ESCAVACAO, REMOCAO E BASE DE CONCRETO.			UND	4,00	R\$ 820,45	R\$ 3.281,80		4,00	4,00	R\$ -	R\$ 3.281,80	R\$ 3.281,80	100,00%
11.12	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM			UND	1,00	R\$ 604,10	R\$ 604,10			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.1	ITENS INSERIDOS NO REPLANILHAMENTO						R\$ 26.069,34				R\$ 25.125,80	R\$ -	R\$ 25.125,80	96,38%
12.1.1	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015			M²	2,98	R\$ 537,05	R\$ 1.600,40	1,63		1,63	R\$ 875,39	R\$ -	R\$ 875,39	54,70%
12.1.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019			M²	368,79	R\$ 17,85	R\$ 6.582,90	368,79		368,79	R\$ 6.582,90	R\$ -	R\$ 6.582,90	100,00%
12.1.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019			M²	368,79	R\$ 46,79	R\$ 17.255,68	368,79		368,79	R\$ 17.255,68	R\$ -	R\$ 17.255,68	100,00%
12.1.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020			M²	6,00	R\$ 105,06	R\$ 630,36	3,92		3,92	R\$ 411,83	R\$ -	R\$ 411,83	65,33%
12.2	ITENS INSERIDOS NO 2º REPLANILHAMENTO						R\$ 1.168,78				R\$ -	R\$ 1.168,78	R\$ 1.168,78	100,00%
12.2.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			UND	1,00	R\$ 19,53	R\$ 19,53		1,00	1,00	R\$ -	R\$ 19,53	R\$ 19,53	100,00%
12.2.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 24 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			UND	1,00	R\$ 115,79	R\$ 115,79		1,00	1,00	R\$ -	R\$ 115,79	R\$ 115,79	100,00%
12.2.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			M	7,20	R\$ 10,25	R\$ 73,80		7,20	7,20	R\$ -	R\$ 73,80	R\$ 73,80	100,00%
12.2.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014			UND	2,00	R\$ 112,29	R\$ 224,58		2,00	2,00	R\$ -	R\$ 224,58	R\$ 224,58	100,00%


Carlos Pinheiro Campos
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat.: 48.911

Eduardo Melo de A. Lima
Engenheiro Civil
CREA 1818907542/PE

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Roney Marcos Lourenço Moreira
Eng. Civil
CREA-PE 034385-D-PE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS
E LOCAÇÕES EIRELI-EPP
CNPJ - 22.594.155/0001-36

BOLETIM DE MEDIÇÃO														
		Proponente		BM - número		BM - Data emissão		BM - Período de referência da medição			Nº do Contrato		Data do Contrato	
PREFEITURA DO PAUDALHO		9		08/05/2023		De 01/02/2023 até 31/03/2023				047/2021		22/10/2021		
Início da obra - data		Término da obra - data		Empresa Contratada			CNPJ			Fontes do recurso				
9/11/2021		3/5/2023		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP			22.594.155/0001-36			Fundo Municipal de Educação				
Medido no período (R\$)		Medido acumulado até o período (R\$)		Objeto do Contrato										
R\$ 24.538,79		R\$ 326.222,60		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUNCO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.										
Valor do contrato (R\$)		Saldo do contrato (R\$)		Local da obra (Bairro / Município / UF)										
R\$ 340.455,93		R\$ 14.233,33		PAUDALHO/PE										
Discriminação dos serviços do Orçamento				Previsto no Orçamento				Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Acumulado	
Item Sub	Descrição			Unid	Qtdes	Preço Unitário(Com BDI)	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
12.2.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM E M PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			UND	1,00	R\$ 182,11	R\$ 182,11		1,00	1,00	R\$ -	R\$ 182,11	R\$ 182,11	100,00%
12.2.6	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021			M²	39,84	R\$ 13,88	R\$ 552,97		39,84	39,84	R\$ -	R\$ 552,97	R\$ 552,97	100,00%
TOTALIS:							R\$ 340.455,93				R\$ 301.683,81	R\$ 24.538,79	R\$ 326.222,60	95,82%
Observações:														
Carlos Pinheiro Campos Siqueira Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente Mat.: 48.911				Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498				Glidden Empreendimentos e Locações Eireli - EPP CNPJ - 22.594.155/0001-36			Roney Marcos Lourenço Martins Eng. Civil CREA-PE 034385-D-PE			
Secretário de Desenvolvimento Urbano e Agrário Nome: Matrícula:				Resp. Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço Nome: Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Cargo: Engenheiro Civil - OREA: 22.065 D/PE				Responsável Legal da Empresa Nome: Profissão:			Engenheiro Responsável da Empresa Nome: Registro:			

Eduardo Melo de A. Lima
 Engenheiro Civil
 CREA 1813907542/PE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUNCO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 9º BM

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	CÁLCULO							
				QUANT.	COMP.	LARG.	ALT.	ESP.	TAXA	TOTAL	UND.
5.0			PISOS E REVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2			REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	-	-	-	-	-	-	-	M²
			Piso da base do mastro	-	3,04	1,23	-	-	-	-	3,73 M²
			TOTAL EXECUTADO								3,73 M²
5.3			SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2.0 CM. AF_09/2020	-	-	-	-	-	-	-	M
			Quantitativo excedente do 8º BM do contrato (Conforme Memória de Cálculo da medição)	2,10	-	-	-	-	-	-	2,10 M
			TOTAL EXECUTADO								2,10 M
6.0			COBERTA E REVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2			TRAMA DE MADEIRA DE IEI COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	-	-	-	-	-	-	-	UND
			Coberta da rampa de entrada	-	8,25	4,80	-	-	-	-	39,60 UND
			TOTAL EXECUTADO								39,60 UND
6.3			TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	-	-	-	-	-	-	-	M²
			Coberta da rampa de entrada	-	8,25	4,80	-	-	-	-	39,60 M²
			TOTAL EXECUTADO								39,60 M²
6.4			FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	-	-	-	-	-	-	-	M²
			Coberta da rampa de entrada	3,00	-	-	-	-	-	-	3,00 M²
			TOTAL EXECUTADO								3,00 M²
7.0			ESQUADRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 02 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOIS.	-	-	-	-	-	-	-	M²
			Quantitativo excedente do 2º BM do 1º Termo Aditivo (Conforme Memória de Cálculo da medição)	1,32	-	-	-	-	-	-	1,32 M²
			TOTAL EXECUTADO								1,32 M²
8.0			PINTURA	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1			APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	-	-	-	-	-	-	-	M²
			Quantitativo excedente do 8º BM do contrato (Conforme Memória de Cálculo da medição)	200,11	-	-	-	-	-	-	200,11 M²
			TOTAL EXECUTADO								200,11 M²
8.2			APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	-	-	-	-	-	-	-	M²
			Quantitativo excedente do 8º BM do contrato (Conforme Memória de Cálculo da medição)	200,11	-	-	-	-	-	-	200,11 M²
			TOTAL EXECUTADO								200,11 M²
8.3			APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOIS. AF_11/2016	-	-	-	-	-	-	-	M²
			Muro lateral esquerdo	-	16,20	-	1,70	-	-	-	27,54 M²
			Muro lateral esquerdo	-	8,00	-	1,70	-	-	-	13,60 M²
			Muro lateral esquerdo	-	12,10	-	1,85	-	-	-	22,38 M²
			Muro dos fundos	-	24,00	-	1,70	-	-	-	40,80 M²
			Muro lateral direito (interno e externo)	2,00	6,10	-	1,96	-	-	-	23,91 M²
			Muro lateral direito (interno e externo)	2,00	6,20	-	2,10	-	-	-	26,04 M²
			Muro lateral direito (interno e externo)	2,00	6,10	-	1,80	-	-	-	21,96 M²
			Muro lateral direito (interno e externo)	2,00	8,00	-	1,70	-	-	-	27,20 M²
			Fossa e sumidouro	-	3,40	1,30	-	-	-	-	4,42 M²
			Fossa e sumidouro	-	2,60	1,50	-	-	-	-	3,90 M²
			Mureta lateral (interno e externo)	-	2,30	-	1,50	-	-	-	3,45 M²
			Caixas de passagem	6,00	1,00	1,00	-	-	-	-	6,00 M²
			TOTAL EXECUTADO								221,20 M²
8.4			PINTURA A OLEO, 2 DEMAOIS	-	-	-	-	-	-	-	M²
			Porta de enrolar da cozinha	-	-	1,20	1,40	-	-	-	1,68 M²
			Meio-fio	-	18,60	-	0,15	-	-	-	2,79 M²
			Meio-fio	-	24,80	-	0,15	-	-	-	3,72 M²
			Meio-fio	-	31,80	-	0,15	-	-	-	4,77 M²
			Meio-fio ao redor do brinquedo	2,00	8,20	-	0,15	-	-	-	2,46 M²
			Meio-fio ao redor do brinquedo	2,00	5,20	-	0,15	-	-	-	1,56 M²
			Meio-fio da área do parque/brinquedo (próximo ao muro)	-	7,00	-	0,15	-	-	-	1,05 M²
			Mastro	2,00	-	0,24	6,50	-	-	-	3,12 M²
			Mastro	-	-	0,24	7,00	-	-	-	1,68 M²
			TOTAL EXECUTADO								22,83 M²
8.5			APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	-	-	-	-	-	-	-	M²

Eduardo Melo de A. Lima
Engenheiro Civil
CREA 1818007542/PE

Carlos Pinheiro Goulart Gouveia
Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
Mat.: 48.971

Engenheiro Civil
Mat.: 48.971

Roney Marcos Lourenço Moreira
Eng. Civil
CREA-PE 034385-D-PE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS
E LOCAÇÕES EIRELI-EPP
CNPJ 22.594.155/0001-36

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUNCO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 9º BM

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	CÁLCULO							
				QUANT.	COMP.	LARG.	ALT.	ESP.	TAXA	TOTAL	UND.
			Quantitativo excedente do 8º BM do contrato (Conforme Memória de Cálculo da medição)	30,87	-	-	-	-	-	30,87	M²
			Fachada Lateral Direita	-	17,00	-	4,00	-	-	68,00	M²
			Dedução de janelas	3,00	-	1,50	1,00	-	-1,00	-4,50	M²
			Fachada Lateral Esquerda	-	17,00	-	4,00	-	-	68,00	M²
			Dedução de janelas	3,00	-	1,50	1,00	-	-1,00	-4,50	M²
			Fachada dos Fundos	-	22,70	-	3,50	-	-	79,45	M²
			Dedução de janelas	4,00	-	1,50	1,00	-	-1,00	-6,00	M²
			Mureta frontal (interno e externo)	-	10,70	-	1,14	-	-	12,19	M²
			Mureta frontal (interno e externo)	-	5,80	-	1,54	-	-	8,93	M²
			Mureta frontal (interno e externo)	-	9,00	-	1,42	-	-	12,78	M²
			Pilares da cobertura da rampa de acesso	4,00	0,48	-	2,80	-	-	5,37	M²
			Casa do compressor	2,00	1,00	-	0,80	-	-	1,60	M²
			Casa do compressor	-	0,60	-	0,80	-	-	0,48	M²
			TOTAL EXECUTADO							272,67	M²
9.0			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								
9.6			BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	-	-	-	-	-	-	-	UND
			WC PCD	3,00	-	-	-	-	-	3,00	UND
			TOTAL EXECUTADO							3,00	UND
10.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
10.1			PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAI XA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	-	-	-	-	-	-	-	PT
			Rampa de entrada da escola	2,00	-	-	-	-	-	2,00	PT
			TOTAL EXECUTADO							2,00	PT
10.3			PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	-	-	-	-	-	-	-	PT
			WC dentro da Sala de Aula 02	1,00	-	-	-	-	-	1,00	PT
			Dispensa da Cozinha	1,00	-	-	-	-	-	1,00	PT
			Depósito	1,00	-	-	-	-	-	1,00	PT
			WC da Sala de Enfermagem	1,00	-	-	-	-	-	1,00	PT
			TOTAL EXECUTADO							4,00	PT
10.5			LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, DE LED 36 W - 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	UND
			Rampa de entrada da escola	2,00	-	-	-	-	-	2,00	UND
			TOTAL EXECUTADO							2,00	UND
10.9			DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	-	-	-	-	-	-	-	UND
				2,00	-	-	-	-	-	2,00	UND
			TOTAL EXECUTADO							2,00	UND
10.11			DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	-	-	-	-	-	-	-	UND
				5,00	-	-	-	-	-	5,00	UND
			TOTAL EXECUTADO							5,00	UND
11.0			PAISAGISMO								
11.1			COLCHAO DE AREIA, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA DE ESPALHAMENTO E TRANSPORTE COM CARRO DE MAO.	-	-	-	-	-	-	-	M³
			Quantitativo excedente do 8º BM do contrato (Conforme Memória de Cálculo da medição)	1,03	-	-	-	-	-	1,03	M³
			TOTAL EXECUTADO							1,03	M³
11.11			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANCO MODELO RECIFE ANTIGO REF. B-112, GRAMETAL OU SIMILAR PINTADO E COM ROSCAS PARA CHUMBAMENTO, INCLUSIVE ESCAVACAO, REMOCAO E BASE DE CONCRETO.	-	-	-	-	-	-	-	UND
			Pracinha	4,00	-	-	-	-	-	4,00	UND
			TOTAL EXECUTADO							4,00	UND
12.2			ITENS INSERIDOS NO 2º REPLANILHAMENTO								
12.2.1			DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	-	-	-	-	-	-	-	UND
				1,00	-	-	-	-	-	1,00	UND
			TOTAL EXECUTADO							1,00	UND
12.2.2			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 24 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-	-	-	-	-	-	-	UND
				1,00	-	-	-	-	-	1,00	UND
			TOTAL EXECUTADO							1,00	UND
12.2.3			TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	-	-	-	-	-	-	-	M
			Dreno para ar-condicionado na Sala 2	-	1,70	-	-	-	-	1,70	M
			Dreno para ar-condicionado na Sala 2	-	5,50	-	-	-	-	5,50	M
			TOTAL EXECUTADO							7,20	M

Carlos Pinheiro Campos Louveira
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat.: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho

Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Roney Marcos Lourenço Moreira
Eng. Civil
CREA-PE 034385-D-PE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS
E LOCAÇÕES BIRELI-EPP
CNPJ - 22.594.155/0001-36

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUNCO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 9º BM

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	CÁLCULO								
				QUANT.	COMP.	LARG.	ALT.	ESP.	TAXA	TOTAL	UND.	
12.2.4			JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	-	-	-	-	-	-	-	UND	
				2,00	-	-	-	-	-	2,00	UND	
										TOTAL EXECUTADO	2,00	UND
12.2.5			LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM E M PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	-	-	-	-	-	-	-	UND	
			WC dentro da Sala de Aula 02	1,00	-	-	-	-	-	1,00	UND	
										TOTAL EXECUTADO	1,00	UND
12.2.6			PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	-	-	-	-	-	-	-	M²	
			Pintura da cobertura da rampa	-	8,30	4,80	-	-	-	39,84	M²	
										TOTAL EXECUTADO	39,84	M²

Carlos Pinheiro Campos Bouveia
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat.: 43.911

Roney Marcos Lourenço Moreira
Eng. Civil
CREA-PE 034385-D-PE

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 43.911

GLIDEN EMPREENDIMENTOS
E LOCAÇÕES EIRELI-EPP
CNPJ - 22.594.155/0001-36

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

Relatório Fotográfico

OBJETO DO CONTRATO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUNCO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.	DATA EMISSÃO: DE	08/05/2023
LOCAL:	PAUDALHO/PE	Nº MEDIÇÃO: DA	9º DO CONTRATO
EMPRESA:	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI – EPP CNPJ: 22.594.155/0001-36	Nº CONTRATO:	047/2021



Foto 1: Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45 x 45 cm. (Item 5.2)



Foto 2: Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. (Item 5.3)



Foto 3: Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. (Item 5.3)



Foto 4: Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças, incluindo telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial. (Itens 6.2 e 6.3)

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat.: 48.311

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vandoirlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.495

Roney Marcos Lourenço Moreira
Eng. Civil
CREA-PE 034385-D-PE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS
E LOCAÇÕES EIRELI-EPP
CNPJ - 22.594.155/0001-36

Eduardo Melo de A. Lima
Engenheiro Civil
CREA 161307542/PE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

Relatório Fotográfico

OBJETO DO CONTRATO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUNCO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.	DATA EMISSÃO: DE	08/05/2023
LOCAL:	PAUDALHO/PE	Nº DA MEDIÇÃO:	9º DO CONTRATO
EMPRESA:	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI – EPP CNPJ: 22.594.155/0001-36	Nº CONTRATO:	047/2021



Foto 5: Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças, incluindo telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial. (Itens 6.2 e 6.3)



Foto 6: Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira. (Item 6.4)



Foto 7: Gradil e/ou portão com ferragens inclusive aparelhamento e pintura com esmalte sintético duas demãos. (Item 7.2)



Foto 8: Gradil e/ou portão com ferragens inclusive aparelhamento e pintura com esmalte sintético duas demãos. (Item 7.2)

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat.: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
M.º 41.498

Roney Marcos Lourenço Moreira
Eng. Civil
CREA-PE 034385-D-PE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS
E LOCAÇÕES EIRELI-EPP
CNPJ - 22.594.155/0001-36

Eduardo Melo de A. Lima
Engenheiro Civil
CREA 1618907542/PE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

Relatório Fotográfico

OBJETO DO CONTRATO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUNCO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.	DATA EMISSÃO: DE	08/05/2023
LOCAL:	PAUDALHO/PE	Nº DA MEDIÇÃO:	9º DO CONTRATO
EMPRESA:	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI – EPP CNPJ: 22.594.155/0001-36	Nº CONTRATO:	047/2021



Foto 9: Aplicação manual de pintura em paredes, duas demãos, incluindo aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. (Item 8.1 e 8.2)



Foto 10: Aplicação manual de pintura em paredes, duas demãos, incluindo aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. (Item 8.1 e 8.2)

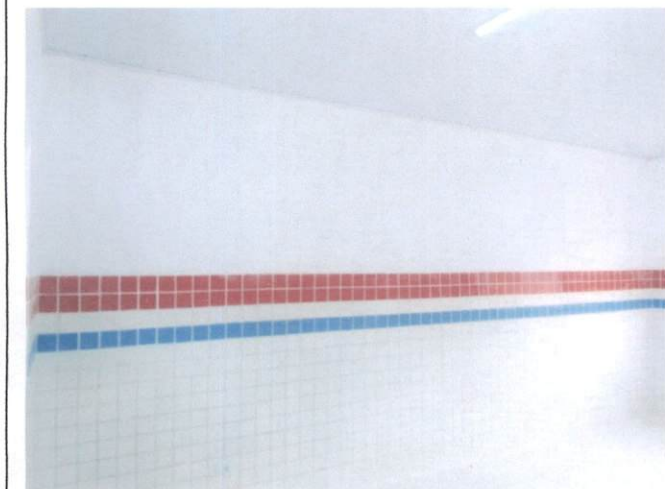


Foto 11: Aplicação manual de pintura em paredes, duas demãos, incluindo aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. (Item 8.1 e 8.2)



Foto 12: Aplicação manual de pintura em paredes, duas demãos, incluindo aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. (Item 8.1 e 8.2)

Carlos Pinheiro dos Santos Gouveia
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat.: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 1.498

Roney Marcos Lourenço Moreira
Eng. Civil
CREA-PE 034385-D-PE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS
E LOCAÇÕES EIRELI-EPP
CNPJ - 22.594.155/0001-36

Eduardo Melo de A. Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

Relatório Fotográfico

OBJETO DO CONTRATO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUNCO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.	DATA EMISSÃO: DE	08/05/2023
LOCAL:	PAUDALHO/PE	Nº MEDIÇÃO: DA	9º DO CONTRATO
EMPRESA:	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI – EPP CNPJ: 22.594.155/0001-36	Nº CONTRATO:	047/2021



Foto 13: Aplicação manual de pintura em paredes, duas demãos, incluindo aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. (Item 8.1 e 8.2)



Foto 14: Aplicação manual de pintura em paredes, duas demãos, incluindo aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. (Item 8.1 e 8.2)



Foto 15: Aplicação manual de pintura em paredes, duas demãos, incluindo aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. (Item 8.1 e 8.2)



Foto 16: Aplicação manual de tinta látex acrílica em paredes externas. (Item 8.3)

Carlos Pinheiro dos Santos Gouveia
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat.: 49.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Roney Marcos Lourenço Moreira
Eng. Civil
CREA-PE 034385-D-PE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS
E LOCAÇÕES EIRELI-EPP
CNPJ - 22.594.155/0001-36

Eduardo Melo de A. Lima
Engenheiro Civil
CREA 1813907542/PE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

Relatório Fotográfico

OBJETO DO CONTRATO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUNCO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.	DATA EMISSÃO: DE	08/05/2023
LOCAL:	PAUDALHO/PE	Nº MEDIÇÃO: DA	9º DO CONTRATO
EMPRESA:	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI – EPP CNPJ: 22.594.155/0001-36	Nº CONTRATO:	047/2021



Foto 17: Aplicação manual de tinta látex acrílica em paredes externas. (Item 8.3)



Foto 18: Aplicação manual de tinta látex acrílica em paredes externas. (Item 8.3)



Foto 19: Aplicação manual de tinta látex acrílica em paredes externas. (Item 8.3)



Foto 20: Pintura a óleo, 2 demãos. (Item 8.4)

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vitor de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
CREA-PE 034385-D-PE

Roney Marcos Lourenço Moreira
Eng. Civil
CREA-PE 034385-D-PE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS
E LOCAÇÕES EIRELI-EPP
CNPJ - 22.594.155/0001-36

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat: 43.277

Eduardo Melo de A. Lima
Engenheiro Civil
CREA 1513907542/PE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

Relatório Fotográfico			
OBJETO DO CONTRATO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUNCO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.	DATA EMISSÃO: DE	08/05/2023
LOCAL:	PAUDALHO/PE	Nº MEDIÇÃO: DA	9º DO CONTRATO
EMPRESA:	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI – EPP CNPJ: 22.594.155/0001-36	Nº CONTRATO:	047/2021



Foto 21: Pintura a óleo, 2 demãos. (Item 8.4)



Foto 22: Aplicação manual de pintura com tinta texturizada em paredes externas. (Item 8.5)



Foto 23: Aplicação manual de pintura com tinta texturizada em paredes externas. (Item 8.5)



Foto 24: Aplicação manual de pintura com tinta texturizada em paredes externas. (Item 8.5)

Carlos Pinheiro Carlos Gouveia
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat.: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Roney Marcos Lourenço Moreira
Eng. Civil
CREA-PE 034385-D-PE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS
E LOCAÇÕES EIRELI-EPP
CNPJ - 22.594.155/0001-36

Eduardo Melo de A. Lima
Engenheiro Civil
CREA 1618997542 / PE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

Relatório Fotográfico

OBJETO DO CONTRATO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUNCO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.	DATA EMISSÃO: DE	08/05/2023
LOCAL:	PAUDALHO/PE	Nº DA MEDIÇÃO:	9º DO CONTRATO
EMPRESA:	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI – EPP CNPJ: 22.594.155/0001-36	Nº CONTRATO:	047/2021



Foto 25: Aplicação manual de pintura com tinta texturizada em paredes externas. (Item 8.5)



Foto 26: Aplicação manual de pintura com tinta texturizada em paredes externas. (Item 8.5)



Foto 27: Barra de apoio em aço inox. (Item 9.6)



Foto 28: Barra de apoio em aço inox. (Item 9.6)

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Carlos Pinheiro Castro de Gouveia
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat.: 48.911

Roney Marcos Lourenço Moreira
Eng. Civil
CREA-PE 034385-D-PE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS
E LOCAÇÕES EIRELI-EPP
CNPJ - 22.594.155/0001-36

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

Relatório Fotográfico

OBJETO DO CONTRATO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUNCO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.	DATA EMISSÃO: DE	08/05/2023
LOCAL:	PAUDALHO/PE	Nº MEDIÇÃO: DA	9º DO CONTRATO
EMPRESA:	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI – EPP CNPJ: 22.594.155/0001-36	Nº CONTRATO:	047/2021



Foto 29: Ponto de luz em teto, incluindo luminária tipo calha, de sobrepor, de LED 36 W. (Itens 10.1 e 10.5)



Foto 30: Ponto de interruptor de 1 seção. (Item 10.3)

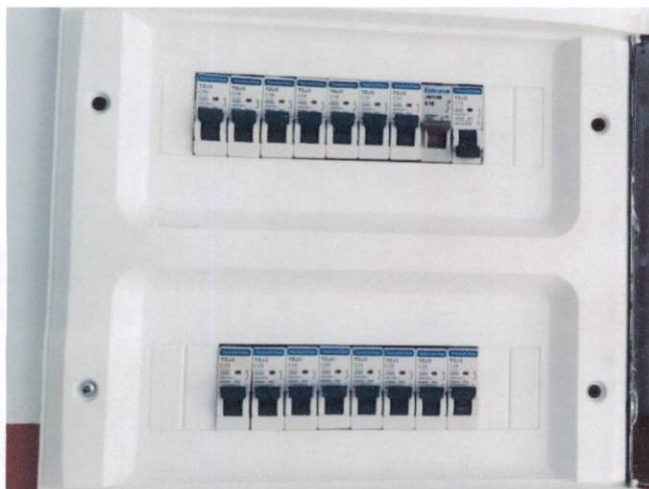


Foto 31: Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16 A e de 25 A. (Itens 10.9 e 10.11)



Foto 32: Colchão de areia. (Item 11.1)

Carlos Pinheiro Carlos Gouveia
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat.: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Roney Marcos Lourenço Moreira
Eng. Civil
CREA-PE 034385-D-PE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS
E LOCAÇÕES EIRELI-EPP
CNPJ - 22.594.155/0001-36

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

Relatório Fotográfico

OBJETO DO CONTRATO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUNCO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.	DATA EMISSÃO: DE	08/05/2023
LOCAL:	PAUDALHO/PE	Nº DA MEDIÇÃO:	9º DO CONTRATO
EMPRESA:	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI – EPP CNPJ: 22.594.155/0001-36	Nº CONTRATO:	047/2021



Foto 33: Fornecimento e assentamento de banco modelo Recife Antigo. (Item 11.11)



Foto 34: Fornecimento e assentamento de banco modelo Recife Antigo. (Item 11.11)

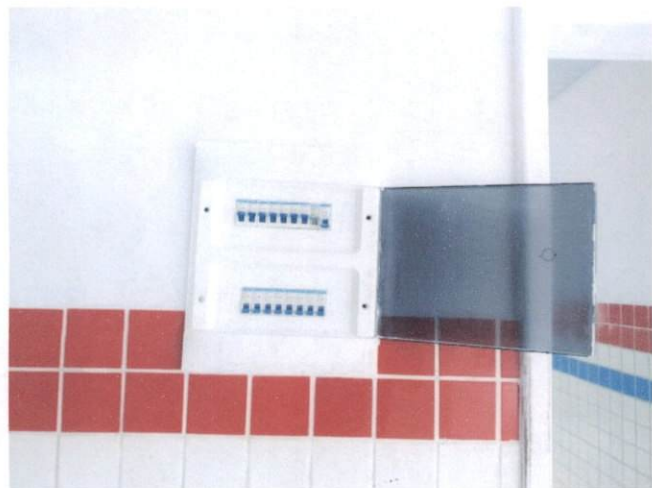


Foto 35: Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, para 24 disjuntores DIN; incluindo disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 50 A. (Itens 12.2.1 e 12.2.2)



Foto 36: Tubulação para dreno do ar-condicionado. (Item 12.2.3)

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Carlos F. Campos C. de Mendonça Filho
Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
Rua: 425/11

Roney Marcos Lourenço Moreira
Eng. Civil
CREA-PE 034385-D-PE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS
E LOCAÇÕES EIRELI-EPP
CNPJ - 22.594.155/0001-36

Eduardo Mello de A. Lima
Eng. Civil
CREA-PE 034385-D-PE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

Relatório Fotográfico

OBJETO DO CONTRATO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUNCO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.	DATA EMISSÃO: DE	08/05/2023
LOCAL:	PAUDALHO/PE	Nº MEDIÇÃO: DA	9º DO CONTRATO
EMPRESA:	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI – EPP CNPJ: 22.594.155/0001-36	Nº CONTRATO:	047/2021



Foto 37: Lavatório louça branca suspenso. (Item 12.2.5)



Foto 38: Pintura verniz em madeira, uso interno e externo. (Item 12.2.6)

Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 48.498

Carlos Pinheiro Campos da Veia
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat.: 48.911

Roney Marcos Lourenço Moreira
Eng. Civil
CREA-PE 034385-D-PE

Eduardo Melo de A. Lima
Engenheiro Civil
CREA 1818907542/PE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS
E LOCAÇÕES EIRELI-EPP
CNPJ - 22.594.155/0001-36

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE.		DATA:	05/02/23 a 10/03/23		
OBRA:	EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUNCO	TEMPO	SOL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
Horário de Trabalho:		7H-12H/13H-17H			
Prazo Total da Obra		180 + 180 + 180+ 180+180			
		Manhã			
		Tarde			
		Noite			

	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Pessoa	ENGENHEIRO	1	ARMADOR	
	MESTRE / ENCARREGADO		ENCANADOR	
	PEDREIRO		PINTOR	
	SERVENTE		ELETRICISTA	
	CARPINTEIRO		OUTROS	

Serviços Executados / Ocorrências	ESTAMOS PARALIZANDO A OBRA PM QUE SEJA CONCLUÍDO O REPLANILHAMENTO FINAL DO OBRA.	

Anotação da Fiscalização	

Visto Fiscalização: *[assinatura]*
 Prefeitura Municipal de Paudalho-PE
 Posto Municipal de Engenharia Civil
 Engenheiro Civil
 Matr. 41.498

Visto Contratada: *[assinatura]*
 Glidden Empreendimentos e Locações Eireli-EPT
 CNPJ: 22.594.051/0001-32
 Roney Marcos Lourenço Martins
 ENG. CIVIL
 CREA-PE 034385-D-PE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI		DIARIO DE OBRAS		
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE.		DATA:	11/03/2023	
OBRA:	EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUNCO	TEMPO	SOL	CHUVA FRACA
		Manhã		
Horário de Trabalho:	7H-12H/13H-17H	Tarde		
Prazo Total da Obra	180 + 180 + 180+ 180+180	Noite		

	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Pessoal	ENGENHEIRO		ARMADOR	
	MESTRE / ENCARREGADO		ENCANADOR	
	PEDREIRO		PINTOR	
	SERVENTE		ELETRICISTA	
	CARPINTEIRO		OUTROS	

Serviços Executados / Ocorrências	

Anotação da Fiscalização	

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS
E LOCAÇÕES EIRELI - PE
CNPJ - 20.094.155/0001-30

Visto Fiscalização:

 Paulo Valente de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 014385-D-PE

Visto Contratada:

 Roney Marcos Lourenço Moreira
 Eng. CIVIL
 CREA-PE 014385-D-PE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	DIARIO DE OBRAS
--------------------------------------------------	------------------------


ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE.	DATA: 12/03/2023
-----------------------------------------------	------------------

OBRA:	EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUNCO	TEMPO	SOL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
		Manhã			
Horário de Trabalho:		7H-12H/13H-17H		Tarde	
Prazo Total da Obra		180 + 180 + 180 + 180 + 180		Noite	

	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Pessoal	ENGENHEIRO		ARMADOR	
	MESTRE / ENCARREGADO		ENCANADOR	
	PEDREIRO		PINTOR	
	SERVENTE		ELETRICISTA	
	CARPINTEIRO		OUTROS	

Serviços Executados / Ocorrências	8-LOGA

Anotação da Fiscalização	

Visto Fiscalização: Paulo Vanderleide de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mar. 14. 2023	Visto Contratada:  Roney Marcos Lourenço Moraes Eng. Civil GRBA-PE 034288-D-PE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP
 CNPJ: 17.694.153/0001-39

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE.		DATA:	13/03/2023		
OBRA:	EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUNCO	TEMPO	SOL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
		Manhã	X		
Horário de Trabalho:	7H-12H/13H-17H	Tarde	X		
Prazo Total da Obra	180 + 180 + 180+ 180+180	Noite			

Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	ENGENHEIRO	1	ARMADOR	
MESTRE / ENCARREGADO	1	ENCANADOR		
PEDREIRO	4	PINTOR		
SERVENTE	4	ELETRICISTA		
CARPINTEIRO		OUTROS	4	

Serviços Executados / Ocorrências	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS BANCOS RECIFE ANTIGO

Anotação da Fiscalização	

Visto Fiscalização: 
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 10.000

Visto Contratada: 
 Roney Marcos Lourenço Moreira
 Eng. CIVIL
 CREA-PE 034195-0-PE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - PE
 CNPJ: 22.511.550/0001-00

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI		DIARIO DE OBRAS		
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE.		DATA:	14/03/2023	
OBRA:	EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUNCO	TEMPO	SOL	CHUVA FRACA
		Manhã	✓	
Horário de Trabalho:	7H-12H/13H-17H	Tarde	✓	
Prazo Total da Obra	180 + 180 + 180 + 180 + 180	Noite		

Pessoa	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
		ENGENHEIRO	1	ARMADOR
	MESTRE / ENCARREGADO	1	ENCANADOR	
	PEDREIRO	4	PINTOR	
	SERVENTE	4	ELETRICISTA	
	CARPINTEIRO		OUTROS	1


Serviços Executados / Ocorrências

SERVIÇOS DO MESTRE DA OBRA E DA CALHA DA ESCOLA.

Anotação da Fiscalização

Visto Fiscalização: *[assinatura]*
 Eng. Civil
 14/03/2023

Visto Contratada: *[assinatura]*
 Roney Marcos Lourenço Moreira
 Eng. CIVIL
 CREA-PE 034395-D-PE



GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	DIARIO DE OBRAS
--------------------------------------------------	------------------------

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE.	DATA: 15/03/2023
-----------------------------------------------	------------------


OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUNCO	TEMPO	SOL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
	Manhã	✓		
Horário de Trabalho: 7H-12H/13H-17H	Tarde	✓		
Prazo Total da Obra 180 + 180 + 180+ 180+180	Noite			


Passoa	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	ENGENHEIRO	1	ARMADOR	
	MESTRE / ENCARREGADO	1	ENCANADOR	
	PEDREIRO	4	PINTOR	
	SERVEnte	4	ELETRICISTA	
	CARPINTEIRO		OUTROS	4


Serviços Executados / Ocorrências

Anotação da Fiscalização

SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE CERAMICA 45 X 45 NO PISO DO ANEXO.

Visto Fiscalização:  Manoel de Almeida Filho
Eng. Civil
CREA PE 034381-D-PE

Visto Contratada:  Ronny Marcos Lourenço Moreira
Eng. CIVIL
CREA PE 034381-D-PE





GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE.			DATA:	16/03/2023		
OBRA:	EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUNCO		TEMPO	SOL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
			Manhã	✓		
Horário de Trabalho:	7H-12H/13H-17H		Tarde	✓		
Prazo Total da Obra	180 + 180 + 180+ 180+180		Noite			

	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Pessoal	ENGENHEIRO	1	ARMADOR	
	MESTRE / ENCARREGADO	4	ENCANADOR	
	PEDREIRO	4	PINTOR	
	SERVENTE	11	ELETRICISTA	
	CARPINTEIRO		OUTROS	4

Serviços Executados / Ocorrências	SERVIÇOS DE SOLICITAÇÃO DE GRANITO.	

Anotação da Fiscalização	

Visto Fiscalização:  Maria Madalena de Mendonça Filha
Engenheira Civil
C.R.C.A. PE 034385-D-PE

Visto Contratada:  Ronney Marcos Laureano Moreira
Eng. CIVIL
C.R.C.A. PE 034385-D-PE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE.			DATA:	27/03/2023		
OBRA:	EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUNCO		TEMPO	SOL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
Horário de Trabalho:			Manhã	✓		
Prazo Total da Obra			Tarde	✓		
			Noite			
7H-12H/13H-17H						
180 + 180 + 180 + 180 + 180						

	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Pessoal	ENGENHEIRO	1	ARMADOR	
	MESTRE / ENCARREGADO	4	ENCANADOR	
	PEDREIRO	4	PINTOR	
	SERVENTE	4	ELETRICISTA	
	CARPINTEIRO		OUTROS	4

Serviços Executados / Cronômetro

SERVIÇOS DE PINTURAS EXCEDENTE DO PM OR.


Anotação da Fiscalização

Visto Fiscalização:

Paulo Wanderley de Albuquerque Filho
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 034385-D-PE

Visto Contratada:

Roney Marcos Lourenço Moreira
 Eng. CIVIL
 CREA-PE 034385-D-PE



GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE.		DATA:	18/03/23 a 19/03/23		
OBRA:	EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUNCO	TEMPO	SOL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
Horário de Trabalho:		7H-12H/13H-17H	Manhã		
Prazo Total da Obra		180 + 180 + 180 + 180 + 180	Tarde		
			Noite		

	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Pessoal	ENGENHEIRO		ARMADOR	
	MESTRE / ENCARREGADO		ENCANADOR	
	PEDREIRO		PINTOR	
	SERVENTE		ELETRICISTA	
	CARPINTEIRO		OUTROS	

FOLGA

Serviços Executados / Ocorrências

Anotação da Fiscalização

Visto Fiscalização:

Visto Contratada:


 Roney Marcos Lourenço Moreira
 Eng. CIVIL
 CREA-PE 034385-D-PE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS
 E LOCAÇÕES EIRELI-PE
 CNPJ - 22.744.551/0001-50

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI		DIARIO DE OBRAS		
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE.		DATA:	20/03/2023	
OBRA:	EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUNCO	TEMPO	SOL	CHUVA FRACA CHUVA FORTE
		Manhã		
Horário de Trabalho:	7H-12H/13H-17H	Tarde		
Prazo Total da Obra	180 + 180 + 180+180+180	Noite		

	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Pessoal	ENGENHEIRO	1	ARMADOR	
	MESTRE / ENCARREGADO	4	ENCANADOR	
	PEDREIRO	4	PINTOR	
	SERVENTE	4	ELETRICISTA	
	CARPINTEIRO		OUTROS	4

Serviços Executados / Ocorrências

Serviços no Bu Anterior do Barco DE APOIO.

Anotação da Fiscalização

Visto Fiscalização:

Paulo Vanderson de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat. 11190

Visto Contratada:

Roney Marcos Lourenço Moreira
Eng. CIVIL
CRBA-PE 034385-D-PE



GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE.		DATA:	21/03/2023		
OBRA:	EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUNCO	TEMPO	SOL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
Horário de Trabalho:		7H-12H/13H-17H	Manhã	✓	
Prazo Total da Obra		180 + 180 + 180 + 180 + 180	Tarde	✓	
			Noite		

Pessoa	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
		ENGENHEIRO		ARMADOR
	MESTRE / ENCARREGADO	1	ENCANADOR	
	PEDREIRO	4	PINTOR	
	SERVENTE	4	ELETRICISTA	
	CARPINTEIRO	4	OUTROS	4

Serviços Executados / Ocorrências	Descrição	Quant.
		SERVICOS DE FLETBRICA DISTINTOR, QUADRO DE DISTRIBUICAO E ALIACAO DOS DE - CONDIIONADOS.

Anotação da Fiscalização	Descrição

Visto Fiscalização:
 Paulo Vanderlei da Silva Filho
 Engenheiro
 Mar.: 11

Visto Contratada:
 Robey Marcus Lourenço Moreira
 Eng. Civil
 CREA-PE 034385-D-PE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE.		DATA:	22/03/2023		
OBRA:	EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUNCO	TEMPO	SOL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
Horário de Trabalho:		7H-12H/13H-17H	Manhã	✓	
Prazo Total da Obra		180 + 180 + 180 + 180 + 180	Tarde	✓	
			Noite		

	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Pessoal	ENGENHEIRO		ARMADOR	
	MESTRE / ENCARREGADO	1	ENCANADOR	
	PEDREIRO	4	PINTOR	
	SERVEnte	4	ELETRICISTA	
	CARPINTEIRO	4	OUTROS	4

Serviços Executados / Ocorrências

Serviços de Pintura Geral que foi executado excedente ao em anterior

Anotação da Fiscalização

Visto Fiscalização:

Paulo Varuerie de Aguiar Filho
Engenheiro
Adm. 11

Visto Contratada:

Roney Marcos Luciano Moreira
Eng. Civil
CREA PE 034385-D-PE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - L.P. CNPJ: 16.128.700/01-30

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI **DIARIO DE OBRAS**

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE. DATA: 23/03/2023

OBRA:	EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUNCO	TEMPO	SOL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
		Manhã	4		
Horário de Trabalho:	7H-12H/13H-17H	Tarde	2		
Prazo Total da Obra	180 + 180 + 180 + 180 + 180	Noite			

	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Pessoal	ENGENHEIRO		ARMADOR	
	MESTRE / ENCARREGADO		ENCANADOR	
	PEDREIRO		PINTOR	4
	SERVENTE		ELETRICISTA	
	CARPINTEIRO		OUTROS	

Serviços do dia anterior

Anotação da Fiscalização

Visto Fiscalização:

Paulo Vander ...
 Eng. Civil
 QREA-PE 034385-D-PE

Visto Contratada:

Roney Marcos Laureano Moreira
 Eng. Civil
 QREA-PE 034385-D-PE



GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI

DIARIO DE OBRAS

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE.

DATA: 24/03/2023

OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUNCO	TEMPO	SOL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
	Manhã	X		
	Tarde	X		
	Noite			
Horário de Trabalho:	7H-12H/13H-17H			
Prazo Total da Obra	180 + 180 + 180 + 180 + 180			


	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Pessoal	ENGENHEIRO		ARMADOR	
	MESTRE / ENCARREGADO		ENCANADOR	
	PEDREIRO		PINTOR	1
	SERVENTE		ELETRICISTA	
	CARPINTEIRO		OUTROS	

Serviços Executados / Ocorrências	SERVIÇOS DO DIA ANTERIOR A FUTURAS.	

Anotação da Fiscalização	

Visto Fiscalização:
 Paulo Vasques de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 M. P. S.

Visto Contratada:
 Roney Marcos Lourenço Moreira
 Eng. Civil
 CREA-PE 034385-D-PE



GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE.		DATA:	25/03/23 a 26/03/23		
OBRA:	EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUNCO	TEMPO	SOL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
		Manhã			
Horário de Trabalho:	7H-12H/13H-17H	Tarde			
Prazo Total da Obra	180 + 180 + 180+ 180+180	Noite			


	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Pessoal	ENGENHEIRO		ARMADOR	
	MESTRE / ENCARREGADO		ENCANADOR	
	PEDREIRO		PINTOR	
	SERVENTE		ELETRICISTA	
	CARPINTEIRO		OUTROS	

FOLGA

Serviços Executados / Ocorrências

Anotação da Fiscalização

Visto Fiscalização:  Paulo Vanderlei de Souza Filho Engenheiro Matr. 41.15	Visto Contratada:  Roney Marcos Loureiro Moreira Eng. Civil CREA-PE 034385-D-PE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE.		DATA:	27/03/23 a 28/03/23		
OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUNCO	TEMPO	SOL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE	
	Manhã	✓			
Horário de Trabalho:	7H-12H/13H-17H	Tarde	✓		
Prazo Total da Obra	180 + 180 + 180 + 180 + 180	Noite			

Pessoa	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
		ENGENHEIRO	1	ARMADOR
	MESTRE / ENCARREGADO	1	ENCANADOR	
	PEDREIRO		PINTOR	
	SERVENTE		ELETRICISTA	
	CARPINTEIRO		OUTROS	1

Serviços Executados / Ocorrências

Conclusão da obra

Anotação da Fiscalização

Visto Fiscalização:
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 12.594.155/001-40

Visto Contratada:
 Ronney Marcos Lourenço Moreira
 Eng. CIVIL
 CREA-PE 034385-D-PE

