

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

C. I N° 0120/2024

Da: Secretaria de Desen. Urbano e Meio ambiente.

Para: Secretaria de Municipal de Saúde

Venho através desta, encaminhar documentos descritos na tabela abaixo, para **análise e conhecimentos**, conforme documentos em anexo.

Descrição	Dados da Empresa	Documentos em anexo
BM N° 11° do contrato 044/2022 referente a Construção da Cozinha do Hospital Municipal , deste município.	NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA CNPJ: 04.290.148/0001-69; Dados Bancário Ag. 0773, C.C 99768-9, Banco Itaú	<ul style="list-style-type: none">• NF N° 084;• Ordem de• Fornecimento.

Atenciosamente,

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Matrícula - 48.911

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.
Matricula - 48.911



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00000084

Data e Hora de Emissão

29/02/2024 15:00:22

Código de Verificação

ZYQN-6UZP

20240229-04290148000169

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 04.290.148/0001-69

Inscrição Municipal: 804.262-4

Nome/Razão Social: NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Endereço: RUA JACO VELOSINO 290, SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSU - CASA FORTE - CEP: 52061-410

Município: Recife

UF PE

E-mail: JOAO@CONSTRUTORANE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO

CPF/CNPJ: 07.868.234/0001-02

Inscrição Municipal: ----

Endereço: SANTA TEREZA S/N - LOTEAMENTO SANTA TEREZA - CEP: 56826-000

Município: Paudalho

UF PE

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 11 DO PERIODO 20/12/2023 ATE 31/01/2024 DO CONTRATO 044/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE, PROCESSO LICITATORIO 029/2022 TOMADA DE PRECO N003/2022, CNO 90.013.33037/71.

MAO DE OBRA 40%

MATERIAL 60%

BANCO ITAU 341 AGÊNCIA 0773 CONTA CORRENTE 99768-9

ATESTO 29/02/24
 SERVIÇO FOI EXECUTADO
 MATERIAL FOI ENTREGUE

Prefeitura Municipal de Paudalho
Paulo Vangerlei de Aguiar
Engenheiro Civil
Mat: 41.996

Retenção de COFINS R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 0,00	Retenção de INSS R\$ 2.345,64	Retenção de IRPJ R\$ 799,65	Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
--------------------------------	------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------------------

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 53.310,00

Código da Atividade Prestada

4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanag...

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
31.986,00	0,00	21.324,00	5,00%	1.066,20	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. Local da prestação do serviço: Paudalho - PE.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- CEI / Código da Obra: 90.013.33037/71

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO		BM - número 11	BM - Data emissão 29/02/2024	BM - Período de referência da medição 20/12/2023 ATÉ 31/01/2024	Nº do CT 044/2022	Data do CT 31/10/2022
Valor contrato inicial (R\$) R\$ 940.533,80	Início da obra 07/11/2022	Término obra 02/11/2023	Empresa Contratada NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	CNPJ 04.290.148/0001-69	AG. PROMOTOR OU TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	
Acumulado Medido (Contrato) (R\$): R\$ 768.629,60	data assinatura 01/11/2022	Objeto do CTEF (resumido) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Valor - Boletim R\$ 53.310,00	
Saldo do (contrato) (R\$): R\$ 171.904,20	Medido no período (R\$): R\$ 53.310,00			Local de obra (Bairro / Município / UF) ALTO SANTA TEREZA, PAUDALHO/PE.		

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREVISTO NO ORÇAMENTO				EXECUTADO FISICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			ACUMULADO (%)
				UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES:				R\$ 24.748,92				R\$ 21.792,84	R\$ -	R\$ 21.792,84	88,06%
1.1	005	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO [Ref. Sinapi 04/2019 - 74209/001]	M2	2,30	R\$ 856,78	R\$ 1.510,59	2,30		2,30	R\$ 1.510,59	R\$ -	R\$ 1.510,59	100,0%
1.2	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	112,85	R\$ 64,80	R\$ 7.277,19	72,74		72,74	R\$ 4.699,00	R\$ -	R\$ 4.699,00	84,8%
1.3	99459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	117,00	R\$ 136,42	R\$ 15.961,14	114,23		114,23	R\$ 15.583,25	R\$ -	R\$ 15.583,25	97,8%
2			TRABALHOS EM TERRA:				R\$ 19.010,50				R\$ 18.983,80	R\$ 99,20	R\$ 19.083,00	100,4%
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	33,88	R\$ 93,59	R\$ 3.152,10	29,88	1,08	30,74	R\$ 3.152,10	R\$ 99,20	R\$ 3.251,30	103,1%
2.2	99895	SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	30,41	R\$ 56,75	R\$ 1.725,76	30,41	0,00	30,41	R\$ 1.725,76	R\$ -	R\$ 1.725,76	100,0%
2.3	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	190,85	R\$ 0,14	R\$ 26,89	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
2.4	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	122,81	R\$ 114,88	R\$ 14.105,95	122,81	0,00	122,81	R\$ 14.105,94	R\$ -	R\$ 14.105,94	100,0%
3			INFRAESTRUTURA:				R\$ 39.384,82				R\$ 35.107,47	R\$ 270,02	R\$ 35.377,49	90%
3.1	99536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	M2	151,61	R\$ 85,93	R\$ 13.027,85	138,09		138,09	R\$ 11.694,21	R\$ -	R\$ 11.694,21	90%
3.2	99546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	204,00	R\$ 19,93	R\$ 4.065,72	204,00		204,00	R\$ 4.065,72	R\$ -	R\$ 4.065,72	100%
3.3	99547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	263,00	R\$ 16,92	R\$ 4.449,96	258,42		258,42	R\$ 4.372,46	R\$ -	R\$ 4.372,46	98%
3.4	99548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	317,00	R\$ 16,10	R\$ 5.103,70	316,88		316,88	R\$ 5.103,37	R\$ -	R\$ 5.103,37	99,99%
3.5	00043061	SINAPI	ACO CA-80, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	104,00	R\$ 13,75	R\$ 1.430,00	104,00		104,00	R\$ 1.430,00	R\$ -	R\$ 1.430,00	100,00%
3.6	99557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2017	M3	10,17	R\$ 659,27	R\$ 6.704,78	9,48		9,48	R\$ 6.249,87	R\$ -	R\$ 6.249,87	93%
3.7	99558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	4,48	R\$ 667,81	R\$ 2.991,79	2,10	0,37	2,47	R\$ 1.402,40	R\$ 247,08	R\$ 1.649,48	55%
3.8	94982	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,51	R\$ 458,98	R\$ 1.611,02	1,72	0,05	1,77	R\$ 789,44	R\$ 22,94	R\$ 812,38	50%
4			ESTRUTURA:				R\$ 163.223,38				R\$ 141.958,34	R\$ 6.562,57	R\$ 148.510,91	91%
4.1	92289	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	127,88	R\$ 233,89	R\$ 29.837,54	125,50	0,00	125,50	R\$ 29.328,08	R\$ -	R\$ 29.328,08	98,29%
4.2	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E= 25 MM. AF_09/2020	M2	304,75	R\$ 183,78	R\$ 56.006,95	288,09	3,24	291,33	R\$ 52.945,15	R\$ 595,44	R\$ 53.540,59	96%
4.3	92780	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2016	KG	171,00	R\$ 20,37	R\$ 3.483,27	171,00	0,00	171,00	R\$ 3.483,27	R\$ -	R\$ 3.483,27	100%

Paulo Vandevlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat: 1.498

JOSE SERGIO BEZERRA
GOMES:00824239466

Assinado de forma digital por JOSE SERGIO BEZERRA GOMES:00824239466
Dados: 2024.02.29 14:52:03 -03'00'

Carlos Pinheiro dos Santos
Secretário de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Agrário
Mat: 48.911

Luiz Carlos Gonzaga
Engenheiro Civil
CREA-PE 181993558-2

4.4	92781	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	49,90	R\$	19,74	R\$	985,02	36,16	13,90	50,06	R\$	713,79	R\$	274,38	R\$	988,17	100%
4.5	92782	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.060,97	R\$	17,95	R\$	19.044,41	987,97	0,00	987,97	R\$	17.734,05	R\$	-	R\$	17.734,05	93,12%
4.6	92783	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	718,00	R\$	15,28	R\$	10.971,04	588,04	0,00	588,04	R\$	8.679,64	R\$	-	R\$	8.679,64	79%
4.7	00043061	SINAPI	AÇO CA-80, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	757,55	R\$	13,75	R\$	10.416,31	754,17	7,87	761,84	R\$	10.369,81	R\$	105,46	R\$	10.475,27	101%
4.8	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	9,17	R\$	636,53	R\$	5.836,97	9,17	0,00	9,17	R\$	5.836,96	R\$	-	R\$	5.836,96	100%
4.9	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	30,02	R\$	637,01	R\$	19.123,03	20,20	0,35	20,55	R\$	12.887,59	R\$	222,95	R\$	13.090,54	68,45%
4.10	102073	SINAPI	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÓRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	M3	1,72	R\$	4.371,42	R\$	7.518,84	0,00	1,22	1,22	R\$	-	R\$	5.354,34	R\$	5.354,34	71,21%
5			PAREDES E REVESTIMENTOS:					R\$	245.049,57				R\$	228.275,22	R\$	1.783,48	R\$	230.058,70	94%
5.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	697,45	R\$	94,98	R\$	66.243,80	632,29	8,81	641,10	R\$	60.054,87	R\$	836,77	R\$	60.891,64	92%
5.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M2	1.578,75	R\$	5,38	R\$	8.493,68	1.381,74	17,82	1.399,36	R\$	7.433,76	R\$	94,79	R\$	7.528,55	89%
5.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_09/2014	M2	1.578,75	R\$	48,35	R\$	76.332,96	1.381,74	17,82	1.399,36	R\$	66.807,10	R\$	851,92	R\$	67.659,02	89%
5.4	87283	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_08/2014	M2	537,21	R\$	174,94	R\$	93.979,53	537,21		537,21	R\$	93.979,49	R\$	-	R\$	93.979,49	100%
6			PISOS:					R\$	73.453,44				R\$	70.744,18	R\$	-	R\$	70.744,18	96,3%
6.1	89620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	M3	9,84	R\$	708,69	R\$	6.973,51	9,84	0,00	9,84	R\$	6.973,49	R\$	-	R\$	6.973,49	100%
6.2	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	314,43	R\$	36,49	R\$	11.473,56	309,70	0,00	309,70	R\$	11.300,95	R\$	-	R\$	11.300,95	98%
6.3	87283	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	314,43	R\$	174,94	R\$	55.008,38	299,93		299,93	R\$	52.469,74	R\$	-	R\$	52.469,74	95,39%
7			COBERTA / FORRO					R\$	89.604,66				R\$	78.262,92	R\$	5.389,51	R\$	83.652,43	93%
7.1	101983	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	8,25	R\$	217,85	R\$	1.797,28	8,24	0,00	8,24	R\$	1.795,08	R\$	-	R\$	1.795,08	100%
7.2	101984	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	165,89	R\$	203,62	R\$	33.778,52	161,04	4,85	165,89	R\$	32.790,96	R\$	987,55	R\$	33.778,51	100%
7.3	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	171,27	R\$	24,20	R\$	4.144,73	146,81	9,92	156,73	R\$	3.552,80	R\$	240,08	R\$	3.792,88	92%

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vandenberg de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 41.498

JOSE SERGIO BEZERRA
GOMES:00824239466

Assinado de forma digital por JOSE
 SERGIO BEZERRA
 GOMES:00824239466
 Dados: 2024.02.29 14:52:14 -03'00'

Carlos Pinheiro Campos Gouvêa
 Secretário Municipal de Desenvolvimento
 Matr. 48.911

Lucas Cândido Gonzaga
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 81193558-2

7.4	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	171,27	R\$ 68,08	R\$ 11.656,83	152,57	9,92	162,49	R\$ 10.363,91	R\$ 875,15	R\$ 11.059,06	95%
7.5	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	67,48	R\$ 70,74	R\$ 4.772,12	0,00	14,90	14,90	R\$ -	R\$ 1.054,02	R\$ 1.054,02	22%
7.6	11.15.020	EMLURB	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM 8CM DE ESPESSURA E 20CM DE LARGURA ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, TRACO 1:1:4 (SEE)	M	69,86	R\$ 19,07	R\$ 1.332,23	0,00	66,90	66,90	R\$ -	R\$ 1.275,78	R\$ 1.275,78	96%
7.7	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. AF_07/2019	M	20,48	R\$ 116,15	R\$ 2.378,75	20,48		20,48	R\$ 2.378,75	R\$ -	R\$ 2.378,75	100,00%
7.8	6	CPU	CALHA EM ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, IMPERMEABILIZADA, SEÇÃO 0,30 X 0,30M	M	47,86	R\$ 345,36	R\$ 16.528,63	40,96	3,35	44,31	R\$ 14.145,94	R\$ 1.156,95	R\$ 15.302,89	93%
7.9	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017 P	M2	314,43	R\$ 42,03	R\$ 13.215,49	314,43		314,43	R\$ 13.215,48	R\$ -	R\$ 13.215,48	100%
8			ESQUADRIAS:			R\$ 51.944,28					R\$ 14.733,24	R\$ 14.997,76	R\$ 29.731,00	57%
8.1	09.01.020	EMLURB	ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE E FOLHA EM MADEIRA DE LEI PARA PORTAS EXTERNAS INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS	M²	44,94	R\$ 620,87	R\$ 27.901,90	23,73	0,00	23,73	R\$ 14.733,24	R\$ -	R\$ 14.733,24	53%
8.2	102185	SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	2,00	R\$ 4.899,35	R\$ 9.798,70	0,00	2,00	2,00	R\$ -	R\$ 9.798,70	R\$ 9.798,70	100%
8.3	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	14,80	R\$ 356,10	R\$ 5.199,08	0,00	14,80	14,80	R\$ -	R\$ 5.199,06	R\$ 5.199,06	100%
8.4	102181	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 P	M2	15,32	R\$ 590,38	R\$ 9.044,82	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
9			PINTURA:			R\$ 49.654,56					R\$ 7.632,31	R\$ 16.958,28	R\$ 24.590,59	50%
9.1	96126	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	908,06	R\$ 19,30	R\$ 17.486,96	184,03	747,72	931,75	R\$ 3.551,77	R\$ 14.430,99	R\$ 17.982,76	103%
9.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_08/2014	M2	908,06	R\$ 3,38	R\$ 3.062,46	184,03	747,72	931,75	R\$ 622,02	R\$ 2.527,29	R\$ 3.149,31	102,84%
9.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M2	906,06	R\$ 17,88	R\$ 16.019,14	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
9.4	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	40,88	R\$ 17,21	R\$ 703,51	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
9.5	88484	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2014	M2	290,63	R\$ 22,74	R\$ 6.608,93	152,09	0,00	152,09	R\$ 3.458,52	R\$ -	R\$ 3.458,52	52%
9.6	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO. DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M2	290,63	R\$ 19,90	R\$ 5.785,54	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:			R\$ 37.842,14					R\$ 14.457,47	R\$ 1.218,65	R\$ 15.676,12	41%
10.1	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	8,00	R\$ 170,57	R\$ 1.364,56	8,00		8,00	R\$ 1.364,56	R\$ -	R\$ 1.364,56	100,00%
10.2	93145	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	5,00	R\$ 256,14	R\$ 1.280,70	4,00		4,00	R\$ 1.024,56	R\$ -	R\$ 1.024,56	80%
10.3	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	29,00	R\$ 233,19	R\$ 6.762,51	29,00		29,00	R\$ 6.762,51	R\$ -	R\$ 6.762,51	100%
10.4	93144	SINAPI	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	12,00	R\$ 281,90	R\$ 3.382,80	12,00		12,00	R\$ 3.382,80	R\$ -	R\$ 3.382,80	100%
10.5	011	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND	19,00	R\$ 240,38	R\$ 4.567,22	8,00		8,00	R\$ 1.923,04	R\$ -	R\$ 1.923,04	42%
10.6	00000010	SINAPI	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, DE LED 36 W - 8500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	34,00	R\$ 13,23	R\$ 449,82	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
10.7	00036085	SINAPI	LUMINÁRIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = 117 CM	UN	14,00	R\$ 27,10	R\$ 379,40	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderleone de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr.: 41.498

JOSE SERGIO BEZERRA
GOMES:00824239466

Assinado de forma digital por JOSE SERGIO BEZERRA GOMES:00824239466
 Dados: 2024.02.29 14:52:22 -03'00'

Carlos Pinheiro Gonçalves
 Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Agrário
 Matr.: 48.911

Lucas Cândido Gonzaga
 Engenheiro Civil
 CREA - PE 161993558-2

10.8	97589	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00	R\$ 36,89	R\$ 368,90	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.9	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 984,21	R\$ 1.968,42	0,00	1,00	1,00	R\$ -	R\$ 984,21	R\$ 984,21	50%
10.10	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 15,51	R\$ 62,04	0,00	2,00	2,00	R\$ -	R\$ 31,02	R\$ 31,02	50%
10.11	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	R\$ 16,16	R\$ 129,28	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
10.12	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	R\$ 17,53	R\$ 105,18	0,00	3,00	3,00	R\$ -	R\$ 52,59	R\$ 52,59	50%
10.13	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 17,53	R\$ 70,12	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
10.14	18.20.040	EMLURB	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 60 A 100A, 380V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Ud	3,00	R\$ 150,83	R\$ 452,49	0,00	1,00	1,00	R\$ -	R\$ 150,83	R\$ 150,83	33,33%
10.15	00039471	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	4,00	R\$ 142,42	R\$ 569,68	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
10.16	00039445	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO.	UN	8,00	R\$ 190,50	R\$ 1.524,00	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
10.17	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	4,00	R\$ 58,29	R\$ 233,16	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
10.18	00038084	SINAPI	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA UM EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	4,00	R\$ 20,64	R\$ 82,56	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
10.19	92084	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	80,00	R\$ 33,82	R\$ 1.681,00	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
10.20	92086	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	250,00	R\$ 45,57	R\$ 11.392,50	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
10.21	18.30.123	EMLURB	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFORADA, DIÂMETRO 50 X 50 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE DERIVAÇÃO E FIXAÇÃO.	m	28,00	R\$ 36,35	R\$ 1.017,80	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
11			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:			R\$ 69.658,86					R\$ 18.688,08	R\$ 6.040,53	R\$ 24.728,61	35%
11.1	89857	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	25,00	R\$ 182,78	R\$ 4.069,00	22,00		22,00	R\$ 3.580,72	R\$ -	R\$ 3.580,72	88,00%
11.2	88712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	120,00	R\$ 34,65	R\$ 4.158,00	8,35	10,77	19,12	R\$ 280,32	R\$ 373,18	R\$ 662,50	16%
11.3	88714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	75,00	R\$ 66,40	R\$ 4.980,00	42,15		42,15	R\$ 2.798,76	R\$ -	R\$ 2.798,76	56%
11.4	19.01.010	EMLURB	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITÁRIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	Pt	6,00	R\$ 113,44	R\$ 680,64	6,00		6,00	R\$ 680,64	R\$ -	R\$ 680,64	100%
11.5	19.01.030	EMLURB	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	Pt	6,00	R\$ 106,10	R\$ 636,60	6,00		6,00	R\$ 636,60	R\$ -	R\$ 636,60	100%
11.6	19.01.040	EMLURB	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR.	Pt	4,00	R\$ 101,86	R\$ 407,44	4,00		4,00	R\$ 407,44	R\$ -	R\$ 407,44	100,00%
11.7	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	6,00	R\$ 345,80	R\$ 2.074,80	5,00	1,00	6,00	R\$ 1.728,00	R\$ 345,80	R\$ 2.074,80	100%
11.8	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 79,58	R\$ 636,64	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
11.9	15.02.040	EMLURB	FORNECIMENTO DE BANCADA EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO.	M²	23,87	R\$ 361,02	R\$ 8.617,55	21,80		21,80	R\$ 7.870,23	R\$ -	R\$ 7.870,23	91%
11.10	88801	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 165,92	R\$ 1.327,36	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 41.198

JOSE SERGIO BEZERRA
 GOMES:00824239466

Assinado de forma digital por JOSE
 SERGIO BEZERRA
 GOMES:00824239466
 Dados: 2024.02.29 14:52:31 -03'00'

Carlos Ricardo Campos
 Secretário Municipal de Desenvolvimento
 Urbano e Agê. 10
 Matr. 18.911

Lucas Cândido Gonzaga
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 191993558-2

11.11	88935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	R\$ 324,99	R\$ 4.874,85	0,00	8,00	8,00	R\$ -	R\$ 2.599,92	R\$ 2.599,92	53%
11.12	88909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	R\$ 140,44	R\$ 1.404,40	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
11.13	88915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 154,70	R\$ 1.237,60	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.14	89052	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 44,47	R\$ 177,88	0,00	4,00	4,00	R\$ -	R\$ 177,88	R\$ 177,88	100,00%
11.15	91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	75,00	R\$ 51,45	R\$ 3.858,75	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
11.16	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	25,00	R\$ 51,10	R\$ 1.277,50	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.17	21.01.040	EMLURB	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA GRELHA DE PISO COM CALHA, TIPO GRADEADA (BARRAS CHATAS DE 7/8" x 1/8"), CONFECIONADA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI-304	Ud	19,00	R\$ 1.141,71	R\$ 21.692,49	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
11.18	98105	SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 128 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	10,00	R\$ 695,37	R\$ 6.953,70	1,00	3,00	4,00	R\$ 695,37	R\$ 2.086,11	R\$ 2.781,48	40%
11.19	100880	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 114,41	R\$ 457,64	0,00	4,00	4,00	R\$ -	R\$ 457,64	R\$ 457,64	100%
11.20	19.07.705	EMLURB	RALO SEMI-ESFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=100MM.	Ud	3,00	R\$ 45,34	R\$ 136,02	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
12			DIVERSOS:				R\$ 28.567,43				R\$ 16.302,49	R\$ -	R\$ 16.302,49	57%
12.1	102253	SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	20,42	R\$ 1.027,90	R\$ 20.989,72	15,86		15,86	R\$ 16.302,49	R\$ -	R\$ 16.302,49	78%
12.2	98837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	9,40	R\$ 736,98	R\$ 6.946,41	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
12.3	25.01.071	EMLURB	LIMPEZA GERAL DA OBRA (POR METRO QUADRADO DE CONSTRUÇÃO) (SEE).	m²	322,09	R\$ 1,96	R\$ 631,30	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
13			DIVERSOS:				R\$ 48.381,24				R\$ 48.381,24	R\$ -	R\$ 48.381,24	100%
13.1	1	COMP	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+4). AF_11/2020	M2	161,04	R\$ 300,43	R\$ 48.381,24	161,04	0,00	161,04	R\$ 48.381,24	R\$ -	R\$ 48.381,24	100%
TOTAL							R\$ 940.533,80				R\$ 715.319,60	R\$ 53.310,00	R\$ 768.629,60	81,7%

Carlos Pinheiro Gouvêa
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat: 46.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderleia Mendonça Filho

Secretário de Desenvolvimento Urbano e Agrário
Nome:
Cargo:

Resp. Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço
Nome:
Cargo:
CREA:

JOSE SERGIO BEZERRA GOMES:00824239466
Assinado de forma digital por JOSE SERGIO BEZERRA GOMES:00824239466
Dados: 2024.02.29 14:52:39 -03'00'

Engenheiro Responsável da Empresa
Nome:
Cargo:
CREA:

Representante Legal da Empresa
Nome:
Cargo:

Lucas Cândido Gonzaga
Engenheiro Civil
CREA-PE 181993558-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

MEMÓRIA DE CÁLCULO 11ºBM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.

LOCALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE

CONTRATO: 044/2022

EMPRESA: NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

ITEM	FORTE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	UND	COMPR	LARG.	ALTURA	QUANT	TAXA	TOTAL
2			TRABALHOS EM TERRA:							
2.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3				TOTAL	=	1,06
			ESCADA							
			Sapata Corrida		1,00	1,25	0,85			1,06
2.2	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3				TOTAL	=	0,00
			ESCAVAÇÃO							
			Sapata Corrida		1,00	1,25	0,85			1,06
			Desconto Estrutura		1,00	0,50	0,25	-1,00		-0,12
					0,30	0,20	0,85	-1,00		-0,05
			ADITIVO						-0,71	-0,71
3			INFRAESTRUTURA:							
3.7	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3						0,37
			ESCADA							
			Sapata Corrida		1,00	1,00	0,25			0,25
					1,00	0,20	0,60			0,12
3.8	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3				TOTAL	=	0,05
			ESCADA							
			Sapata Corrida		1,05	1,00	0,05			0,05
4			ESTRUTURA:							
4.2	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020					TOTAL	=	3,24
			ESCADA							
			SAPATA CORRIDA		1,00		0,25	4,00		1,00
			PESCOÇO DA SAPATA CORRIDA		0,20		0,60	2,00		0,24
					0,30		0,60	2,00		0,36
			VIGA SUPERIOR		0,15		1,00	1,00		0,15
					0,35		1,00	1,00		0,35
					0,50		1,00	2,00		1,00
			LAJE		8,81		1,00	1,00		8,81
			LATERAL		3,80		0,35	1,00		1,33
			LATERAL		3,30		0,35	1,00		1,15
			LATERAL		0,66		0,20	1,00		0,13
			LATERAL		1,05		0,20	1,00		0,21
			ESPELHOS		1,00		0,20	20,00		4,00
			MEDIR PELO ITEM 4.10 -3442,19						-18,73	-18,73
			CINTA DA PLATIBANDA		8,10	0,40				3,24
4.4	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG/M	0,395			TOTAL	=	13,90
			MASSA ESPECÍFICA = 0,395KG/M							

~~Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat. 433498~~

Carlos Augusto Campos Gouvêa
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
Página 1 de 5
Mar: 18/21

JOSE SERGIO BEZERRA
GOMES:00824239466

Assinado de forma digital por
JOSE SERGIO BEZERRA
GOMES:00824239466
Data: 2024.02.20 15:09:25 -03'00'

Engenheiro Civil
CREA-PE 181993558-2

			VIGA CAIXA D'ÁGUA		8,80			4,00		13,90
4.5	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG				TOTAL	=	0,00
			MASSA ESPECÍFICA = 0,609KG/M							
			ESCADA							
			SAPATA CORRIDA		1,35			8,00	0,617	6,66
			LAJE		1,07			47,00	0,617	31,02
			MEDIR PELO ITEM 4.10 - R\$ 676,36						-37,68	-37,68
4.7	SINAPI	00043061	ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	0,154			TOTAL	=	7,67
			MASSA ESPECÍFICA = 0,154KG/M							
			VIGA DA CAIXA DE AGUA		0,50			44,00		3,38
			ESCADA							
			SAPATA CORRIDA		1,35			2,00	0,154	0,41
					0,62			11,00	0,154	1,05
					1,02			11,00	0,154	1,72
					0,66			11,00	0,154	1,11
4.9	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022					TOTAL	=	0,35
			ESCADA GERAL							
			Patamares e Espelho e laje		1,94		1,00			1,94
			MEDIR PELO ITEM 4.10 - R\$ 1.235,8						-1,94	-1,94
			CINTA PLATIBANDA CAIXA D'ÁGUA		8,80	0,20	0,20			0,35
4.10	SINAPI	102073	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020					TOTAL	=	1,22
			MEDIDO PELOS ITENS 4.9, 4.2 E 4.5					1,22		1,22
5			PAREDES E REVESTIMENTOS:							
5.1	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2				TOTAL	=	8,81
			PLATIBANDA CAIXA D'ÁGUA							0,00
			PERÍMETRO		2,20		1,00	4,00		8,81
5.2	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014					TOTAL	=	17,62
			PLATIBANDA CAIXA D'ÁGUA							0,00
			PERÍMETRO		2,20		1,00	8,00		17,62
5.3	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014					TOTAL	=	17,62
			PLATIBANDA CAIXA D'ÁGUA							0,00
			PERÍMETRO		2,20		1,00	8,00		17,62
7			COBERTA / FORRO							
7.2	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020					TOTAL	=	4,85
			LAJE CAIXA D'ÁGUA		2,20	2,20				4,85

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr.: 14.988

Carlos Pinheiro Campos Goulão
 Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura
 Matr.: 18.911

JOSE SERGIO BEZERRA
 GOMES:00824239466

Assinado de forma digital por JOSE SERGIO BEZERRA
 GOMES:00824239466
 Dados: 2024.02.29 14:49:34 -03'00'

Lucas Cavalcanti Gonzaga
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 02/99558-2

7.3	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019				TOTAL	=	9,92
			COBERTA TÉRREO POR CIMA DA RECEPÇÃO						
					3,10	3,20			9,92
7.4	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019				TOTAL	=	9,92
			COBERTA TÉRREO POR CIMA DA RECEPÇÃO						
					3,10	3,20			9,92
7.5	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019				TOTAL	=	14,90
			COBERTA SUPERIOR LADO MENOR						
					7,45		2,00		14,90
7.6	11.15.0 20	EMLURB	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM 5CM DE ESPESSURA E 20CM DE LARGURA ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:1:4 (SEE).				TOTAL	=	66,90
			PLATIBANDA 1º PAVIMENTO						
			LADO MENOR		7,55		2,00		15,10
			LADO MAIOR		20,80		2,00		41,60
			PLATIBANDA TÉRREO						
			LADO MENOR		3,30		2,00		6,60
			LADO MENOR		3,60		1,00		3,60
7.8	6	CPU	CALHA EM ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, IMPERMEABILIZADA, SEÇÃO 0,30 X 0,30M.				TOTAL	=	3,35
			PLATIBANDA TÉRREO		3,35		1,00		3,35
									0,00
8.0			ESQUADRIAS:						
8.2	SINAPI	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UND			TOTAL	=	2,00
			REFEITÓRIO				1,00		1,00
			SALA DE REUNIÕES				1,00		1,00
8.3	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2			TOTAL	=	14,60
			Recepção		0,50	0,50			0,25
			Vestiário Masculino e Feminino		0,50	0,50	2,00		0,50
			Circulação		1,50	0,50			0,75
			Gard Manger		1,50	0,50			0,75
			Preparo Sucos e Leite		1,50	0,50	2,00		1,50
			Higienização de Painéis		1,50	0,50			0,75
			Sala de Reuniões		1,50	1,00	4,00		6,00
			BWC Feminino e Masculino		1,50	0,50	2,00		1,50
			Sala de Descanso		1,50	1,00	2,00		3,00

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vandenberg Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr.: 496

Carlos Pinheiro
 Secretário Municipal de Planejamento
 Unidade e Apoio
 Matr.: 18911

JOSE SERGIO BEZERRA
 GOMES 00824239466

Assinado de forma digital por
 JOSE SERGIO BEZERRA
 GOMES 00824239466
 Data: 2023.02.29 14:49:03 -0100

Engenheiro Civil
 CREA - DE 1002559-2

			EXECUTADO EM CONTRATO							15,00
			EXCEDEU A PLANILHA							-0,40
			SALDO A PAGAR NESTE BM							14,60
9			PINTURA:							
9.1	96126	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2				TOTAL	=	747,72
			FACHADA TÉRREO							
					3,60	4,05		2,00		29,16
					20,78	4,05		2,00		168,31
					7,75	4,05		2,00		62,77
					24,18	4,05		2,00		195,85
					1,05	4,05				4,25
			DESCONTOS		0,60	0,50	-1,00	2,00		-0,60
					0,90	2,10	-2,00	2,00		-7,56
					0,50	0,50	-2,00	2,00		-1,00
					0,80	2,10	-2,00	2,00		-6,72
					1,50	0,50	-4,00	2,00		-6,00
					0,90	1,20	-2,00	2,00		-4,32
					2,00	2,10	-1,00	2,00		-8,40
					2,00	1,75	-1,00	2,00		-7,00
			FACHADA 1º andar							
					7,75	3,10		2,00		48,05
					20,78	3,10		2,00		128,83
					7,75	3,10		2,00		48,05
					20,78	3,10		2,00		128,83
			DESCONTOS		1,50	1,00	-6,00	2,00		-18,00
					1,50	0,50	-2,00	2,00		-3,00
					0,90	2,10	-1,00	2,00		-3,78
9.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2				TOTAL	=	747,72
			FACHADA TÉRREO							
					3,60	4,05		2,00		29,16
					20,78	4,05		2,00		168,31
					7,75	4,05		2,00		62,77
					24,18	4,05		2,00		195,85
					1,05	4,05				4,25
			DESCONTOS		0,60	0,50	-1,00	2,00		-0,60
					0,90	2,10	-2,00	2,00		-7,56
					0,50	0,50	-2,00	2,00		-1,00
					0,80	2,10	-2,00	2,00		-6,72
					1,50	0,50	-4,00	2,00		-6,00
					0,90	1,20	-2,00	2,00		-4,32
					2,00	2,10	-1,00	2,00		-8,40
					2,00	1,75	-1,00	2,00		-7,00
			FACHADA 1º andar							
					7,75	3,10		2,00		48,05
					20,78	3,10		2,00		128,83
					7,75	3,10		2,00		48,05
					20,78	3,10		2,00		128,83
			DESCONTOS		1,50	1,00	-6,00	2,00		-18,00
					1,50	0,50	-2,00	2,00		-3,00
					0,90	2,10	-1,00	2,00		-3,78
10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:							
10.9	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN				TOTAL	=	1,00
			QUADRO TÉRREO					1,00		1,00
10.10	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN				TOTAL	=	2,00

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 41.498

			QUADRO TÉRREO				2,00		2,00
10.12	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN			TOTAL	=	3,00
			QUADRO TÉRREO				3,00		3,00
10.14	18.20.0 40	EMLURB	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 60 A 100A, 380V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Ud			TOTAL	=	1,00
			QUADRO TÉRREO				1,00		1,00
11			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:						
11.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014				TOTAL	=	10,77
			Tubulação da grelhas da Cozinha		6,87				6,87
			Tubulação da grelhas da Cozinha		3,90				3,90
11.7	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016				TOTAL	=	1,00
			Térreo						
			Vestiário Femenino						1,00
11.11	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				TOTAL	=	8,00
			Preparo Sucos e Leite				2,00		2,00
			Área Preparo				2,00		2,00
			Higienizador Pratos/Copos Paciente				2,00		2,00
			Gard Manger				2,00		2,00
11.14	89352	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021				TOTAL	=	4,00
			WC'S GERAL				4,00		4,00
11.18	98105	SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020				TOTAL	=	3,00
			CAIXA LADO DA ÁREA DE PREPARO				3,00		3,00
11.19	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				TOTAL	=	4,00
			WC GERAL				4,00		4,00

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 5.436

JOSE SERGIO
 BEZERRA
 GOMES:00824239466

Assinado de forma digital
 por JOSE SERGIO BEZERRA
 GOMES:00824239466
 Dados: 2024.02.29 14:50:25
 -03'00'

Carlos Paulo Campos Goulart
 Secretário Municipal de Desenvolvimento
 Urbano e Agrário
 Matr. 38.911

Lucas Cândido Gonzaga
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181993558-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO
AMBIENTE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO
HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.

BOLETIM: 11

JOSE SERGIO BEZERRA
GOMES:00824239466

Assinado de forma digital por JOSE
SERGIO BEZERRA
GOMES:00824239466
Dados: 2024.02.29 14:37:40 -03'00'



ITEM: 2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
ITEM: 3.8 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021
Cozinha hospital



ITEM: 3.7 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA,
COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_11/2016
Cozinha hospital



ITEM: 4.2 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM. AF_09/2020
Cozinha hospital



ITEM: 4.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM,
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
Cozinha hospital

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat. 41.118

Carlos Roberto dos Santos
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente

Luís Carlos da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 13.000538-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO
AMBIENTE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO
HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.

BOLETIM: 11

JOSE SERGIO
BEZERRA

GOMES:00824239466

Assinado de forma digital por
JOSE SERGIO BEZERRA
GOMES:00824239466
Dados: 2024.02.29 14:45:20 -03'00'



ITEM: 4.10 ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO
IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA,
FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA. AF_11/2020
Cozinha hospital

ITEM: 5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

ITEM: 5.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO
MANUAL. AF_06/2014

ITEM: 5.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

ITEM: 7.2 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL,
BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020
Cozinha hospital

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Rogério Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.188

Carlos Pinheiro dos Santos Góes
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
C.R.C.: 18.911

Lucas Cândido de Souza
Engenheiro Civil
CREA-PE 187993558-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO
AMBIENTE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO
HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.

BOLETIM: 11



ITEM: 7.3 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

ITEM: 7.4 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Cozinha hospital



ITEM: 7.5 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
Cozinha hospital

**JOSE SERGIO
BEZERRA
GOMES:00824239466**

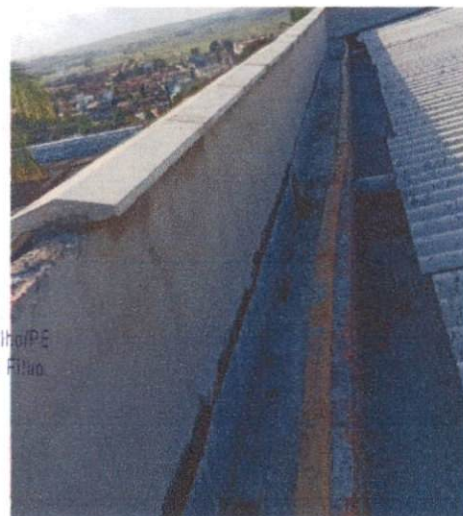
Assinado de forma digital por
JOSE SERGIO BEZERRA
GOMES:00824239466
Dados: 2024.02.29 14:45:30
-03'00'



Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Matr. 11.498

ITEM: 7.6 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM
5CM DE ESPESSURA E 20CM DE LARGURA
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA MISTA DE
CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR,
TRAÇO 1:1:4 (SEE).

Cozinha hospital



ITEM: 7.8 CALHA EM ALVENARIA, REVESTIDA
INTERNAMENTE, IMPERMEABILIZADA, SEÇÃO 0,30 X
0,30M.

Cozinha hospital
Carlos Pinheiro
Secretário de Desenvolvimento
Matr. 11.498

Lucas Carneiro
Engenheiro Civil
CREA - DE 40200000-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO
AMBIENTE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO
HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.

BOLETIM: 11



ITEM: 8.2 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA,
EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM,
ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.
AF_01/2021
Cozinha hospital



ITEM: 8.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
Cozinha hospital



Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Matr. 41.498

ITEM: 9.1 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA
EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO.
AF_05/2017
ITEM: 9.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO
EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
Cozinha hospital



ITEM: 10.9 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN
150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
ITEM: 10.10 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
ITEM: 10.12 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
ITEM: 10.14 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Cozinha hospital

JOSE SERGIO BEZERRA
GOMES:00824239466

Assinado de forma digital por JOSE
SERGIO BEZERRA
GOMES:00824239466
Dados: 2024.02.29 14:45:40 -03'00'

Carlos Pinheiro
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Agrário

Engenheiro Civil
CREA-PE 12.000.000-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO
AMBIENTE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO
HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.

BOLETIM: 11



ITEM: 11.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014
Cozinha hospital



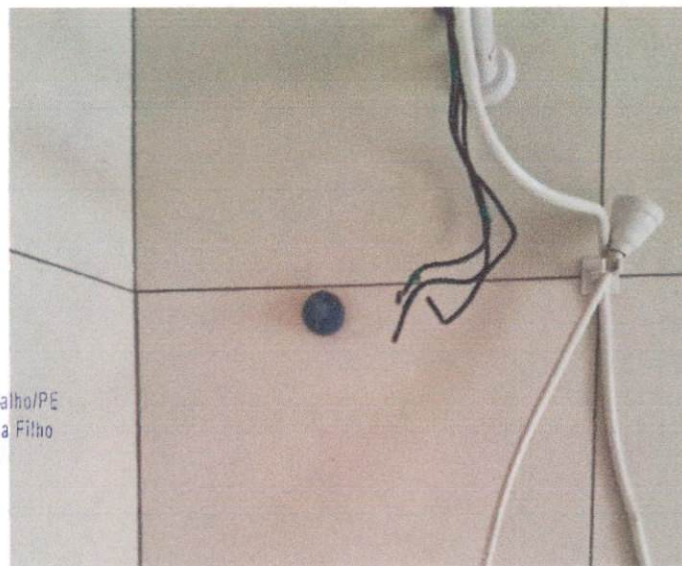
ITEM: 11.7 VASO SANITARIO SIFONADO
CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO
CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA
AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2016
Cozinha hospital



JOSE SERGIO BEZERRA
GOMES:00824239466

Assinado de forma digital por
JOSE SERGIO BEZERRA
GOMES:00824239466
Dados: 2024.02.29 14:45:50 -03'00'

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderiel de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat. 41.198



ITEM: 11.11 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL
MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM
METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Cozinha hospital

ITEM: 11.14 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO,
ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021
Cozinha hospital

Carlos Pinheiro dos Santos
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat. 18.911

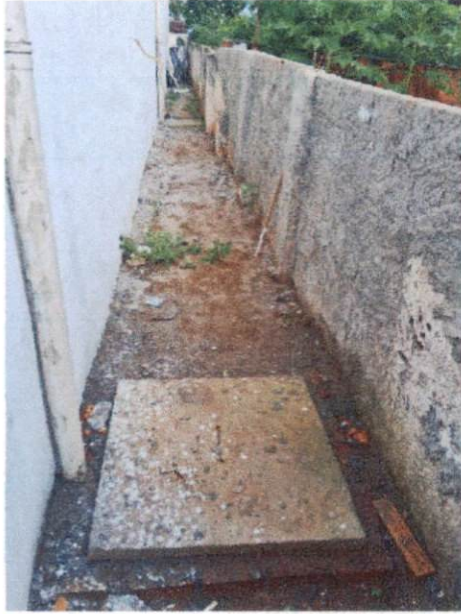
Lucas Cândido de Souza
Engenheiro Civil
CREA-PE 181993558-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.

BOLETIM: 11



ITEM: 11.18 CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020
Cozinha hospital

ITEM: 11.19 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Cozinha hospital


~~Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat. 41.498~~


**JOSE SERGIO
BEZERRA
GOMES:00824239466**


Assinado de forma digital por
JOSE SERGIO BEZERRA
GOMES:00824239466
Dados: 2024.02.29 14:45:58
-03'00'

Carlos T. de Aguiar Goutia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat. 42.911

Lucas Cândido Bezerra
Engenheiro Civil
CREA-PE 10193558-2

NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 20/12/2023			
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã	Bom		
INÍCIO			Tarde	Bom		
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Lixadeira		Furadeira			
	Betoneira					
	Maquita					
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro		01	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado		01	Encanador		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro		02	Pintor		
	Armador			Vidraceiro		
	Servente		04	Serralheiro		
Serviços Executados	Hoje foi executado a escavação da sapata da escada.					
Visto Fiscalização: Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanerlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 41.498			Visto da Contratada:		 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE	

NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 21/12/2023			
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã	Bom		
INÍCIO			Tarde	Bom		
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Lixadeira		Furadeira			
	Betoneira					
	Maquita					
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro		01	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado		01	Encanador		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro		02	Pintor		
	Armador			Vidraceiro		
	Servente		04	Serralheiro		
Serviços Executados	Hoje finalizamos a escavação da sapata da escada e executamos o concreto magro.					
Visto Fiscalização			Visto da Contratada:		 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE	
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 1.498						


NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 22/12/2023			
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã	Bom		
INÍCIO			Tarde	Bom		
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Lixadeira		Furadeira			
	Betoneira					
	Maquita					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	01	Pintor			
	Armador	01	Vidraceiro			
	Servente	03	Serralheiro			
Serviços Executados	Hoje executamos a armação da sapata e pescoço de pilar.					
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Engenheiro Civil Mat. 1438			Visto da Contratada:		 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE	
Visto Fiscalização						


NORDESTE CONSTRUTORA		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 23/12/2023			
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO		Manhã	Bom		
INÍCIO		Tarde	Bom		
PRAZO RESTANTE		Noite			
Equipam.	Lixadeira		Furadeira		
	Betoneira				
	Maquita				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador		Vidraceiro		
	Servente		Serralheiro		
Serviços Executados	Hoje se dá descanso aos funcionários.				


Visto Fiscalização
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlan Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 1.198


Visto da Contratada:


Jose Sergio B. Gomes
 José Sérgio B. Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA: 34.004 - D/PE


NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 24/12/2023			
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Lixadeira		Furadeira			
	Betoneira					
	Maquita					
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado			Encanador		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro			Pintor		
	Armador			Vidraceiro		
	Servente			Serralheiro		
Serviços Executados	Hoje se dá descanso aos funcionários.					
Visto Fiscalização Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 4.198			Visto da Contratada:		 José Sérgio A. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE	


NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 25/12/2023			
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Lixadeira		Furadeira			
	Betoneira					
	Maquita					
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado			Encanador		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro			Pintor		
	Armador			Vidraceiro		
	Servente			Serralheiro		
Serviços Executados	Por conta do feriado, hoje se dá descanso aos funcionários.					
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Visto Fiscalização Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 41.498			Visto da Contratada:		 José Sérgio A. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE	

NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 26/12/2023			
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã	Bom		
INÍCIO			Tarde	Bom		
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Lixadeira		Furadeira			
	Betoneira					
	Maquita					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador			
	Carpinteiro	01	Eletricista			
	Pedreiro	02	Pintor			
	Armador	01	Vidraceiro			
	Servente	04	Serralheiro			
Serviços Executados	Hoje foi finalizada a armação da sapata, bem como sua forma e executamos a concretagem. Também finalizamos a armação do pescoço de pilar.					
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 4.438			Visto da Contratada:		 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE	


NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 27/12/2023			
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã	Bom		
INÍCIO			Tarde	Bom		
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Lixadeira		Furadeira			
	Betoneira					
	Maquita					
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro		01	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado		01	Encanador		
	Carpinteiro		01	Eletricista		
	Pedreiro		02	Pintor		
	Armador		01	Vidraceiro		
	Servente		04	Serralheiro		
Serviços Executados	Hoje foi finalizada a armação da sapata, bem como sua forma e executamos a concretagem. Também finalizamos a armação do pescoço de pilar.					
Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:			
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Viana de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 41.438					 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE	


NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 28/12/2023			
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã	Bom		
INÍCIO			Tarde	Bom		
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Lixadeira		Furadeira			
	Betoneira					
	Maquita					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador			
	Carpinteiro	01	Eletricista			
	Pedreiro	02	Pintor			
	Armador	01	Vidraceiro			
	Servente	04	Serralheiro			
Serviços Executados	Hoje executamos a forma do pescoço de pilar e também sua concretagem.					
	Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei da Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 498			Visto da Contratada:		 José Sérgio P. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE


NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 29/12/2023			
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã	Bom		
INÍCIO			Tarde	Bom		
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Lixadeira		Furadeira			
	Betoneira					
	Maquita					
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro		01	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado		01	Encanador		
	Carpinteiro		01	Eletricista		
	Pedreiro			Pintor		
	Armador			Vidraceiro		
	Servente		02	Serralheiro		
Serviços Executados	Hoje iniciamos na forma da escada de concreto, bem como foi executado o reaterro.					
	Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 41.498			Visto da Contratada:		 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE


NORDESTE CONSTRUTORA		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 30/12/2023			
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO		Manhã	Bom		
INÍCIO		Tarde	Bom		
PRAZO RESTANTE		Noite			
Equipam.	Lixadeira	Furadeira			
	Betoneira				
	Maquita				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador		Vidraceiro		
	Servente		Serralheiro		
Serviços Executados	Hoje se dá descanso aos funcionários.				
Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:		 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE	
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.336					


NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 31/12/2023			
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã	Bom		
INÍCIO			Tarde	Bom		
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Lixadeira		Furadeira			
	Betoneira					
	Maquita					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro		Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente		Serralheiro			
Serviços Executados	Hoje se dá descanso aos funcionários.					
Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:			
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vandoir de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 41.498			José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE			


NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 01/01/2024			
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã	Bom		
INÍCIO			Tarde	Bom		
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Lixadeira		Furadeira			
	Betoneira					
	Maquita					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro		Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente		Serralheiro			
Serviços Executados	Por conta do feriado, hoje se dá descanso aos funcionários.					
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 1.498			Visto da Contratada:		 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE	


NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 02/01/2024			
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã	Bom		
INÍCIO			Tarde	Bom		
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Lixadeira		Furadeira			
	Betoneira					
	Maquita					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador			
	Carpinteiro	01	Eletricista			
	Pedreiro	01	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	04	Serralheiro			
Serviços Executados	Hoje continuamos na forma da escada e executamos a laje da caixa d'água.					
Visto Fiscalização:		Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 1.498		Visto da Contratada:		 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE


NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 03/01/2024			
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã	Bom		
INÍCIO			Tarde	Bom		
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Lixadeira		Furadeira			
	Betoneira					
	Maquita					
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro		01	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado		01	Encanador		
	Carpinteiro		01	Eletricista		
	Pedreiro		01	Pintor		
	Armador		01	Vidraceiro		
	Servente		04	Serralheiro		
Serviços Executados	Hoje continuamos na forma da escada, além de iniciar sua armação e executamos a laje da caixa d'água.					
Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:			
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vitor Neri de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.498			 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE			


NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 04/01/2024			
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã	Bom		
INÍCIO			Tarde	Bom		
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Lixadeira		Furadeira			
	Betoneira					
	Maquita					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador			
	Carpinteiro	01	Eletricista			
	Pedreiro	01	Pintor			
	Armador	01	Vidraceiro			
	Servente	04	Serralheiro			
Serviços Executados	Hoje finalizamos na forma da escada, bem como sua armação e executamos a laje da caixa d'água.					
Visto Fiscalização:		Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.498		Visto da Contratada:		
				 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE		


NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 05/01/2024			
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã	Bom		
INÍCIO			Tarde	Bom		
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Lixadeira		Furadeira			
	Betoneira					
	Maquita					
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro		01	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado		01	Encanador		
	Carpinteiro		01	Eletricista		
	Pedreiro		01	Pintor		
	Armador		01	Vidraceiro		
	Servente		04	Serralheiro		
Serviços Executados	Hoje executamos a concretagem da escada de concreto e executamos a alvenaria da platibanda da caixa d'água, bem como a armação da cinta de amarração da mesma.					
Visto Fiscalização: Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil M.O.: 41.498			Visto da Contratada:		 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE	


NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 06/01/2024			
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã	Bom		
INÍCIO			Tarde	Bom		
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Lixadeira		Furadeira			
	Betoneira					
	Maquita					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro		Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente		Serralheiro			
Serviços Executados	Hoje se dá descanso aos funcionários.					
Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:			
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanerlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 41.498					 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE	


NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS				
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 07/01/2024				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte	
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã	Bom			
INÍCIO			Tarde	Bom			
PRAZO RESTANTE			Noite				
Equipam.	Lixadeira		Furadeira				
	Betoneira						
	Maquita						
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador				
	Carpinteiro		Eletricista				
	Pedreiro		Pintor				
	Armador		Vidraceiro				
	Servente		Serralheiro				
Serviços Executados	Hoje se dá descanso aos funcionários.						
Visto Fiscalização:		Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Valente de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 41.498		Visto da Contratada:		 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE	

NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 08/01/2024			
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã	Bom		
INÍCIO			Tarde	Bom		
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Lixadeira		Furadeira			
	Betoneira					
	Maquita					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	02	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	04	Serralheiro			
Serviços Executados	Hoje executamos a concretagem da cinta de amarração da caixa d'água, bem como o chapim da platibanda do térreo.					
Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:		 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE	
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vandenberg de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 47.498						


NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 09/01/2024			
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã	Bom		
INÍCIO			Tarde	Bom		
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Lixadeira		Furadeira			
	Betoneira					
	Maquita					
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro		01	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado		01	Encanador		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro		02	Pintor		
	Armador			Vidraceiro		
	Servente		04	Serralheiro		
Serviços Executados	Hoje executamos o chapisco da platibanda da caixa d'água, bem como o chapim da platibanda do 1º pavimento.					
Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:			
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 41.498			 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE			


NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 10/01/2024			
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã	Bom		
INÍCIO			Tarde	Bom		
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Lixadeira		Furadeira			
	Betoneira					
	Maquita					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	02	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	04	Serralheiro			
Serviços Executados	Hoje executamos a massa única da platibanda da caixa d'água, bem como o chapim da platibanda do 1º pavimento.					
Visto Fiscalização:		Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vitor de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498		Visto da Contratada:		
				 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE		


NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 11/01/2024			
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã	Bom		
INÍCIO			Tarde	Bom		
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Lixadeira		Furadeira			
	Betoneira					
	Maquita					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	02	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	04	Serralheiro			
Serviços Executados	Hoje executamos a trama de madeira da platibanda do térreo, bem como o chapim da platibanda do 1º pavimento.					
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Visto Fiscalização: Paulo Vanderlei da Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 1.198			Visto da Contratada:		 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE	


NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS				
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 12/01/2024				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte	
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã	Bom			
INÍCIO			Tarde	Bom			
PRAZO RESTANTE			Noite				
Equipam.	Lixadeira		Furadeira				
	Betoneira						
	Maquita						
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador				
	Carpinteiro		Eletricista				
	Pedreiro	02	Pintor				
	Armador		Vidraceiro				
	Servente	04	Serralheiro				
Serviços Executados	Hoje telhamos da platibanda do térreo, bem como executamos o chapim da platibanda do 1º pavimento.						
Visto Fiscalização:		Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vandoalves Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 41.498		Visto da Contratada:		 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE	


NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 13/01/2024			
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Lixadeira		Furadeira			
	Betoneira					
	Maquita					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro		Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente		Serralheiro			
Serviços Executados	Hoje se dá descanso aos funcionários.					
Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:			
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vandoir de Mendonça Filho Engenheiro Civil Nº 41.498			José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE			


NORDESTE CONSTRUTORA		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 14/01/2024			
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO		Manhã			
INÍCIO		Tarde			
PRAZO RESTANTE		Noite			
Equipam.	Lixadeira	Furadeira			
	Betoneira				
	Maquita				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador		Vidraceiro		
	Servente		Serralheiro		
Serviços Executados	Hoje se dá descanso aos funcionários.				
Visto Fiscalização:	Prefeitura Municipal de Paudalho-PE Paulo Vitorino de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498		Visto da Contratada:	 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE	


NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 15/01/2024			
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Lixadeira		Furadeira			
	Betoneira					
	Maquita					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	02	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	04	Serralheiro			
Serviços Executados	Hoje executamos o rufo, bem como executamos a calha da platibanda do térreo.					
Visto Fiscalização:		Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vasconcelos de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.498		Visto da Contratada:		 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE


NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS				
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 16/01/2024				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte	
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã				
INÍCIO			Tarde				
PRAZO RESTANTE			Noite				
Equipam.	Lixadeira		Furadeira				
	Betoneira						
	Maquita						
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador				
	Carpinteiro		Eletricista				
	Pedreiro	02	Pintor				
	Armador		Vidraceiro				
	Servente	04	Serralheiro				
Serviços Executados	Hoje executamos o rufo, bem como executamos a calha da platibanda do térreo.						
Visto Fiscalização:		Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vandenberg de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 41.436		Visto da Contratada:		 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE	


NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS				
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 17/01/2024				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte	
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã				
INÍCIO			Tarde				
PRAZO RESTANTE			Noite				
Equipam.	Lixadeira		Furadeira				
	Betoneira						
	Maquita						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		01	Encanador		01	
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro		01	Pintor			
	Armador			Vidraceiro			
	Servente		03	Serralheiro			
Serviços Executados	Hoje executamos a instalação das janelas de alumínio, bem como a tubulação de esgoto das grelhas de piso.						
Visto Fiscalização:		Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vasconcelos de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.498		Visto da Contratada:		 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE	


NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS				
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 18/01/2024				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte	
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã				
INÍCIO			Tarde				
PRAZO RESTANTE			Noite				
Equipam.	Lixadeira		Furadeira				
	Betoneira						
	Maquita						
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador	01			
	Carpinteiro		Eletricista				
	Pedreiro	01	Pintor				
	Armador		Vidraceiro				
	Servente	03	Serralheiro				
Serviços Executados	Hoje executamos a instalação das janelas de alumínio, bem como a tubulação de esgoto das grelhas de piso.						
Visto Fiscalização:		Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanseloni de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 41.498		Visto da Contratada:		 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE	


NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 19/01/2024			
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Lixadeira		Furadeira			
	Betoneira					
	Maquita					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador		01	
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	01	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	03	Serralheiro			
Serviços Executados	Hoje executamos a instalação das janelas de alumínio, bem como a instalação das cubas de inox.					
Visto Fiscalização:		Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.498		Visto da Contratada:		
				 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE		


NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS				
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 20/01/2024				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte	
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã				
INÍCIO			Tarde				
PRAZO RESTANTE			Noite				
Equipam.	Lixadeira		Furadeira				
	Betoneira						
	Maquita						
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador				
	Carpinteiro		Eletricista				
	Pedreiro		Pintor				
	Armador		Vidraceiro				
	Servente		Serralheiro				
Serviços Executados	Hoje se dá descanso aos funcionários.						
	Visto Fiscalização:		Prefeitura Municipal de Paudalho Paulo Vitor de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498		Visto da Contratada:		 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE


NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 21/01/2024			
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Lixadeira		Furadeira			
	Betoneira					
	Maquita					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro		Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente		Serralheiro			
Serviços Executados	Hoje se dá descanso aos funcionários.					
Visto Fiscalização:		Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vitorino de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.498		Visto da Contratada:		 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE


NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 22/01/2024			
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Lixadeira		Furadeira			
	Betoneira					
	Maquita					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador	01		
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	01	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	03	Serralheiro			
Serviços Executados	Hoje executamos a instalação das janelas de alumínio, bem como a instalação das cubas de inox.					
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Visto Fiscalização: Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 41.498			Visto da Contratada:		 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE	


NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS				
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 23/01/2024				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte	
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã				
INÍCIO			Tarde				
PRAZO RESTANTE			Noite				
Equipam.	Lixadeira		Furadeira				
	Betoneira						
	Maquita						
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador	01			
	Carpinteiro		Eletricista				
	Pedreiro	01	Pintor				
	Armador		Vidraceiro				
	Servente	03	Serralheiro				
Serviços Executados	Hoje executamos a instalação das janelas de alumínio, bem como a instalação das cubas de inox.						
Visto Fiscalização:		Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vitor de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.498		Visto da Contratada:		 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE	


NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 24/01/2024			
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Lixadeira		Furadeira			
	Betoneira					
	Maquita					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador	01		
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	01	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	03	Serralheiro			
Serviços Executados	Hoje executamos a instalação das janelas de alumínio, bem como a instalação de vaso sanitários e registro para chuveiros.					
Visto Fiscalização: Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vandoir de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat. 41.438			Visto da Contratada:		 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE	


NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 25/01/2024			
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Lixadeira		Furadeira			
	Betoneira					
	Maquita					
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro		01	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado		01	Encanador		01
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro		01	Pintor		
	Armador			Vidraceiro		
	Servente		03	Serralheiro		
Serviços Executados	Hoje executamos as caixas de esgoto na lateral da obra, bem como a instalação de chuveiros elétricos.					
Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:			
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat. 41.498			 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE			



NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 26/01/2024			
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Lixadeira		Furadeira			
	Betoneira					
	Maquita					
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro		01	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado		01	Encanador		
	Carpinteiro			Eletricista		01
	Pedreiro		01	Pintor		
	Armador			Vidraceiro		
	Servente		03	Serralheiro		
Serviços Executados	Hoje executamos as caixas de esgoto na lateral da obra, bem como a instalação de eletrodutos de elétrica.					
	Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:		
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498			 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE			

NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS				
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 27/01/2024				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte	
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã				
INÍCIO			Tarde				
PRAZO RESTANTE			Noite				
Equipam.	Lixadeira		Furadeira				
	Betoneira						
	Maquita						
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador				
	Carpinteiro		Eletricista				
	Pedreiro		Pintor				
	Armador		Vidraceiro				
	Servente		Serralheiro				
Serviços Executados	Hoje se dá descanso aos funcionários.						
	Visto Fiscalização:		Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498		Visto da Contratada:		 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE

NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 28/01/2024			
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Lixadeira		Furadeira			
	Betoneira					
	Maquita					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro		Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente		Serralheiro			
Serviços Executados	Hoje se dá descanso aos funcionários.					
Visto Fiscalização:		Prefeitura Municipal de Paudalho-PE Paulo Vasconcelos de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498		Visto da Contratada:		 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE

NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 29/01/2024			
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Lixadeira		Furadeira			
	Betoneira					
	Maquita					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista		01	
	Pedreiro	01	Pintor		02	
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	06	Serralheiro			
Serviços Executados	Hoje executamos o selador da fachada, bem como na instalação do quadro de elétrica do térreo.					
	Visto Fiscalização:		Prefeitura Municipal de Paudalho-PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.498		Visto da Contratada:	
				 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE		

NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS				
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 30/01/2024				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte	
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã				
INÍCIO			Tarde				
PRAZO RESTANTE			Noite				
Equipam.	Lixadeira		Furadeira				
	Betoneira						
	Maquita						
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador				
	Carpinteiro		Eletricista	01			
	Pedreiro	01	Pintor	02			
	Armador		Vidraceiro				
	Servente	06	Serralheiro				
Serviços Executados	Hoje executamos a textura da fachada, bem como na instalação dos disjuntores do térreo.						
	Visto Fiscalização:		Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vandenberg de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.498		Visto da Contratada:		 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE

NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 31/01/2024			
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Lixadeira		Furadeira			
	Betoneira					
	Maquita					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista	01		
	Pedreiro	01	Pintor	02		
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	06	Serralheiro			
Serviços Executados	Hoje executamos a textura da fachada, bem como na instalação dos disjuntores do térreo.					
Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:		 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE	
 Prefeitura Municipal de Paudalho Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498						
