



**PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO**

**Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Agrário  
Rod. BR 408-KM 76, Chã de Capoeira, Paudalho - PE.**

**C. I N° 1027/2020**

**Da:** Secretaria de Desen. Urbano e Agrário.

**Para:** Secretaria Municipal de Saúde

Venho através desta, encaminhar documentos descritos na tabela abaixo, para **análise e conhecimentos**, conforme documentos em anexo.

Descrição	Dados da Empresa	Documentos em anexo
11° BM - Referente à Serviço de Construção da Unidade Básica de Saúde Belém, conforme contrato n° 012/2018, no município de Paudalho – PE.	<b>SS OBRAS TERRAPLANAGENS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO - LTDA;</b>  CNPJ n° 14.417.792/0001-09;  Dados Bancários Ag. 1584; Op. 003 C/c. 2934-7 Caixa Econômica Federal	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nota Fiscal n° 229;</li><li>• 11° BM;</li><li>• Memória de Cálculo;</li><li>• Relatório Fotográfico;</li><li>• Plano de Trabalho.</li></ul>

Atenciosamente,

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
Secretário Municipal de Desenvolvimento  
Urbano e Agrário  
Mat: 48.911

**Carlos Pinheiro Campos Gouveia**  
Secretário de Desenvolvimento Urbano e Agrário.  
Mat. 48.911.

RECEBIDO 15 / 12 / 2020  
GABINETE DO SECRETÁRIO  
Secretaria de Saúde - Paudalho - PE  
Ke My Cop.

 <b>PREFEITURA DO RECIFE</b> SECRETARIA DE FINANÇAS	 <b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</b>	Número da Nota <b>00000229</b>			
		Data e Hora de Emissão <b>01/12/2020 11:07:25</b>			
		Código de Verificação <b>B98V-RGPH</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>14.417.792/0001-09</b> Inscrição Municipal: <b>659.140-8</b> Nome/Razão Social: <b>SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA CO</b> Endereço: <b>RUA NICOMEDES HARTMANN 176 - CAMPO GRANDE - CEP: 52040-252</b> Município: <b>Recife</b> UF: <b>PE</b> E-mail: <b>ssservicosltda@hotmail.com</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO</b> CPF/CNPJ: <b>07.868.234/0001-02</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>PC PEDRO COUTINHO 18, CENTRO - CENTRO - CEP: 55825-000</b> Município: <b>Paudalho</b> UF: <b>PE</b> E-mail: <b>----</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BELÉM, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE. CONTRATO N° 012/2018 DE ACORDO COM A PROPOSTA 078682340001/17-001 DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/MINISTÉRIO DA SAÚDE. EM 11 - PERÍODO DE 01/09/2020 À 30/11/2020.					
40% MÃO DE OBRA 60% MATERIAL					
DADOS BANCÁRIOS CAIXA ECONÔMICO AG 1584 OP 003 C/C 2934-7					
ATESTO <u>01/10/20</u> <input checked="" type="checkbox"/> SERVIÇO FOI EXECUTADO <input type="checkbox"/> MATERIAL FOI ENTREGUE  Paulo Vanderlei de M. Filho Engenheiro Civil CREA 22065 D/PE Mat.: 41.498					
Retenção de COFINS R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 0,00	Retenção de INSS R\$ 2.285,71	Retenção de IRPJ R\$ 311,69	Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 51.947,96</b>					
Código da Atividade Prestada <b>4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS</b> <b>07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanag...</b>					
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>51.947,96</b>	Alíquota (%) <b>2,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>1.038,96</b>	Crédito p/ IPTU (R\$) <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008. - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. - O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. Local da prestação do serviço: Paudalho - PE. - Esta NFS-e não gera crédito. - CEI / Código da Obra: CO07868234					



## BOLETIM DE MEDIÇÃO FINAL

PREEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO		BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição		Nº do CT	Data do CT				
		11	01/12/2020	01/09/2020	ATÉ	30/11/2020	012/2018	27/04/2018			
Início da obra - data		Término obra	Empresa Contratada		CNPJ		AG. PROMOTOR OU TOMADOR				
30/04/2018		13/02/2021	SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		14.417.792/0001-09						
Valor total inicial (R\$)		CTEF-dt assinatura	Objeto do CTEF ( resumido)								
R\$ 524.499,00			CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM								
Valor Acumulado do contrato (R\$)		CT-Dt último Adit.	Local da obra ( Bairro / Município / UF)								
R\$ 510.015,06			LOTEAMENTO BELÉM, NO MUNICÍPIO DO PAUDALHO/PE.								
Saldo do contrato (R\$)								VALOR BOLETIM			
R\$ 14.483,94								R\$ 51.947,96			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREVISTO NO ORÇAMENTO			EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			ACUMULADO (%)
		UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				R\$ 8.238,82			R\$ 8.238,82	R\$ -	R\$ 8.238,82	
1.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA. (MOD.AV-43/2000).	M²	6,00	R\$ 362,87	R\$ 2.177,22	6,00	6,00	R\$ 2.177,22	R\$ -	R\$ 2.177,22	100,00%
1.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X.	M²	128,56	R\$ 47,15	R\$ 6.061,60	128,56	128,56	R\$ 6.061,60	R\$ -	R\$ 6.061,60	100,00%
<b>2.0</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>				R\$ 6.650,99			R\$ 6.650,98	R\$ -	R\$ 6.650,98	
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M³	172,78	R\$ 20,41	R\$ 3.526,44	172,78	172,78	R\$ 3.526,44	R\$ -	R\$ 3.526,44	100,00%
2.2	REATERRO APOILOADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M³	104,43	R\$ 29,92	R\$ 3.124,55	104,43	104,43	R\$ 3.124,55	R\$ -	R\$ 3.124,55	100,00%
<b>3.0</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>				R\$ 146.406,74			R\$ 146.296,42	R\$ -	R\$ 146.296,42	
3.1	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5M DE VÃO. AF_03/2018	M	70,30	R\$ 27,63	R\$ 1.942,39	70,30	70,30	R\$ 1.942,39	R\$ -	R\$ 1.942,39	100,00%
3.2	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12855), LANÇADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³	15,79	R\$ 2.174,68	R\$ 34.338,20	15,79	15,79	R\$ 34.338,20	R\$ -	R\$ 34.338,20	100,00%
3.3	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12855), LANÇADO EM FUNDAÇÃO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³	27,55	R\$ 1.640,17	R\$ 45.186,69	27,55	27,55	R\$ 45.186,68	R\$ -	R\$ 45.186,68	100,00%
3.4	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12855), LANÇADO EM PILARES, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³	9,33	R\$ 2.833,66	R\$ 26.438,04	9,33	9,33	R\$ 26.438,04	R\$ -	R\$ 26.438,04	100,00%
3.5	CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDAÇÕES, LANÇADO E ADENSADO.	M³	3,46	R\$ 408,55	R\$ 1.413,58	3,19	3,19	R\$ 1.303,27	R\$ -	R\$ 1.303,27	92,20%
3.6	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12855), LANÇADO EM LAJES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³	5,18	R\$ 2.136,43	R\$ 11.066,71	5,18	5,18	R\$ 11.066,71	R\$ -	R\$ 11.066,71	100,00%
3.7	LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO.	M²	299,61	R\$ 86,85	R\$ 26.021,13	299,61	299,61	R\$ 26.021,13	R\$ -	R\$ 26.021,13	100,00%
<b>4.0</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>				R\$ 32.589,88			R\$ 32.583,16	R\$ -	R\$ 32.583,16	
4.1	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FURROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:10 - 12 VEZ.	M²	745,28	R\$ 31,36	R\$ 23.371,98	745,28	745,28	R\$ 23.371,98	R\$ -	R\$ 23.371,98	100,00%
4.2	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FURROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:10 - 1 VEZ.	M²	123,78	R\$ 74,47	R\$ 9.217,90	123,69	123,69	R\$ 9.211,19	R\$ -	R\$ 9.211,19	99,93%
<b>5.0</b>	<b>REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO</b>				R\$ 109.192,98			R\$ 101.378,73	R\$ 1.678,92	R\$ 103.057,65	
5.1	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO DE 1:3 COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M²	933,29	R\$ 24,71	R\$ 23.061,59	908,81	908,81	R\$ 22.456,69	R\$ -	R\$ 22.456,69	97,38%
5.2	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.	M²	1.142,30	R\$ 5,57	R\$ 6.362,62	1.142,30	1.142,30	R\$ 6.362,60	R\$ -	R\$ 6.362,60	100,00%
5.3	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM PASTA E AREIA NO TRACO 1:4 , DOSADA COM 110 KG DE CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M²	593,18	R\$ 21,98	R\$ 13.038,10	593,18	593,18	R\$ 13.038,10	R\$ -	R\$ 13.038,10	100,00%
5.4	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERÂMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, EM CORES, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR,ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOÇO PRONTO.	M²	205,93	R\$ 65,60	R\$ 13.509,01	205,93	205,93	R\$ 13.509,01	R\$ -	R\$ 13.509,01	100,00%
5.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M²	450,04	R\$ 78,93	R\$ 35.521,87	386,25	386,25	R\$ 30.486,71	R\$ -	R\$ 30.486,71	85,83%

Paulo Vandelei de M. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA 22006 D/PE  
Mat.: 41-198

Carlos Pinheiro dos Santos  
Secretário Municipal de Desenvolvimento  
Urbano e Agrário  
Mat.: 48.911

Eduardo José Vidal Marinho  
Engenheiro Civil  
CREA 180638634 - 8 / PE  
Mat. 48.386

José Sérgio Bezerra Gomes  
Engenheiro Civil  
CREA: 34.004 - D/PE



## BOLETIM DE MEDIÇÃO FINAL

PREEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO				BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição	Nº do CT	Data do CT				
				11	01/12/2020	01/09/2020 ATÉ 30/11/2020	012/2018	27/04/2018				
Início da obra - data		Término obra		Empresa Contratada		AG. PROMOTOR OU TOMADOR						
30/04/2018		13/02/2021		SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		CNPJ 14.417.792/0001-09						
Valor total inicial (R\$)		CTEF-dt assinatura		Objeto do CTEF ( resumido)								
R\$ 524.499,00				CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM								
Valor Acumulado do contrato (R\$)		CT-Dt último Adit.		Local da obra ( Bairro / Município / UF)								
R\$ 510.015,06				LOTEAMENTO BELÉM, NO MUNICÍPIO DO PAUDALHO/PE.								
Saldo do contrato (R\$)				VALOR BOLETIM								
R\$ 14.483,94				R\$ 51.947,96								
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREVISTO NO ORÇAMENTO				EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			ACUMULADO (%)
		UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	
5.6	Fornecimento e instalação de fechamento lateral (platiandas - lado terra e lado ar) em estrutura em painéis de Aluminum Composite Material - ACM Reynobond, de fabricação Alcoa ou equivalente técnico, composto por com duas chapas de alumínio de 0,5mm de espessura cada e um núcleo de polietileno de baixa densidade, acabamento com pintura externa em PDVF - fluor carbono - Kynar 500 - e interna em poliéster, chapas com dimensões (125x350)cm, fixado em estrutura auxiliar de Metalon, na cor Seafoam Green Metalic (REF.: 604), Alucobond ou equivalente técnico. Inclusive estrutura auxiliar em Metalon	M²	60,93	R\$ 290,47	R\$ 17.699,78	53,45	5,78	59,23	R\$ 15.525,62	R\$ 1.678,92	R\$ 17.204,54	97,20%
5.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA MEDINDO 6,00X3,60M, ESTRUTURA INTERNA EM Um TUBO INDUSTRIAL DE 30X30, CANTONEIRA L DE 11/2"X1/8", TUBO PATENTE DE 3/4", TRATADO COM ANTI CORROSIVO E COM APLICAÇÃO DE ESMALTE SINTÉTICO, ILUMINADA INTERNAMENTE COM 10 CONJUNTO DE LÂMPADAS E REATORES HO DE 110W REVESTIMENTO EM CHAPA DE ALUM. (ACM) NAS CORES AZUL BRANCA DE 4MM PARA RECORTE EM EQUIPAMENTO TIPO ROUTTER E ENCAIXE PELA PARTE POSTERIOR DE ACRILICO BRANCO DE 3MM. DETALHES LATERAIS EM CHAPA GALV.	UND	0,00	R\$19.309,71	R\$ -			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.0	<b>COBERTA/IMPERMEABILIZAÇÃO</b>				<b>R\$ 14.239,23</b>				<b>R\$ 13.629,62</b>	<b>R\$ 609,60</b>	<b>R\$ 14.239,22</b>	
6.1	COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO OU SIM 6 MM DE ESPESURA, SENDO A ÁREA MEDIDA NA PROJEÇÃO HORIZONTAL.	M²	299,61	R\$ 36,17	R\$ 10.836,89	299,61		299,61	R\$ 10.836,89	R\$ -	R\$ 10.836,89	100,00%
6.2	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N. 26	M	0,00	R\$ 56,72	R\$ -			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.3	IMPERMEABILIZAÇÃO, EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:3 COM SIKA 1-ESPESURA DE 3 CM.	M²	89,30	R\$ 38,10	R\$ 3.402,33	73,30	16,00	89,30	R\$ 2.792,73	R\$ 609,60	R\$ 3.402,33	100,00%
7.0	<b>ESQUADRIAS E VIDROS</b>				<b>R\$ 36.699,33</b>				<b>R\$ 13.798,86</b>	<b>R\$ 18.805,16</b>	<b>R\$ 32.604,02</b>	
7.1	ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE EM MADEIRA DE LEI E FOLHA EM COMPENSADO DE JEQUITIBÁ PARA PORTAS INTERNAS, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS.	M²	35,28	R\$ 276,53	R\$ 9.755,98	35,28		35,28	R\$ 9.755,98	R\$ -	R\$ 9.755,98	100,00%
7.2	FORNECIMENTO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO, TIPO CORRER SEM BANDEIRA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO	M²	14,20	R\$ 284,71	R\$ 4.042,88	14,20	-1,20	13,00	R\$ 4.042,88	R\$ 341,65	R\$ 3.701,23	91,55%
7.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO COM ESPESURA DE 10MM, INCLUSIVE FERRAGENS.	M²	35,55	R\$ 534,71	R\$ 19.008,94		28,53	28,53	R\$ -	R\$ 15.255,28	R\$ 15.255,28	80,25%
7.4	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M²	7,35	R\$ 529,46	R\$ 3.891,53		7,35	7,35	R\$ -	R\$ 3.891,53	R\$ 3.891,53	100,00%
7.5	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M²	0,00	R\$ 736,45	R\$ -			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7.6	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	M²	0,00	R\$ 1.364,92	R\$ -			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7.7	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M²	0,00	R\$ 736,45	R\$ -			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8.0	<b>REVESTIMENTO DE PISO</b>				<b>R\$ 40.829,02</b>				<b>R\$ 40.691,67</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 40.691,67</b>	
8.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESURA 5CM AF 06/2014	M²	259,71	R\$ 78,28	R\$ 20.330,10	259,71		259,71	R\$ 20.330,09	R\$ -	R\$ 20.330,09	100,00%
8.2	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10.M². AF 06/2014	M²	259,71	R\$ 78,93	R\$ 20.498,92	257,97		257,97	R\$ 20.361,58	R\$ -	R\$ 20.361,58	99,33%
9.0	<b>PINTURA</b>				<b>R\$ 13.959,97</b>				<b>R\$ 12.174,01</b>	<b>R\$ 492,57</b>	<b>R\$ 12.666,58</b>	

Paulo Vandenei de M. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA 22063-D/PE  
Mat.: 41.498

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
Secretário Municipal de Desenvolvimento  
Urbano e Agrário  
Mat.: 48.911

Eduardo José Vidal Marinho  
Engenheiro Civil  
CREA 180638634-8 / PE  
Mat.: 48.386

José Sérgio Bezerra Gomes  
Engenheiro Civil  
CREA: 34.004 - D/PE



## BOLETIM DE MEDIÇÃO FINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO			BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição	Nº do CT	Data do CT					
			11	01/12/2020	01/09/2020 ATÉ 30/11/2020	012/2018	27/04/2018					
Início da obra - data		Término obra	Empresa Contratada		CNPJ	AG. PROMOTOR OU TOMADOR						
30/04/2018		13/02/2021	SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		14.417.792/0001-09							
Valor total inicial (R\$)		CTEF-Dt assinatura	Objeto do CTEF ( resumido)									
R\$ 524.499,00			CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM									
Valor Acumulado do contrato (R\$)		CT-Dt último Adit.	Local da obra ( Bairro / Município / UF)									
R\$ 510.015,06			LOTEAMENTO BELÉM, NO MUNICÍPIO DO PAUDALHO/PE.									
Saldo do contrato (R\$)			VALOR BOLETIM									
R\$ 14.483,94			R\$ 51.947,96									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREVISTO NO ORÇAMENTO				EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			ACUMULADO (%)
		UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	
9.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M²	335,57	R\$ 10,10	R\$ 3.389,25	286,80	48,77	335,57	R\$ 2.896,68	R\$ 492,57	R\$ 3.389,25	100,00%
9.2	PINTURA A ÓLEO EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS, COM APARELHAMENTO E MASSAMENTO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR DO BRANCO FOSCO, DUAS DEMÃOS, COM MASSA À ÓLEO, DUAS DEMÃOS.	M²	81,90	R\$ 34,53	R\$ 2.828,01	70,56		70,56	R\$ 2.436,44	R\$ -	R\$ 2.436,44	86,15%
9.3	PINTURA LÁTEX EM PAREDES EXTERNAS, CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMÃOS, SEM MASSA ACRILICA, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE FUNDO PREPARADOR	M²	557,03	R\$ 13,90	R\$ 7.742,71	492,15		492,15	R\$ 6.840,89	R\$ -	R\$ 6.840,89	88,35%
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				R\$ 23.018,32				R\$ 12.617,13	R\$ 10.159,77	R\$ 22.776,90	
	LOUCAS E APARELHOS SANITÁRIOS				R\$ 8.495,34				R\$ -	R\$ 8.363,31	R\$ 8.363,31	
10.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA DE LOUÇA DECA VOGUE PLUS LINHA CONFORT MOD P51 (P/DEFICIENTES), ACESSÓRIOS (PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO DE PVC CROMADO ASTRA OU SIMILAR) E ASSENTO SANITÁRIO EM MDF LAQUEADO BRANCO SÍMOL O/L SIMILAR	UND	4,00	R\$ 728,32	R\$ 2.913,28	4,00		4,00	R\$ -	R\$ 2.913,28	R\$ 2.913,28	100,00%
10.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES	UND	1,00	R\$ 275,35	R\$ 275,35	1,00		1,00	R\$ -	R\$ 275,35	R\$ 275,35	100,00%
10.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO SIMPLES, GRANDE, SEM COLUNA, DE LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES	UND	15,00	R\$ 163,23	R\$ 2.448,45	15,00		15,00	R\$ -	R\$ 2.448,45	R\$ 2.448,45	100,00%
10.4	SABONETEIRA EM VIDRO COM SUPORTE EM AÇO INOX PARA SABÃO LÍQUIDO	UND	13,00	R\$ 46,45	R\$ 603,85	13,00		13,00	R\$ -	R\$ 603,85	R\$ 603,85	100,00%
10.5	PORTA PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS COM ACRILICO, DA JSN, REF N7 OU SIMILAR	UND	13,00	R\$ 46,45	R\$ 603,85	13,00		13,00	R\$ -	R\$ 603,85	R\$ 603,85	100,00%
10.7	FORNECIMENTO DE BANCADA EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO	M²	0,66	R\$ 351,45	R\$ 231,96	0,58		0,58	R\$ -	R\$ 203,84	R\$ 203,84	87,88%
10.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO AOS DEFICIENTES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" COM FLANGE SOLDADA NAS EXTREMIDADES, INCL PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E FUNDO PREPARADOR GALVOPRIMER OU SIMILAR, CHUMBADO NA PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M	7,76	R\$ 76,41	R\$ 592,93	6,40		6,40	R\$ -	R\$ 489,02	R\$ 489,02	82,48%
10.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALÇAO DE INOX COM 60CM DE LARGURA E 01 CUBA DE 40X34X12CM, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO PARA PIA CROMADOS	M	0,00	R\$ 819,72	R\$ -			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
10.10	FORNECIMENTO DE BALÇAO EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CORTE PARA UMA CUBA, TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO.	M	0,00	R\$ 375,47	R\$ -			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
10.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TANQUE DE LOUÇA, COM COLUNA, 30 LITROS, COR BRANCA, FAB: CELITE OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO COPO PARA TANQUE DE 1 1/4 POL X 1 1/2 POL EM PVC E VÁLVULA DE ESCOAMENTO EM PVC, PARA TANQUE DE 1 1/4 POL.	UND	1,00	R\$ 657,01	R\$ 657,01	1,00		1,00	R\$ -	R\$ 657,01	R\$ 657,01	100,00%
10.12	FORNECIMENTO DE CHUVEIRO DE METAL, DIAMETRO DE 1/2 POL., INCLUSIVE FIXAÇÃO	UND	2,00	R\$ 84,33	R\$ 168,66	2,00		2,00	R\$ -	R\$ 168,66	R\$ 168,66	100,00%
	REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAIS				R\$ 71,31				R\$ -	R\$ 71,31	R\$ 71,31	100,00%
10.13	FORNECIMENTO DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE FIBROCIMENTO, COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 1000 LITROS, INCLUSIVE COLOCACAO	UND	0,00	R\$ 418,46	R\$ -			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
10.14	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1 1/4")	UND	0,00	R\$ 88,98	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	

José Sérgio Bezares Gomes

Engenheiro Civil

CREA: 31101 PE

Paulo Vandelei de M. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA 22085 D / PE  
Mat.: 41.498Carlos Primo de Sousa Gouveia  
Secretário Municipal de Desenvolvimento  
Urbano e Agrário  
Mat.: 48.911Eduardo José Vidal Marinho  
Engenheiro Civil  
CREA 180638634 - 8 / PE  
Mat.: 48.386

**BOLETIM DE MEDIÇÃO FINAL**

PREEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO		BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição		Nº do CT	Data do CT					
		11	01/12/2020	01/09/2020	ATÉ	30/11/2020	012/2018					
Início da obra - data		Término obra	Empresa Contratada		CNPJ	AG. PROMOTOR OU TOMADOR						
30/04/2018		13/02/2021	SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		14.417.792/0001-09							
Valor total inicial (R\$)		CTEF-dt assinatura	Objeto do CTEF ( resumido)									
R\$ 524.499,00			CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM									
Valor Acumulado do contrato (R\$)		CT-Dt último Adit.	Local da obra ( Bairro / Município / UF)									
R\$ 510.015,06			LOTEAMENTO BELÉM, NO MUNICÍPIO DO PAUDALHO/PE.									
Saído do contrato (R\$)							VALOR BOLETIM					
R\$ 14.483,94							R\$ 51.947,96					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREVISTO NO ORÇAMENTO				EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			ACUMULADO (%)
		UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	
10.15	TORNEIRA DE BOIA VAZÃO TOTAL 3/4 COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	0,00	R\$ 51,81	R\$ -			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
10.16	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	0,00	R\$ 10,28	R\$ -			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
10.17	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM PVC 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013.	UND	0,00	R\$ 12,78	R\$ -			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
10.18	ASSENTO DE CHAVE DE BOIA AUTOMOTIVA, 15ª SUPERIOR OU INFERIOR MARCA LENZ OU SIMILAR (INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL).	UND	0,00	R\$ 43,32	R\$ -			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
10.19	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA.	UND	1,00	R\$ 71,31	R\$ 71,31		1,00	1,00	R\$ -	R\$ 71,31	R\$ 71,31	100,00%
10.20	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014.	UND	0,00	R\$ 40,45	R\$ -			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
10.21	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNEC. E INSTALAÇÃO.	UND	0,00	R\$ 68,10	R\$ -			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS</b>				<b>R\$ 1.580,07</b>				<b>R\$ 1.580,07</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.580,07</b>	<b>100,00%</b>	
10.22	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO, REF.1416, DECA 50 OU SIMILAR, LINHA PRATA, DIAMETRO DE 3/4	UND	2,00	R\$ 95,53	R\$ 191,06	2,00		2,00	R\$ 191,06	R\$ -	R\$ 191,06	100,00%
10.23	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO.	UND	0,00	R\$ 249,73	R\$ -			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
10.24	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF.1509-C39, DECA OU SIMILAR, LINHA PRATA, DIAMETRO DE 3/4 POL., INCLUSIVE FIXAÇÃO	UND	15,00	R\$ 90,96	R\$ 1.364,70	15,00		15,00	R\$ 1.364,70	R\$ -	R\$ 1.364,70	100,00%
10.25	INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE BOIA DIAM.3/4 POL., INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA.	UND	1,00	R\$ 24,31	R\$ 24,31	1,00		1,00	R\$ 24,31	R\$ -	R\$ 24,31	100,00%
10.26	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	0,00	R\$ 10,28	R\$ -			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
10.27	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ONERADO	UND	0,00	R\$ 17,62	R\$ -			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>PONTOS DE HIDRÁULICA</b>				<b>R\$ 7.499,69</b>				<b>R\$ 7.499,69</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 7.499,69</b>	<b>100,00%</b>	
10.28	PONTO DE ÁGUA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA ATÉ O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE	PT	36,00	R\$ 27,75	R\$ 999,00	36,00		36,00	R\$ 999,00	R\$ -	R\$ 999,00	100,00%
10.29	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUNA OU SUB-COLETOR	PT	13,00	R\$ 77,17	R\$ 1.003,21	13,00		13,00	R\$ 1.003,21	R\$ -	R\$ 1.003,21	100,00%
10.30	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUNA OU SUB-COLETOR	PT	27,00	R\$ 66,37	R\$ 1.791,99	27,00		27,00	R\$ 1.791,99	R\$ -	R\$ 1.791,99	100,00%
10.31	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUNA OU SUB-COLETOR	PT	5,00	R\$ 85,47	R\$ 427,35	5,00		5,00	R\$ 427,35	R\$ -	R\$ 427,35	100,00%
10.32	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8 CM.	UND	2,00	R\$ 1.499,81	R\$ 2.999,62	2,00		2,00	R\$ 2.999,62	R\$ -	R\$ 2.999,62	100,00%
10.33	CAIXA DE GORDURA COM PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSÕES INTERNAS 0,50 X 0,50 X 0,50 M COM CHICANA DE CONCRETO.	UND	1,00	R\$ 278,52	R\$ 278,52	1,00		1,00	R\$ 278,52	R\$ -	R\$ 278,52	100,00%
10.34	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESURA 10CM.	UND	0,00	R\$ 1.285,47	R\$ -			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>REDE EXTERNA</b>				<b>R\$ 5.371,90</b>				<b>R\$ 3.537,37</b>	<b>R\$ 1.725,15</b>	<b>R\$ 5.262,52</b>	<b>97,96%</b>	

José Sergio Bezerra Gomes

Engenheiro C

Paulo Vandenri de M. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA 22063/DIPE  
Mat.: 41.498

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
Secretário Municipal de Desenvolvimento  
Urbano e Agrário  
Mat.: 48.911

Eduardo José Vidal Marinho  
Engenheiro Civil  
CREA 180639534-8/PE  
Mat. 48.386



## BOLETIM DE MEDIÇÃO FINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO		BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição		Nº do CT	Data do CT					
		11	01/12/2020	01/09/2020	ATÉ	30/11/2020	012/2018					
Início da obra - data		Término obra	Empresa Contratada		CNPJ	AG. PROMOTOR OU TOMADOR						
30/04/2018		13/02/2021	SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		14.417.792/0001-09							
Valor total inicial (R\$)		CTEF-Dt assinatura	Objeto do CTEF ( resumido)									
R\$ 524.499,00			CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM									
Valor Acumulado do contrato (R\$)		CT-Dt último Adit.	Local da obra ( Bairro / Município / UF)									
R\$ 510.015,06			LOTEAMENTO BELÉM, NO MUNICÍPIO DO PAUDALHO/PE.									
Saldo do contrato (R\$)							VALOR BOLETIM					
R\$ 14.483,94							R\$ 51.947,96					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREVISTO NO ORÇAMENTO				EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			ACUMULADO (%)
		UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	
10.36	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X80 CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇÃO 1:4) E= 2,0 CM, COM TAMPAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO.	UND	7,00	R\$ 133,23	R\$ 932,61	7,00		7,00	R\$ 932,61	R\$ -	R\$ 932,61	100,00%
10.37	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS, DIAM 75 MM, PARA COLUNAS DE ESGOTO, VENTILAÇÃO OU ÁGUAS PLUVIAIS.	M	25,00	R\$ 19,13	R\$ 478,25	24,30		24,30	R\$ 464,86	R\$ -	R\$ 464,86	97,20%
10.38	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS, DIAM. 100MM COLUNAS DE ESGOTO, VENTILAÇÃO OU ÁGUAS PLUVIAIS.	M	120,00	R\$ 23,30	R\$ 2.796,00	76,43	39,45	115,88	R\$ 1.780,82	R\$ 919,19	R\$ 2.700,00	96,57%
10.39	FORNECIMENTO DE BOMBA 3/4 HP, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	R\$ 805,96	R\$ 805,96		1,00	1,00	R\$ -	R\$ 805,96	R\$ 805,96	100,00%
10.40	CAIXA DE BRITA PARA COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM PAREDES EM ALVENARIA, DIMENSÕES INTERNAS (0,50 X 0,50 X 0,50) M, ABERTA, SEM LAJE DE FUNDO, PREENCHIDA COM BRITA Nº 25.	UND	4,00	R\$ 89,77	R\$ 359,08	4,00		4,00	R\$ 359,08	R\$ -	R\$ 359,08	100,00%
11.0	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				R\$ 19.117,27				R\$ 18.053,11	R\$ 880,76	R\$ 18.933,87	99,04%
	<b>PONTO ELÉTRICOS</b>				R\$ 17.213,75				R\$ 16.332,99	R\$ 880,76	R\$ 17.213,75	
11.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND		R\$ 86,97	R\$ -			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
11.2	FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA ARANDELA DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM GRADE, COR BRANCA, AE 01 (P) 15W, LUMALUX OU SIM., INCLUSIVE LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA DE 15W, DEMAIS ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO.	UND	4,00	R\$ 129,45	R\$ 517,80		4,00	4,00	R\$ -	R\$ 517,80	R\$ 517,80	100,00%
11.3	FORNECIMENTO DE REFLETOR DE ALUMÍNIO MARTELADO COM VIDRO TRANSPARENTE, BRANCO, PJ 03 (P), 150W LUMALUX OU SIM, INCLUSIVE LÂMPADA HALÓGENA DE 150W, DEMAIS ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO.	UND	2,00	R\$ 64,60	R\$ 129,20		2,00	2,00	R\$ -	R\$ 129,20	R\$ 129,20	100,00%
11.4	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	6,00	R\$ 38,96	R\$ 233,76		6,00	6,00	R\$ -	R\$ 233,76	R\$ 233,76	100,00%
11.5	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO E FIAÇÃO, ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	PT	58,00	R\$ 68,97	R\$ 4.000,26	58,00		58,00	R\$ 4.000,26	R\$ -	R\$ 4.000,26	100,00%
11.6	PONTO DE TOMADA UNIV. (2P+1 T) 20A PIAL OU SIMILAR INCLUSIVE TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO, FIAÇÃO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	PT	95,00	R\$ 107,67	R\$ 10.228,65	95,00		95,00	R\$ 10.228,65	R\$ -	R\$ 10.228,65	100,00%
11.7	PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SEÇÕES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO, FIAÇÃO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ.	PT	9,00	R\$ 109,32	R\$ 983,88	9,00		9,00	R\$ 983,88	R\$ -	R\$ 983,88	100,00%
11.8	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO, FIAÇÃO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ.	PT	15,00	R\$ 74,68	R\$ 1.120,20	15,00		15,00	R\$ 1.120,20	R\$ -	R\$ 1.120,20	100,00%
	<b>OPDG</b>				R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	
11.12	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	0,00	R\$ 455,56	R\$ -			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
11.13	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUPT. 25KA-CURVA C.	UND	0,00	R\$ 155,56	R\$ -			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
11.14	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	UND	0,00	R\$ 60,67	R\$ -			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

José Sérgio Bezerra Gomes

Engenheiro Civil  
CREA: 3-1.004 - D/PEPaulo Vandevlei de M. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA: 22035 D/PE  
Mat.: 41.498Carlos Pinheiro dos Santos Gouveia  
Secretário Municipal de Desenvolvimento  
Urbano e Agrário  
Mat.: 48.911Eduardo José Vidal Marinho  
Engenheiro Civil  
CREA: 180639634 - 81 PE  
Mat.: 48.386



## BOLETIM DE MEDIÇÃO FINAL

PREEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO			BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição		Nº do CT	Data do CT				
Início da obra - data			Término obra	Empresa Contratada	CNPJ		AG. PROMOTOR OU TOMADOR					
30/04/2018			13/02/2021	SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.417.792/0001-09							
Valor total inicial (R\$)			CTEF-dt assinatura	Objeto do CTEF ( resumido)								
R\$ 524.499,00				CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM								
Valor Acumulado do contrato (R\$)			CT-Dt último Adit.	Local da obra ( Bairro / Município / UF)								
R\$ 510.015,96				LOTEAMENTO BELÉM, NO MUNICÍPIO DO PAUDALHO/PE.								
Saldo do contrato (R\$)								VALOR BOLETIM				
R\$ 14.483,94								R\$ 51.947,96				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREVISTO NO ORÇAMENTO				EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			ACUMULADO (%)
		UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	
	<b>QUADROS</b>				R\$ 1.271,38			R\$ 1.271,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.271,38	100,00%
11.15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES ERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	R\$ 418,46	R\$ 418,46	1,00		1,00	R\$ 418,46	R\$ -	R\$ 418,46	100,00%
11.16	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00	R\$ 155,56	R\$ 311,12	2,00		2,00	R\$ 311,12	R\$ -	R\$ 311,12	100,00%
11.17	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A	UND	30,00	R\$ 18,06	R\$ 541,80	30,00		30,00	R\$ 541,80	R\$ -	R\$ 541,80	100,00%
11.18	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A	UND	0,00	R\$ 28,06	R\$ -			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
11.19	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A	UND	0,00	R\$ 80,56	R\$ -			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	<b>EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA</b>				R\$ 632,14			R\$ 448,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 448,74	70,99%
11.20	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PONTO PARA REDE LÓGICA SECO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4", BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO, CAIXA PLÁSTICA, RÍGIDA, RETANGULAR 4X2" FAB. TIGRE OU SIMILAR E TAMPA CEGA 4X2" FAB. PIAL OU SIMILAR, INCLUINDO RASGO EM ALVENARIA.	PT	10,00	R\$ 27,11	R\$ 271,10	10,00		10,00	R\$ 271,10	R\$ -	R\$ 271,10	100,00%
11.21	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULAÇÃO EM PVC RÍGIDO, FIAÇÃO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ A CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DO PAVIMENTO.	PT	4,00	R\$ 45,85	R\$ 183,40			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.22	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PONTO SECO DE ANTENA EXTERNA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4", BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO, CAIXA PVC 4X2" RÍGIDA FAB. TIGRE OU SIMILAR E TAMPA CEGA 4X2" FAB. PIAL OU SIMILAR, INCLUINDO RASGO EM ALVENARIA.	PT	2,00	R\$ 88,82	R\$ 177,64	2,00		2,00	R\$ 177,64	R\$ -	R\$ 177,64	100,00%
11.23	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELERBAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	0,00	R\$ 162,15	R\$ -			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
11.24	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÓNICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M E CAIXA REFERENCIAL.	UND	0,00	R\$ 172,10	R\$ -			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
11.25	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METALICO DE EMBUTIR, COM PORTA, COM BARRAMENTO, PARA ATÉ 32 CIRCUITOS MONOPOLARES, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	UND	0,00	R\$ 530,59	R\$ -			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>12</b>	<b>DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA</b>				R\$ 927,77			R\$ -	R\$ 879,19	R\$ 879,19		
12.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	M²	354,11	R\$ 2,62	R\$ 927,77		335,57	335,57	R\$ -	R\$ 879,19	R\$ 879,19	94,76%
12.2	REMOÇÃO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHÃO CARROÇERIA, D.M.T. 6 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MANUAIS.	M³	0,00	R\$ 35,67	R\$ -			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>13</b>	<b>2º REPLANILHAMENTO</b>				R\$ 72.628,69			R\$ 51.954,59	R\$ 19.321,18	R\$ 71.275,77		98,14%
13.1	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A	UND	1,00	R\$ 1.421,85	R\$ 1.421,85	1,00		1,00	R\$ 1.421,85	R\$ -	R\$ 1.421,85	100,00%
13.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATORIO D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO, CILINDRICO, CAPACIDADE DE 5000 L, INCLUSIVE COLOCAÇÃO E MONTAGEM DAS TUBULAÇÕES E CONEXÕES.	M	68,35	R\$ 32,18	R\$ 2.199,50	68,35		68,35	R\$ 2.199,50	R\$ -	R\$ 2.199,50	100,00%
13.3		UND	1,00	R\$ 1.839,97	R\$ 1.839,97	1,00		1,00	R\$ 1.839,97	R\$ -	R\$ 1.839,97	100,00%

Paulo Vanderleide de M. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA 22065 D/PE  
Mat.: 41.498

Carlos Pinheiro de Assis Gouveia  
Secretário Municipal de Desenvolvimento  
Urbano e Agrário  
Mat.: 48.911

Eduardo José Vidal Marinho  
Engenheiro Civil  
CREA 16059634-6 / PE  
Mat.: 48.386

José Sérgio Bezerra Gomes  
Engenheiro Civil  
CREA: 340 / PE





## BOLETIM DE MEDIÇÃO FINAL

PREEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO		BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição		Nº do CT	Data do CT					
		11	01/12/2020	01/09/2020	ATÉ	30/11/2020	012/2018					
Início da obra - data		Término obra	Empresa Contratada		CNPJ	AG. PROMOTOR OU TOMADOR						
30/04/2018		13/02/2021	SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		14.417.792/0001-09							
Valor total inicial (R\$)		CTEF-dt assinatura	Objeto do CTEF ( resumido)									
R\$ 524.499,00			CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM									
Valor Acumulado do contrato (R\$)		CT-Dt último Adit.	Local da obra ( Bairro / Município / UF)									
R\$ 510.015,06			LOTEAMENTO BELÉM, NO MUNICÍPIO DO PAUDALHO/PE.									
Saldo do contrato (R\$)							VALOR BOLETIM					
R\$ 14.483,94							R\$	514.531,96				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREVISTO NO ORÇAMENTO		EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			ACUMULADO (%)		
		UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR		MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
13.4	PONTO DE INTERRUPTOR DE 3 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO, FIAÇÃO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O	PT	3,00	R\$ 123,36	R\$ 370,08	3,00		3,00	R\$ 370,08	R\$ -	R\$ 370,08	100,00%
13.5	RETRO ESCAVADEIRA SOBRE PNEUS POT.82HP - COM MAO DE OBRA DO OPERADOR E COMBUSTIVEL. (SERVICO DIURNO).	H	8,00	R\$ 160,87	R\$ 1.286,96	8,00		8,00	R\$ 1.286,96	R\$ -	R\$ 1.286,96	100,00%
13.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILM M2 E DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESURA 0,8MM) INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULSAO.	M2	101,40	R\$ 78,42	R\$ 7.951,78	101,40		101,40	R\$ 7.951,78	R\$ -	R\$ 7.951,78	100,00%
13.7	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE "20" KA (TIPO AC)	UND	2,00	R\$ 79,01	R\$ 158,02		2,00	2,00	R\$ -	R\$ 158,02	R\$ 158,02	100,00%
13.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DR, TIPO AC, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30mA, TETRAPOLAR, CORRENTE NOMINAL 63A, FAB. SIEMENS OU EQUIVALENTE	UND	1,00	R\$ 234,65	R\$ 234,65		1,00	1,00	R\$ -	R\$ 234,65	R\$ 234,65	100,00%
13.9	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm	M	85,50	R\$ 90,18	R\$ 7.710,39	85,40		85,40	R\$ 7.701,37	R\$ -	R\$ 7.701,37	99,88%
13.10	SUPORTE PARA DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm	CJ	50,00	R\$ 10,99	R\$ 534,50	50,00		50,00	R\$ 534,50	R\$ -	R\$ 534,50	100,00%
13.11	GRADE DE PROTEÇÃO DE JANELA EM FERRO COM VAROES DE 1/2". ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1" X 1/4" INCLUSIVE ASSENTAMENTO	M2	20,50	R\$ 178,69	R\$ 3.663,14	14,20	5,10	19,30	R\$ 2.537,40	R\$ 911,32	R\$ 3.448,72	94,15%
13.12	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE FERRO, DUAS DEMÃOS, COM RASPAGEM E APARELHAMENTO COM ZARCÃO	M2	55,70	R\$ 22,60	R\$ 1.258,82	26,00	27,30	53,30	R\$ 587,60	R\$ 616,98	R\$ 1.204,58	95,69%
13.13	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM. FUNDIDO NO LOCAL	M	77,46	R\$ 24,50	R\$ 1.897,77	77,46		77,46	R\$ 1.897,77	R\$ -	R\$ 1.897,77	100,00%
13.14	PORTA DE CORRER 0,90 CM , INCLUSO TRILHOS, PUXADOR E FECHADURA	M2	5,67	R\$ 349,13	R\$ 1.979,56		5,67	5,67	R\$ -	R\$ 1.979,56	R\$ 1.979,56	100,00%
13.15	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. DE 1/2 POL. COM AREJADOR, REF. 1158, LINHA C-33 SIGMA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UND	15,00	R\$ 56,25	R\$ 843,75		15,00	15,00	R\$ -	R\$ 843,75	R\$ 843,75	100,00%
13.16	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	100,00	R\$ 6,78	R\$ 678,00	98,95		98,95	R\$ 670,88	R\$ -	R\$ 670,88	98,95%
13.17	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	50,00	R\$ 10,98	R\$ 549,00	48,45		48,45	R\$ 531,98	R\$ -	R\$ 531,98	96,90%
13.18	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	7,50	R\$ 11,10	R\$ 83,25	7,50		7,50	R\$ 83,25	R\$ -	R\$ 83,25	100,00%
13.19	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND	1,00	R\$ 93,71	R\$ 93,71	1,00		1,00	R\$ 93,71	R\$ -	R\$ 93,71	100,00%
13.20	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO	UND	1,00	R\$ 431,46	R\$ 431,46	1,00		1,00	R\$ 431,46	R\$ -	R\$ 431,46	100,00%
13.21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DR, TIPO AC, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30mA, TETRAPOLAR, CORRENTE NOMINAL 100A, FAB. SIEMENS OU EQUIVALENTE	UND	1,00	R\$ 373,07	R\$ 373,07		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
13.22	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	R\$ 25,00	R\$ 2.500,00	100,00		100,00	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00	100,00%
13.23	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00	R\$ 11,68	R\$ 292,00	25,00		25,00	R\$ 292,00	R\$ -	R\$ 292,00	100,00%
13.24	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 80 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00	R\$ 16,61	R\$ 415,25	25,00		25,00	R\$ 415,25	R\$ -	R\$ 415,25	100,00%

José Sérgio Bortezzo Gomes  
Engenheiro Civil

CREA: 34.000 / E

Paulo Vandere de M. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA 220650 / PE  
Mat.: 41.498

Carlos Pinheiro de Jesus-Gouveia  
Secretário Municipal de Desenvolvimento  
Urbano e Agrário  
Mat.: 48.911

Eduardo José Vidal Marinho  
Engenheiro Civil  
CREA 18063864-8 / PE  
Mat.: 48.386



## BOLETIM DE MEDIÇÃO FINAL

PREEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO		BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição	Nº do CT	Data do CT						
		11	01/12/2020	01/09/2020 ATÉ 30/11/2020	012/2018	27/04/2018						
Início da obra - data		Término obra	Empresa Contratada		AG. PROMOTOR OU TOMADOR							
30/04/2018		13/02/2021	SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		CNPJ 14.417.792/0001-09							
Valor total inicial (R\$)		CTEF-dt assinatura	Objeto do CTEF ( resumido)									
R\$ 524.499,00			CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM									
Valor Acumulado do contrato (R\$)		CT-Dt último Adit.	Local da obra ( Bairro / Município / UF)									
R\$ 510.015,06			LOTEAMENTO BELÉM, NO MUNICÍPIO DO PAUDALHO/PE.									
Saldo do contrato (R\$)						VALOR BOLETIM						
R\$ 14.483,94						R\$ 52.947,96						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREVISTO NO ORÇAMENTO				EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			ACUMULADO (%)
		UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	
13.25	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL PARA BANCADA 1/2"OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO.	UND	11,00	R\$ 73,76	R\$ 811,36		7,00	7,00	R\$ -	R\$ 516,32	R\$ 516,32	63,64%
13.26	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000 Btus EM PAREDE, SEM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (SPLIT E CONDENSADOR NO SUPORTE); EXECUÇÃO DUTOS DE REFRIGERAÇÃO E ELETRICA, FORNECIMENTO DO GÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	9,00	R\$ 701,68	R\$ 6.315,12	9,00		9,00	R\$ 6.315,12	R\$ -	R\$ 6.315,12	100,00%
13.27	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 a 18000 Btus EM PAREDE SEM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (SPLIT E CONDENSADOR NO SUPORTE); EXECUÇÃO DUTOS DE REFRIGERAÇÃO E ELETRICA, FORNECIMENTO DO GÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	3,00	R\$ 776,45	R\$ 2.329,35	3,00		3,00	R\$ 2.329,35	R\$ -	R\$ 2.329,35	100,00%
13.28	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24000 Btus EM PAREDE, SEM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (SPLIT E CONDENSADOR NO SUPORTE); EXECUÇÃO DUTOS DE REFRIGERAÇÃO E ELETRICA, FORNECIMENTO DO GÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	R\$ 976,38	R\$ 976,38	1,00		1,00	R\$ 976,38	R\$ -	R\$ 976,38	100,00%
13.29	IMPERMEABILIZACAO DE LAJES, SUB-SOLOS, JARDINEIRAS, RESERVATÓRIOS E CANAIS DE IRRIGACAO COM MANTA ASFALTICA ESP 4 MM, APLICADA COM MACARICO, PINTADO COM PRIMER, INCLUINDO PROTECAO MECANICA, MATERIAL E MAO DE OBRA	M2	11,20	R\$ 68,99	R\$ 772,68		11,20	11,20	R\$ -	R\$ 772,68	R\$ 772,68	100,00%
13.30	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	1,00	R\$ 20,85	R\$ 20,85	1,00		1,00	R\$ 20,85	R\$ -	R\$ 20,85	100,00%
13.31	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	6,00	R\$ 40,13	R\$ 240,78	6,00		6,00	R\$ 240,78	R\$ -	R\$ 240,78	100,00%
13.32	CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7,00	R\$ 11,16	R\$ 78,26	7,00		7,00	R\$ 78,26	R\$ -	R\$ 78,26	100,00%
13.33	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	6,00	R\$ 8,08	R\$ 48,48	6,00		6,00	R\$ 48,48	R\$ -	R\$ 48,48	100,00%
13.34	JOELHO PVC 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	5,00	R\$ 5,42	R\$ 27,10	5,00		5,00	R\$ 27,10	R\$ -	R\$ 27,10	100,00%
13.35	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	20,30	R\$ 12,88	R\$ 261,46	20,30		20,30	R\$ 261,46	R\$ -	R\$ 261,46	100,00%
13.36	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	8,00	R\$ 8,63	R\$ 69,04	8,00		8,00	R\$ 69,04	R\$ -	R\$ 69,04	100,00%
13.37	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	12,00	R\$ 9,37	R\$ 112,44	12,00		12,00	R\$ 112,44	R\$ -	R\$ 112,44	100,00%
13.38	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	5,00	R\$ 27,53	R\$ 137,65	5,00		5,00	R\$ 137,65	R\$ -	R\$ 137,65	100,00%
13.39	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UND	6,00	R\$ 11,68	R\$ 70,08	6,00		6,00	R\$ 70,08	R\$ -	R\$ 70,08	100,00%

Paulo Vanderezi de M. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA 22465 D / PE  
Mat.: 41.498

Carlos Pinheiro Gouveia  
Secretário Municipal de Desenvolvimento  
Urbano e Agrário  
Mat.: 48.911

Eduardo José Vidal Marinho  
Engenheiro Civil  
CREA 180638694 - 8 / PE  
Mat.: 48.386

José Sérgio Bezerra Gomes  
Engenheiro Civil  
CREA: 34.0 / PE



## BOLETIM DE MEDIÇÃO FINAL

PREEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO		BM - número 11	BM - Data emissão 01/12/2020	BM - Período de referência da medição 01/09/2020 ATÉ 30/11/2020	Nº do CT 012/2018	Data do CT 27/04/2018
Início da obra - data 30/04/2018	Término obra 13/02/2021	Empresa Contratada SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	CNPJ 14.417.792/0001-09	AG. PROMOTOR OU TOMADOR		
Valor total Inicial (R\$) R\$ 524.499,00	CTEF-dt assinatura	Objeto do CTEF ( resumido) CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM				
Valor Acumulado do contrato (R\$) R\$ 510.015,06	CT-Dt último Adit.	Local da obra ( Bairro / Município / UF) LOTEAMENTO BELÉM, NO MUNICÍPIO DO PAUDALHO/PE.				
Saldo do contrato (R\$) R\$ 14.483,94					VALOR BOLETIM R\$	51.947,96

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREVISTO NO ORÇAMENTO				EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			ACUMULADO (%)
		UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	
13.40	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	R\$ 8,83	R\$ 44,15	5,00		5,00	R\$ 44,15	R\$ -	R\$ 44,15	100,00%
13.41	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	4,00	R\$ 7,21	R\$ 28,84	4,00		4,00	R\$ 28,84	R\$ -	R\$ 28,84	100,00%
13.42	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00	R\$ 3,46	R\$ 13,84	4,00		4,00	R\$ 13,84	R\$ -	R\$ 13,84	100,00%
13.43	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UND	2,00	R\$ 26,15	R\$ 52,30	2,00		2,00	R\$ 52,30	R\$ -	R\$ 52,30	100,00%
13.44	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	5,00	R\$ 6,70	R\$ 33,50	5,00		5,00	R\$ 33,50	R\$ -	R\$ 33,50	100,00%
13.45	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO.	M2	335,57	R\$ 2,75	R\$ 922,81	335,57	-0,0036364	335,57	R\$ 922,82	R\$ 0,010	R\$ 922,81	100,00%
13.46	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	M2	311,87	R\$ 10,31	R\$ 3.215,37	282,96		282,96	R\$ 2.917,52	R\$ -	R\$ 2.917,52	90,74%
13.47	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM	M2	70,32	R\$ 51,50	R\$ 3.621,48	70,32		70,32	R\$ 3.621,48	R\$ -	R\$ 3.621,48	100,00%
13.48	ASSENTAMENTO DE HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8"X 2.40 M COPPERWELD OU SIMILAR, COM CONECTOR PA- RALELO E PARAFUSOS (INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL).	UND	4,00	R\$ 71,46	R\$ 285,84	4,00		4,00	R\$ 285,84	R\$ -	R\$ 285,84	100,00%
13.49	BANCADA DE GRANITO POLIDO 270 X 55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	1,00	R\$ 1.441,10	R\$ 1.441,10		1,00	1,00	R\$ -	R\$ 1.441,10	R\$ 1.441,10	100,00%
13.50	BANCADA DE GRANITO POLIDO 270 X 55 CM, COM DUAS CUBAS DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,00	R\$ 1.648,99	R\$ 1.648,99		1,00	1,00	R\$ -	R\$ 1.648,99	R\$ 1.648,99	100,00%
13.51	BANCADA DE GRANITO POLIDO 270 X 55 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,00	R\$ 1.215,95	R\$ 1.215,95		1,00	1,00	R\$ -	R\$ 1.215,95	R\$ 1.215,95	100,00%
13.52	BANCADA DE GRANITO POLIDO 150 X 55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	1,00	R\$ 956,63	R\$ 956,63		1,00	1,00	R\$ -	R\$ 956,63	R\$ 956,63	100,00%
13.53	BANCADA DE GRANITO POLIDO 170 X 55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	2,00	R\$ 1.038,21	R\$ 2.076,42		2,00	2,00	R\$ -	R\$ 2.076,42	R\$ 2.076,42	100,00%

José Sergio Bezerra Gomes  
Engenheiro Civil  
CREA 18668634 - 0 / PE

Paulo Vanerlei de M. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA 22065 D / PE  
Mat.: 41.498

Carlos Pinheiro Gouveia  
Secretário Municipal de Desenvolvimento  
Urbano e Agrário  
Mat.: 48.911

Eduardo José Vidal Marinho  
Engenheiro Civil  
CREA 18668634 - 0 / PE  
Mat. 48.386



### BOLETIM DE MEDIÇÃO FINAL

<b>PREEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO</b>		BM - número <b>11</b>	BM - Data emissão <b>01/12/2020</b>	BM - Período de referência da medição <b>01/09/2020 ATÉ 30/11/2020</b>	Nº do CT <b>012/2018</b>	Data do CT <b>27/04/2018</b>
Início da obra - data <b>30/04/2018</b>	Término obra <b>13/02/2021</b>	Empresa Contratada <b>SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP</b>		CNPJ <b>14.417.792/0001-09</b>	AG. PROMOTOR OU TOMADOR	
Valor total Inicial (R\$) <b>R\$ 524.499,00</b>	CTEF-dt assinatura	Objeto do CTEF ( resumido) <b>CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM</b>				
Valor Acumulado do contrato (R\$) <b>R\$ 510.015,06</b>	CT-Dt último Adit.	Local da obra ( Bairro / Município / UF) <b>LOTEAMENTO BELÉM, NO MUNICÍPIO DO PAUDALHO/PE.</b>				
Saldo do contrato (R\$) <b>R\$ 14.483,94</b>		<b>VALOR BOLETIM</b> R\$ <b>51.947,96</b>				

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREVISTO NO ORÇAMENTO				EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			ACUMULADO (%)
		UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	
13.54	BANCADA DE GRANITO POLIDO 140 X 55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	1,00	R\$ 917,35	R\$ 917,35		1,00	1,00	R\$ -	R\$ 917,35	R\$ 917,35	100,00%
13.55	BANCADA DE GRANITO POLIDO 120 X 55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	1,00	R\$ 836,77	R\$ 836,77		1,00	1,00	R\$ -	R\$ 836,77	R\$ 836,77	100,00%
13.56	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, DE LED 36 W - 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	44,00	R\$ 85,14	R\$ 3.746,16		43,00	43,00	R\$ -	R\$ 3.661,02	R\$ 3.661,02	97,73%
13.57	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, DE LED 18 W- 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	8,00	R\$ 66,71	R\$ 533,68		8,00	8,00	R\$ -	R\$ 533,68	R\$ 533,68	100,00%
<b>TOTAIS</b>					<b>R\$ 524.499,00</b>				<b>R\$ 458.067,10</b>	<b>R\$ 51.947,96</b>	<b>R\$ 510.015,06</b>	

Observações: O item 7.2 foi medido de forma errônea e será estornado no BM-11.

**Paulo Vanderlei de M. Filho**

Engenheiro Civil  
 Resp. Técnico pela Fiscalização de Obras e Serviços  
 Nome: **Paulo Vanderlei de M. Filho**  
 CREA: 2.088.074/E  
 Mat.: 41.498

**Carlos Pinheiro Campos Louveira**  
 Secretário Municipal de Desenvolvimento

Secretário de Desenvolvimento Urbano e Agrário  
 Nome: **Carlos Pinheiro Campos Louveira**  
 Cargo: **Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Agrário**  
 Mat.: 48.911

**Eduardo José Vidal Marinho**

Apontador  
 Nome:  
 Cargo:

Engenheiro Civil  
 CREA 180638634-8 / PE  
 Mat. 48.386

Engenheiro Responsável da Empresa

Nome: **José Sérgio Bezerra Gomes**  
 Cargo: **Engenheiro Civil**  
 CREA: **34.004 - D/PE**

Representante Legal da Empresa

Nome: **José Sérgio Bezerra Gomes**  
 Cargo: **Engenheiro Civil**  
 CREA: **34.004 - D/PE**



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO

CONTRATO:  
012/2018

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BELEM

MEMÓRIA DE CÁLCULO BM 11

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	COMPR.	LARG.	ALTURA	QUANT.	TOTAL
5.0	REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO						
5.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO LATERAL (PLATIBANDAS - LADO TERRA E LADO AR) EM ESTRUTURA EM PAINÉIS DE ALUMÍNIO COMPOSITE MATERIAL - ACM REYNOLBOND, DE FABRICAÇÃO ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COMPOSTO POR COM DUAS CHAPAS DE ALUMÍNIO DE 0,5MM DE ESPESURA LADA E UM NÚCLEO DE POLIÉTERILENO DE BAIXA DENSIDADE, ACABAMENTO COM PINTURA EXTERNA EM PÓVAF - FLÚOR CARBONO - KYNAR 500 - E INTERNA EM POLIÉSTER, CHAPAS COM DIMENSÕES (125X350)CM, FIXADO EM ESTRUTURA AUXILIAR DE METALON, NA COR SEAFOAM GREEN METALIC (REF.: 604), ALUCOBOND OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE ESTRUTURA AUXILIAR EM METALON.	M2					
	PILARES		0,30	3,00	LADOS	4,00	-1,00 = -3,60
	TESTEIRA ESQUERDA		6,70	X	1,40		= 9,38
	Total Item 5.8	M2					= 5,78
6.0	COBERTA / IMPERMEABILIZAÇÃO						
6.3	IMPERMEABILIZACAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:3 COM SIKKA 1 -ESPESURA DE 3 CM.						
	CISTERNA		2,00		X	2,00	X 4,0 = 16,00
	Total Item 6.3	M2					= 16,00
7.0	ESQUADRIAS E VIDROS						
7.2	FORNECIMENTO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO, TIPO CORRER SEM BANDEIRA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO	M2					
	JA-03 (3,00X0,40)			3,00	X	0,40	X -1,00 = -1,20
	Total Item 7.2	M2					= -1,20
7.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO COM ESPESURA DE 10MM, INCLUSIVE FERRAGENS	M2					
	FACHADA			comp		altura	
				2,64	X		X 2,51 = 6,62
				7,05	X		X 2,51 = 17,69
				2,86	X		X 2,52 = 6,70
	BALCÃO-ESTOCAGEM			1,30	X		X 1,00 = 1,30
	DESCONTOS INTERNO						
	CV-02 (1,80X2,10)		1,80		X	2,10	X 1,00 = 3,78
	Total Item 7.3	M2					= 28,53
7.4	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2					
	DEPOSITO COMUM/CONTAMINADO (0,80X2,10)			2,00	X	0,50	X 2,10 = 2,10
	DEPOSITO RECICLADO (1,10X2,10)			1,00	X	1,10	X 2,10 = 2,31
	PA-03 (1,20X2,10)			1,00	X	1,20	X 2,10 = 2,52
	Total Item 7.4	M2					= 7,95
9.0	PINTURA						
9.1	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMOES AF_09/2014	M2					
	DESEMBARQUE PACIENTES			7,55	X	2,90	X = 21,89
				4,00	X	6,77	X = 26,88
	Total Item 9.1	M2					= 48,77
10.0	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS						
	LOUCAS E APARELHOS SANITARIOS						
10.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA DE LOUCA DECA VOGUE PLUS LINHA COMFORT MOD P51 (PDEFICIENTES), ACESSORIOS (PARAFUSOS DE FIXACAO, ANEL DE VEDACAO, TUBO DE LIGACAO DE PVC CROMADO ASTRA OU SIMILAR) E ASSENTO SANITARIO EM MDF LAQUEADO BRANCO SIGMOL OU SIMILAR.	UND					
	SANITARIO PCD FEM.						= 1,00
	SANITARIO PCD FEM.						= 1,00
	BANHEIRO PCD						= 1,00
	WC PCD CONSULTORIO						= 1,00
	Total Item 10.1	UND					= 4,00
10.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPAS E ACESSORIOS CORRESPONDENTE	UND					
	BANHEIRO FUNCIONARIOS						= 1,00
	Total Item 10.2	UND					= 1,00

Paulo Vaz de M. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA 22065 D/PE  
Mat.: 41.496

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
Secretário Municipal de Desenvolvimento  
Urbano e Agrário  
Mat.: 48.911

Eduardo José Vidal Marinho  
Engenheiro Civil  
CREA 18098634 - 8/PE  
Mat.: 48.386

José Sérgio Bezerra Gomes  
Engenheiro Civil  
CREA: 34.004 - D/PE



REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAIS									
10.19	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA.	UND							
	Total Item 10.19	UND							= 1,00
REDE EXTERNA									
10.38	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS ,DIAM 100MM COLUNAS DE ESGOTO,VENTILAÇÃO OU ÁGUAS PLUVIAIS.	M							
	ÁREA EXTERNA								= 29,45
	Total Item 10.37	M							= 39,45
10.39	FORNECIMENTO DE BOMBA 3/4 HP, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO	UND							
	Total Item 10.39	UND							= 1,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
11.1 PONTO ELÉTRICOS									
11.2	FORNECIMENTO DE LUMINARIA ARANDELA DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM GRADE, COR BRANCA, AE 01 (P) 15W, LUMALUX OU SIM, INCLUSIVE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA DE 15W, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALAÇÃO.	UND							
	ÁREA EXTERNA-ARANDELAS								= 4,00
	Total Item 11.2	UND							TOTAL = 4,00
11.3	FORNECIMENTO DE REFLETOR DE ALUMÍNIO MARTELADO COM VIDRO TRANSPARENTE, BRANCO, PJ 03 (P), 150W LUMALUX OU SIM, INCLUSIVE LAMPADA HALOGENA DE 150W, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALAÇÃO.	UND							
	ÁREA EXTERNA								= 2,00
	Total Item 11.3	UND							TOTAL = 2,00
11.4	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND							
	ÁREA EXTERNA								= 6,00
	Total Item 11.4	UND							TOTAL = 6,00
12.0 DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA									
12.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	M2							
	CONSULTÓRIO/ACOLHIMENTO 1		2,80	X	3,50	X			= 9,10
	SALA A INIAÇÃO		1,85	X	3,50	X			= 6,47
	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO		5,85	X	3,50	X			= 20,47
	SANITÁRIO PCD FEM.		2,10	X	2,00	X			= 4,20
	COMPRESSOR CONDONT.		0,95	X	2,00	X			= 1,90
	BANHEIRO PCD		1,70	X	3,50	X			= 5,95
	SALA OBSERVAÇÃO		2,90	X	3,50	X			= 10,15
	SALA ATIVIDADES COLETIVAS		5,90	X	3,50	X			= 20,30
	SALA ESTERILIZAÇÃO		1,40	X	3,60	X			= 5,04
	ESPURGO		1,40	X	3,60	X			= 5,04
	ALMOXARIFADO		2,11	X	1,35	X			= 2,84
	BANHEIRO FUNCIONARIOS		1,30	X	2,80	X			= 3,64
	ESTOCAGEM		4,00	X	3,50	X			= 14,00
	CONSULTÓRIO ACOLHIMENTO 2		3,33	X	3,50	X			= 11,65
	WC PCD MAS.		2,10	X	2,00	X			= 4,20
	CONSULTÓRIO C/ SANITARIO		3,33	X	3,50	X			= 11,65
	WC PCD CONSULTÓRIO		1,80	X	1,80	X			= 3,04
	DML		1,45	X	1,80	X			= 2,32
	SALA CURATIVOS		2,80	X	3,50	X			= 8,10
	SALA VACINAS		2,80	X	3,50	X			= 9,10
	SALA ADM/GERENCIA		2,80	X	3,00	X			= 7,80
	COPA		3,00	X	1,50	X			= 4,50
	CIRCULAÇÃO		2,90	X	17,18	X			= 49,82
	RECPCÃO		1,20	X	9,70	X			= 11,84
	RECPCÃO		2,90	X	7,50	X			= 21,75
	RECPCÃO		4,40	X	3,80	X			= 16,72
	ÁREA COBERTA PARA ATIVIDADES		3,10	X	4,85	X			= 14,41
	DESEMBARQUE PACIENTES		7,55	X	2,80	X			= 21,89
			4,00	X	6,72	X			= 26,88
	Total Item 12.2	M2							TOTAL = 335,57
13.0 2º REPLANILHAMENTO									
13.7	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 120 KA (TIPO AC)	UND							
	Total Item 13.7	UND							TOTAL = 2,00
13.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DR, TIPO AC, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30mA, TETRAPOLAR, CORRENTE NOMINAL 83A, FAB. SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND							
									x

**Paulo Vanders de M. Filho**  
Engenheiro Civil  
CREA 22065 D/PE  
Mat.: 41.498

**Carlos F. Pinheiro**  
Engenheiro Civil  
Secretário Municipal de Desenvolvimento  
Urbano e Agrário  
Mat.: 48.911

**Eduardo José Vidal Marinho**  
Engenheiro Civil  
CREA 180638634 - 8/PE  
Mat.: 48.386

**José Sérgio Bezerra Gomes**  
Engenheiro Civil  
CREA: 31.004 - D/PE

		Total item 13.8	UND						TOTAL	=	1,80
13.11		GRADE DE PROTECAO DE JANELA EM FERRO COM VAROES DE 1/2", ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1" X 1/4" INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	M2		X						
		GRADES - JANELAS/PORTAS									
		JA-03 (3,00X0,40)		3,00	X	0,40	X	-1,00	=	-1,20	
		CV-01 (1,80X2,10)		1,80	X	2,10	X	1,00	=	3,99	
		PA-06 (1,10X2,10)		1,10	X	2,10	X	1,00	=	2,31	
		Total item 13.11	M2						TOTAL	=	5,18
13.12		PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE FERRO, DUAS DEMAOES, COM RASPAGEM E APARELHAMENTO COM ZARCÃO.	M2		X						
		GRADES - JANELAS/PORTAS									
		CV-01 (1,80X2,10)		2,00	X	1,80	X	2,10	X	1,00	= 7,86
		PA-06 (1,10X2,10)		2,00	X	1,10	X	2,10	X	1,00	= 4,62
		DEPOSITO COMUM/CONTAMINADO (0,60X2,10)		2,00	X	2,00	X	0,60	X	2,10	= 5,04
		DEPOSITO RECICLADO (1,10X2,10)		2,00	X	1,00	X	1,10	X	2,10	= 4,82
		PA-03 (1,20X2,10)		2,00		1,00	X	1,20	X	2,10	= 5,04
		Total item 13.12	M2						TOTAL	=	27,38
13.14		PORTA DE CORRER 0,80 CM , INCLUSO TRILHOS, FLUXADOR E FECHADURA	M2								
		PM-03 (0,90X2,10)- DML		0,90			X	2,10	X	1,00	= 1,89
		PM-03 (0,90X2,10) - PCD MASC.		0,90			X	2,10	X	1,00	= 1,89
		PM-03 (0,90X2,10)- SANITARIO PCD		0,90			X	2,10	X	1,00	= 1,89
		Total item 13.14	M2								5,67
13.15		FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. DE 1/2 POL. COM AREJADOR, REF. 1158, LINHA C-33 SIGMA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO.	UND								
		CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 1									= 1,00
		CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO									= 1,00
		SANITÁRIO PCD FEM.									= 1,00
		BANHEIRO P/USU									= 1,00
		SALA ESTERILIZAÇÃO									= 1,00
		ESPURGO									= 1,00
		BANHEIRO FUNCIONARIOS									= 1,00
		CONSULTORIO ACOlhIMENTO 2									= 1,00
		WC PCD MAS.									= 1,00
		CONSULTORIO C/ SANITARIO									= 1,00
		WC PCD CONSULTORIO									= 1,00
		SALA VACINAS									= 1,00
		SALAS ATIVIDADES COLETIVAS									= 3,00
		Total item 13.15	UND								= 15,00
13.25		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL PARA BANCADA 1/2"OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO.	UND								
		CONSULTORIO ODONTOLÓGICO									= 2,00
		SALA OBSERVAÇÃO									= 1,00
		SALA CURATIVO									= 1,00
		COOPA									= 1,00
		SALA VACINA									= 1,00
		SALA DE INALAÇÃO									= 1,00
		Total item 13.25	UND								= 7,00
13.29		IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES, SUB-SOLOS, JARDINEIRAS, RESERVATORIOS E CANAIS DE IRRIGACAO COM MANTA ASFALTICA ESP 4 MM. APLICADA COM MACARICO, PINTADO COM PRIMER, INCLUINDO PROTECAO MECANICA, MATERIAL E MAO DE OBRA	M2								
		LAJE CAIXA D' ÁGUA		3,5	x	3,20	x	1			= 11,20
		Total item 13.29	M2								TOTAL = 11,20
13.49		BANCADA DE GRANITO POLIDO 270 X 55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VALVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND								
		ESPURGO									= 1,00
		Total item 13.49	UND								TOTAL = 1,00
13.50		BANCADA DE GRANITO POLIDO 270 X 55 CM, COM DUAS CUBAS DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VALVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND								
		CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO									= 1,00
		Total item 13.50	UND								TOTAL = 1,00
13.51		BANCADA DE GRANITO POLIDO 270 X 55 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND								
		ESTERILIZAÇÃO									= 1,00

**Paulo Vanderlei de M. Filho**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 22065 D/PE  
 Matr.: 41.498

**Carlos Pinheiro dos Santos Gouveia**  
 Secretário Municipal de Desenvolvimento  
 Urbano e Agrário  
 Matr.: 48.911

**Eduardo José Vidal Marinho**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-180638634-8/PE  
 Matr.: 42.296

**José Sérgio Bezerra Gomes**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 34.094 - D/PE



		Total Item 13.51	UND	=	TOTAL =	1,00
13.52		BANCADA DE GRANITO POLIDO 150 X 55 CM. COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND			
		SALA INALAÇÃO				= 1,00
		Total Item 13.52	UND	=	TOTAL =	1,00
13.53		BANCADA DE GRANITO POLIDO 170 X 55 CM. COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND			
		SALA OBSERVAÇÃO				= 1,00
		SALA CURATIVO				= 1,00
		Total Item 13.53	UND	=	TOTAL =	2,00
13.54		BANCADA DE GRANITO POLIDO 140 X 55 CM. COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND			
		COPA				= 1,00
		Total Item 13.54	UND	=	TOTAL =	1,00
13.55		BANCADA DE GRANITO POLIDO 120 X 55 CM. COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND			
		SALA VACINAS				= 1,00
		Total Item 13.55	UND	=	TOTAL =	1,00
13.56		LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR. DE LED 36 W - 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND			
		CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 2				= 2,00
		CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 1				= 2,00
		SALA INALAÇÃO				= 1,00
		CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 1				= 3,00
		SALA OBSERVAÇÃO				= 2,00
		SALA ATIVIDADES COLETIVAS				= 4,00
		SALA ESTERILIZAÇÃO				= 1,00
		EXPURGO				= 1,00
		DEPOSITO/ALMOXARIFADO				= 1,00
		BANHEIRO FUNCIONARIOS				= 1,00
		REPEÇÃO				= 4,00
		ESTOCAGEM				= 2,00
		CONSULTORIO C/ SANITARIO 1				= 2,00
		SALA CURATIVOS				= 2,00
		AREA COBERTA PARA ATIVIDADES				= 1,00
		SALA VACINAS				= 2,00
		SALA ADM/GERENCIA				= 1,00
		COPA				= 1,00
		CIRCULAÇÃO				= 6,00
		MARQUISE/GARAGEM				= 4,00
		Total Item 13.56	UND		TOTAL =	43,00
13.57		LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR. DE LED 18 W - 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND			
		SANITARIO PCD FEM.				= 1,00
		BANHEIRO PCD				= 1,00
		DEPOSITO COMUM				= 1,00
		DEPOSITO RECICLADO				= 1,00
		SANITARIO PCD MAS.				= 1,00
		WC CONSULTORIO 2				= 1,00
		DEPOSITO CONTAMINADO				= 1,00
		DML				= 1,00
		Total Item 13.57	UND		TOTAL =	8,00

Carlos Pinheiro dos Gouveia  
Secretário Municipal de Desenvolvimento  
Urbano e Agrário  
Mat.: 48.911

José Sérgio Bezerra Gomes  
Engenheiro Civil  
CREA: 34.094 - D/PE

Paulo Vandinei de M. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA 22065 D/PE  
Mat.: 41.498

Eduardo José Vidal Marinho  
Engenheiro Civil  
CREA 180698634 - 8/PE  
Mat.: 48.386



**PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO**  
**Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Agrário**

## Relatório Fotográfico

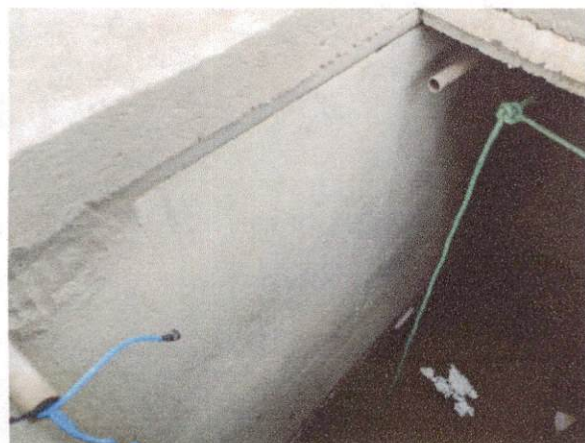
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE (UBS) BELÉM	DATA DE EMISSÃO:	01/12/2020
LOCAL:	BAIRRO DE BELÉM – PAUDALHO /PE	Nº DA MEDIÇÃO:	11
EMPRESA:	SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	Nº CONTRATO:	012/2018



**Descrição:** FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO LATERAL EM ESTRUTURA EM PAINÉIS DE ALUMINUM COMPOSITE MATERIAL – ACM REYNOBOND



**Descrição:** FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO LATERAL EM ESTRUTURA EM PAINÉIS DE ALUMINUM COMPOSITE MATERIAL – ACM REYNOBOND



**Descrição:** IMPERMEABILIZACAO, EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:3 COM SIKA 1 -ESPESSURA DE 3 CM.



**Descrição:** IMPERMEABILIZACAO, EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:3 COM SIKA 1 -ESPESSURA DE 3 CM.

*[Signature]*  
Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
Secretário Municipal de Desenvolvimento  
Urbano e Agrário  
Mat: 48.911

*[Signature]*  
José Sérgio Bazzera Gomes  
Engenheiro Civil

*[Signature]*  
Paulo Vanderlei de M. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA 22065 D/PE  
Mat: 41.498

*[Signature]*  
Eduardo José Vidal Marinho  
Engenheiro Civil  
CREA 180638634-8/PE  
Mat 48.386



**PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO**  
**Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Agrário**

## Relatório Fotográfico

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE (UBS) BELÉM	DATA DE EMISSÃO:	01/12/2020
LOCAL:	BAIRRO DE BELÉM – PAUDALHO /PE	Nº DA MEDIÇÃO:	11
EMPRESA:	SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	Nº CONTRATO:	012/2018



**Descrição:** FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE FERRAGENS.



**Descrição:** FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE FERRAGENS.




**Descrição:** PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA



**Descrição:** PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA

  
Carlos Pimenta  
Secretário Municipal de Desenvolvimento  
Urbano e Agrário  
Mat.: 48.911

  
Paulo Vanderci de M. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA 22065 D/PE  
Mat.: 41.498

  
Eduardo José Vidal Marinho  
Engenheiro Civil  
CREA 180638634 - 8 / PE  
Mat. 48.386

  
José Sérgio Bezerra Gomes  
Engenheiro Civil  
CREA: 34.004 - D/PE

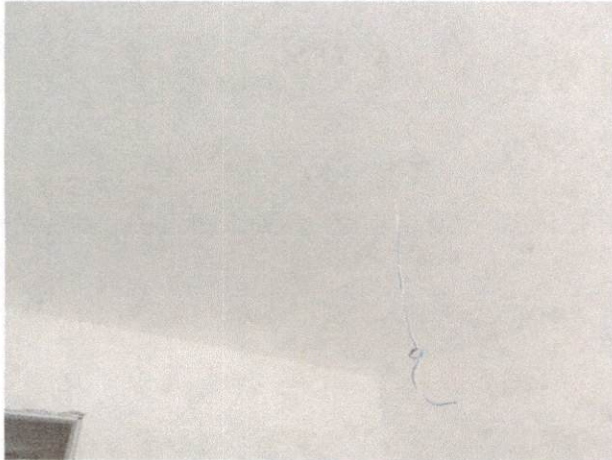
**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO**  
Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.



**PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO**  
**Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Agrário**

**Relatório Fotográfico**

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE (UBS) BELÉM	DATA DE EMISSÃO:	01/12/2020
LOCAL:	BAIRRO DE BELÉM – PAUDALHO /PE	Nº DA MEDIÇÃO:	11
EMPRESA:	SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	Nº CONTRATO:	012/2018



**Descrição:** APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.



**Descrição:** APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.



**Descrição:** FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA DECA VOGUE PLUS LINHA CONFORT MOD P51 (P/DEFICIENTES).



**Descrição:** FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA DE LOUÇA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPAS E ACESSORIOS CORRESPONDENTE

Carlos Pinheiro Lopes Gouveia  
Secretário Municipal de Desenvolvimento  
Urbano e Agrário  
Mat.: 48.911

Paulo Vandenei de M. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA 22063/D/PE  
Mat.: 41.498

Eduardo José Vidal Marinho  
Engenheiro Civil  
CREA 180638634-8/PE  
Mat. 48.386

~~José Sérgio B. Terra Gomes  
Engenheiro Civil  
CREA: 34.004 - D/PE~~

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO**  
Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.



**PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO**  
**Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Agrário**

**Relatório Fotográfico**

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE (UBS) BELÉM	DATA DE EMISSÃO:	01/12/2020
LOCAL:	BAIRRO DE BELÉM – PAUDALHO /PE	Nº DA MEDIÇÃO:	11
EMPRESA:	SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	Nº CONTRATO:	012/2018



**Descrição:** FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO SIMPLES, GRANDE, SEM COLUNA, DE LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES.



**Descrição:** FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO SIMPLES, GRANDE, SEM COLUNA, DE LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES.



**Descrição:** SABONETEIRA EM VIDRO COM SUPORTE EM AÇO INOX PARA SABÃO LÍQUIDO.



**Descrição:** PORTA PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS COM ACRÍLICO, DA JSN, REF. N7 OU SIMILAR.

~~Carlos Pinheiro Gouveia  
Secretário Municipal de Desenvolvimento  
Urbano e Agrário  
Mat.: 48.911~~

~~Paulo Vanderlei de M. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA 22065 D/PE  
Mat.: 41.498~~

~~Eduardo José Vidal Marinho  
Engenheiro Civil  
CREA 180638634-8 / PE  
Mat. 48.386~~

~~José Sérgio Bezerra Gomes  
Engenheiro Civil  
CREA: 34.004 - D/PE~~

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO**  
Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.



**PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO**  
**Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Agrário**

**Relatório Fotográfico**

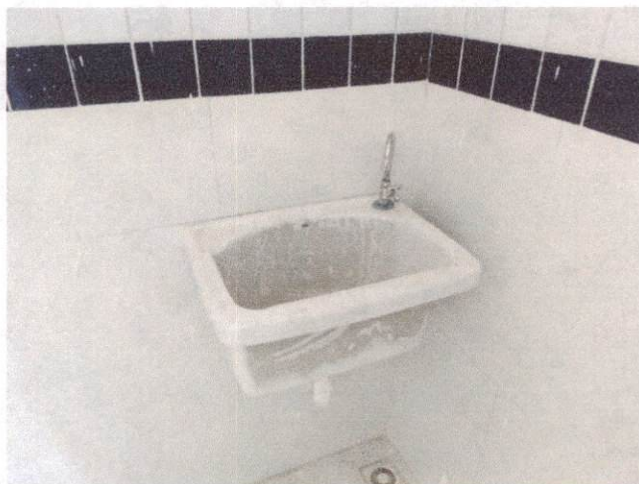
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE (UBS) BELÉM	DATA DE EMISSÃO:	01/12/2020
LOCAL:	BAIRRO DE BELÉM – PAUDALHO /PE	Nº DA MEDIÇÃO:	11
EMPRESA:	SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	Nº CONTRATO:	012/2018



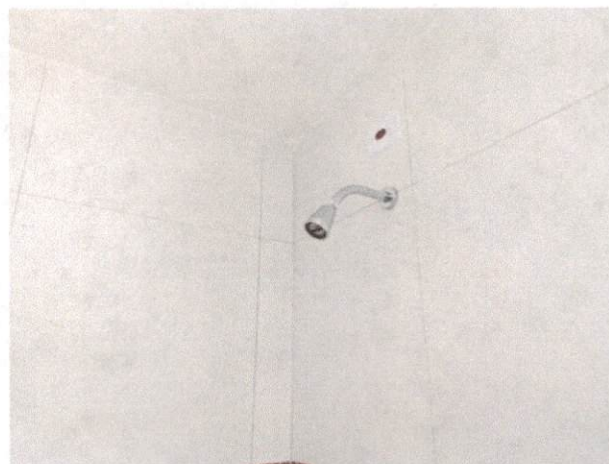
**Descrição:** FORNECIMENTO DE BANCADA EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO



**Descrição:** FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO AOS DEFICIENTES



**Descrição:** FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TANQUE DE LOUÇA, COM COLUNA, 30 LITROS, COR BRANCA.



**Descrição:** FORNECIMENTO DE CHUVEIRO DE METAL, DIAMETRO DE 1/2 POL., INCLUSIVE FIXAÇÃO

Carlos Pinheiro dos Santos Gouveia  
Secretário Municipal de Desenvolvimento  
Urbano e Agrário  
Mat.: 48.311

~~José Sérgio Bezerra Gomes~~  
Engenheiro Civil  
CREA: 31.004 - D/PE

~~Paulo Vandenberg de M. Filho~~  
Engenheiro Civil  
CREA 22065 D/PE  
Mat.: 41.498

Eduardo José Vidal Marinho  
Engenheiro Civil  
CREA 180638634-8 / PE  
Mat.: 48.396



**PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO**  
**Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Agrário**

### Relatório Fotográfico

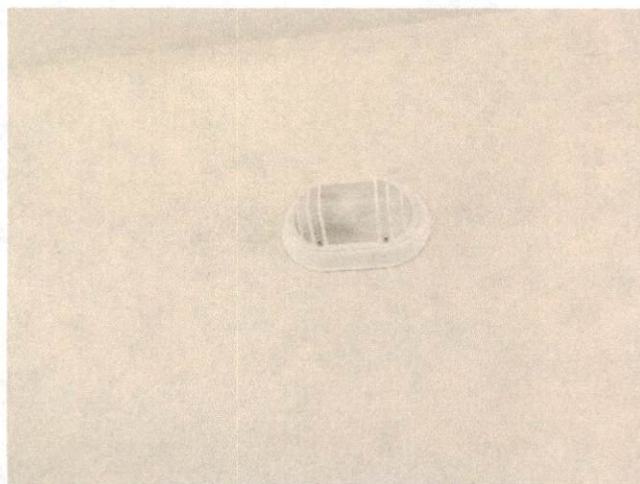
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE (UBS) BELÉM	DATA DE EMISSÃO:	01/12/2020
LOCAL:	BAIRRO DE BELÉM – PAUDALHO /PE	Nº DA MEDIÇÃO:	11
EMPRESA:	SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	Nº CONTRATO:	012/2018



**Descrição:** FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS ,DIAM. 100MM COLUNAS DE ESGOTO, VENTILAÇÃO OU ÁGUAS PLUVIAIS.



**Descrição:** FORNECIMENTO DE BOMBA 3/4 HP, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO



**Descrição:** FORNECIMENTO DE LUMINARIA ARANDELA DE ALUMINIO FUNDIDO COM GRADE, COR BRANCA.



**Descrição:** FORNECIMENTO DE REFLETOR DE ALUMINIO MARTELADO COM VIDRO TRANSPARENTE, BRANCO, PJ 03 (P), 150W LUMALUX OU SIM, INCLUSIVE LAMPADA HALOGENA DE 150W, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALAÇÃO.

*Carlos Pinheiro Campos Siqueira*  
Secretário Municipal de Desenvolvimento  
Urbano e Agrário  
Mat.: 48.911

*José Sérgio Bezerra Gomes*  
Engenheiro Civil  
CREA: 34.004 - D/PE

*Paulo Vanderlei de M. Filho*  
Engenheiro Civil  
CREA 22065 D/PE  
Mat.: 41.498

*Eduardo José Vidal Marinho*  
Engenheiro Civil  
CREA 180638634 - 8 / PE  
Mat. 48.386

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO**  
Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.



**PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO**  
**Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Agrário**

**Relatório Fotográfico**

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE (UBS) BELÉM	DATA DE EMISSÃO:	01/12/2020
LOCAL:	BAIRRO DE BELÉM – PAUDALHO /PE	Nº DA MEDIÇÃO:	11
EMPRESA:	SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	Nº CONTRATO:	012/2018



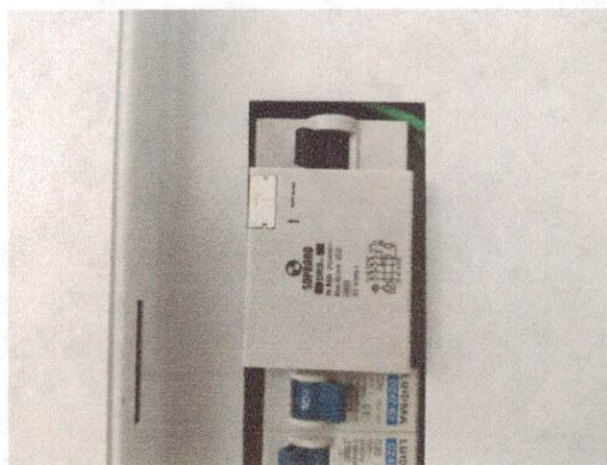
**Descrição:** LIMPEZA FINAL DA OBRA.



**Descrição:** LIMPEZA FINAL DA OBRA.



**Descrição:** DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE \*20\* KA (TIPO AC)



**Descrição:** FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DR, TIPO AC, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30mA, TETRAPOLAR, CORRENTE NOMINAL 63A.

Carlos Pinheiro  Gouveia  
Secretário Municipal de Desenvolvimento  
Urbano e Agrário  
Mat. 48.911

Paulo Vanderlei de M. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA 22065 D/PE  
Mat.: 41.498

Eduardo José Vidal Marinho  
Engenheiro Civil  
CREA 180638634-8/PE  
Mat. 48.386

~~José Sérgio Bezerra Gomes~~  
~~Engenheiro Civil~~  
~~CREA: 31.004 - D/PE~~

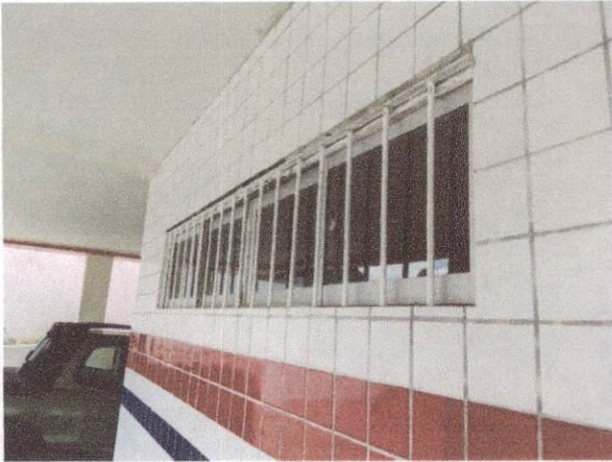




**PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO**  
**Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Agrário**

**Relatório Fotográfico**

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE (UBS) BELÉM	DATA DE EMISSÃO:	01/12/2020
LOCAL:	BAIRRO DE BELÉM – PAUDALHO /PE	Nº DA MEDIÇÃO:	11
EMPRESA:	SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	Nº CONTRATO:	012/2018



**Descrição:** GRADE DE PROTEÇÃO DE JANELA EM FERRO/ PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIA DE FERRO, DUAS DEMÃOS, COM RASPAGEM E APARELHAMENTO COM ZARCÃO.



**Descrição:** GRADE DE PROTEÇÃO DE JANELA EM FERRO/ PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIA DE FERRO, DUAS DEMÃOS, COM RASPAGEM E APARELHAMENTO COM ZARCÃO.



**Descrição:** PORTA DE CORRER 0,90 CM , INCLUSO TRILHOS, PUXADOR E FECHADURA



**Descrição:** PORTA DE CORRER 0,90 CM , INCLUSO TRILHOS, PUXADOR E FECHADURA

Carlos Pinheiro Santos Gouvêa  
Secretário Municipal de Desenvolvimento  
Urbano e Agrário  
Mat: 48.911

Paulo Vanderlei de M. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA 22065 D / PE  
Mat.: 41.498

Eduardo José Vidal Marinho  
Engenheiro Civil  
CREA 180638634-8 / PE  
Mat 48.386

José Sérgio Bezerra Gomes  
Engenheiro Civil  
CREA: 3.1.004 - D/PE

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO**  
Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.



**PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO**  
**Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Agrário**

## Relatório Fotográfico

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE (UBS) BELÉM	DATA DE EMISSÃO:	01/12/2020
LOCAL:	BAIRRO DE BELÉM – PAUDALHO /PE	Nº DA MEDIÇÃO:	11
EMPRESA:	SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	Nº CONTRATO:	012/2018



**Descrição:** FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. DE 1/2 POL. COM AREJADOR, REF. 1158, LINHA C-33 SIGMA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO..



**Descrição:** FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. DE 1/2 POL. COM AREJADOR, REF. 1158, LINHA C-33 SIGMA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO..



**Descrição:** IMPERMEABILIZACAO DE LAJES, SUB-SOLOS, JARDINEIRAS, RESERVATORIOS E CANAIS DE IRRIGACAO COM MANTA ASFALTICA ESP.4 MM, APLICADA COM MACARICO, PINTADO COM PRIMER, INCLUINDO PROTECAO MECANICA, MATERIAL E MAO DE OBRA.



**Descrição:** IMPERMEABILIZACAO DE LAJES, SUB-SOLOS, JARDINEIRAS, RESERVATORIOS E CANAIS DE IRRIGACAO COM MANTA ASFALTICA ESP.4 MM, APLICADA COM MACARICO, PINTADO COM PRIMER, INCLUINDO PROTECAO MECANICA, MATERIAL E MAO DE OBRA.

Carlos Filipe  
Secretário Municipal de Desenvolvimento  
Urbano e Agrário  
Mat: 48.911

Paulo Vancenes de M. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA 22065 D/PE  
Mat: 41.498

Eduardo José Vidal Marinho  
Engenheiro Civil  
CREA 180638634-8/PE  
Mat. 48.386

José Sérgio Bezerra Gomes  
Engenheiro Civil  
CREA: 34.004- D/PE

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO**  
Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.



**PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO**  
**Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Agrário**

## Relatório Fotográfico

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE (UBS) BELÉM	DATA DE EMISSÃO:	01/12/2020
LOCAL:	BAIRRO DE BELÉM – PAUDALHO /PE	Nº DA MEDIÇÃO:	11
EMPRESA:	SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	Nº CONTRATO:	012/2018



**Descrição:** BANCADA DE GRANITO POLIDO 270 X 55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.



**Descrição:** BANCADA DE GRANITO POLIDO 270 X 55 CM, COM DUAS CUBAS DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.



**Descrição:** BANCADA DE GRANITO POLIDO 270 X 55 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.



**Descrição:** BANCADA DE GRANITO POLIDO 170 X 55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Carlos Francisco Campos Louveira  
Secretário Municipal de Desenvolvimento  
Urbano e Agrário  
Mat.: 48.911

Paulo Vandinei de M. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA 22065 D/PE  
Mat.: 41.498

Eduardo José Vidal Marinho  
Engenheiro Civil  
CREA 180638634 - 8 / PE  
Mat.: 48.386

José Sérgio Bezerra Gomes  
Engenheiro Civil  
CREA: 180638634 - 8 / PE

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO**

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.



**PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO**  
**Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Agrário**

## Relatório Fotográfico

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE (UBS) BELÉM	DATA DE EMISSÃO:	01/12/2020
LOCAL:	BAIRRO DE BELÉM – PAUDALHO /PE	Nº DA MEDIÇÃO:	11
EMPRESA:	SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	Nº CONTRATO:	012/2018



**Descrição:** LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, DE LED 36 W - 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO



**Descrição:** LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, DE LED 36 W - 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO




**Descrição:** LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, DE LED 18 W- 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO



**Descrição:** LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, DE LED 18 W- 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

  
Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
Secretário Municipal de Desenvolvimento  
Urbano e Agrário  
Mat: 48.911

  
Paulo Vandeney de M. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA 22065 D / PE  
Mat: 41.498

  
Eduardo José Vidal Marinho  
Engenheiro Civil  
CREA 180638634 - 8 / PE  
Mat 48.386

  
José Sérgio Bezerra Gomes  
Engenheiro Civil  
CREA: 34.004 - D/PE

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO**  
Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP				DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM				Data: 01/09/2020			
OBRA:		UBS BELÉM		Tempo	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO				Manhã			
INÍCIO				Tarde			
PRAZO RESTANTE				Noite			
Equipam.	Betoneira						
	Maquita				Lixadeira		
	Parafuzadeira				Furadeira		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		01	Encanador			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor		03	
	Armador			Vidraceiro			
	Servente		04	Serralheiro			
Serviços Executados	Hoy estamos realizando a pintura interna da UBS						
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Visto Fiscalização Engenheiro Civil Visto da Contratada:				José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE			

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 02/09/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado			Encanador		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro			Pintor		03
	Armador			Vidraceiro		
	Servente		04	Serralheiro		
Serviços Executados	Estamos realizando a pintura interna da UBS					
Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:		José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE	

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr.: 41.498

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 03/03/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro		Pintor	03		
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	04	Serralheiro			
Serviços Executados	Estamos realizando a pintura das portas					

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vandoirlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 47.846

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 04/09/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro		Pintor	03		
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	04	Serralheiro			
Serviços Executados	Estamos fazendo a pintura de grades de grades de					
	grades.					

Visto Fiscalização:

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderleide de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 41.545

Visto da Contratada:

José Sérgio B. Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D PE

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - DIPE



SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 05/09/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro		Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente		Serralheiro			
Serviços Executados	Faz-se da o descanso dos funcionários					

Visto Fiscalização:


*[Signature]*  
 Prefeitura Municipal de Paudalho PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr.: 41.498


Visto da Contratada:

*[Signature]*  
 José Sérgio B. Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D PE

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 06/09/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado			Encanador		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro			Pintor		
	Armador			Vidraceiro		
	Servente			Serralheiro		
Serviços Executados	Faz-se da o descanso dos funcionarios					

  
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Mat.: 41.498

  
 José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - DIPE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 07/09/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro		Pintor	03		
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	05	Serralheiro			
Serviços Executados	Estamos realizando a pintura e colocação da ACM da fachada.					

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Mat. 41.498


José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - DIPE


SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 08/09/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro		Pintor	03		
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	05	Serralheiro			
Serviços Executados	Realização de pintura e esmelçada de ACM					
	Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:		José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.498

José Sérgio Bezerra Gomes  
Engenheiro Civil  
CREA: 34.004 - D/PE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 09/09/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado			Encanador		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro			Pintor		06
	Armador			Vidraceiro		
	Servente		05	Serralheiro		
Serviços Executados	Pintura de grades de janela e realizando a selagem de ACM					
Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:		José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE	

  
 Prefeitura Municipal de Paulo Afonso/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 41.498

  
 José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 10/09/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador			
	Carpinteiro	02	Eletricista			
	Pedreiro		Pintor	02		
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	04	Serralheiro			
Serviços Executados	Assentamento de portas e pintura					

Visto Fiscalização:

*[Signature]*  
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Mat. 1.496

Visto da Contratada:

*[Signature]*  
 José Sérgio B. Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS				
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 11/09/2020				
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte	
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã				
INÍCIO			Tarde				
PRAZO RESTANTE			Noite				
Equipam.	Betoneira						
	Maquita		Lixadeira				
	Parafuzadeira		Furadeira				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador				
	Carpinteiro	02	Eletricista				
	Pedreiro		Pintor	02			
	Armador		Vidraceiro				
	Servente	04	Serralheiro				
Serviços Executados	Assentamento de portas e pintura						
Visto Fiscalização:		Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat. 41.498		Visto da Contratada:		José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE	

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 12/09/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado			Encanador		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro			Pintor		
	Armador			Vidraceiro		
	Servente			Serralheiro		
Serviços Executados	<i>Hoje se dá o descanso dos funcionários</i>					
	Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:		José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Mat.: 41.498

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE



SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 13/09/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro		Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente		Serralheiro			
Serviços Executados	<i>Hoje se dá o descanso das funcionárias</i>					

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vandell de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 41.498

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 14/09/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro		01	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado			Encanador		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro		02	Pintor		
	Armador			Vidraceiro		
	Servente		04	Serralheiro		
Serviços Executados	Instalações de balcões de mármore					

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 41.498

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 15/09/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	02	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	04	Serralheiro			
Serviços Executados	Assentamento dos lajeiros de marmora					

Visto Fiscalização:

*[Assinatura]*  
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 41.498

Visto da Contratada:

*[Assinatura]*  
 José Sérgio B. Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 16/09/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro		01	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado			Encanador		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro		02	Pintor		
	Armador			Vidraceiro		
	Servente		04	Serralheiro		
Serviços Executados	Assentamento de laje e marmore					

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 41.494

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - DIPE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 17/09/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	02	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	04	Serralheiro			
Serviços Executados	Assentamento de laje de concreto					

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. nº. 441

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 18/09/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	02	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	04	Serralheiro			
Serviços Executados	Assentamento de laje de marmore					
	Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:		José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D PE

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Mat. 41.498

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 19/09/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado			Encanador		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro			Pintor		
	Armador			Vidraceiro		
	Servente			Serralheiro		
Serviços Executados	<i>Hoje se dá o descanso dos funcionários</i>					
	Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:		José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Mat. 41.498

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 20/09/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado			Encanador		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro			Pintor		
	Armador			Vidraceiro		
	Servente			Serralheiro		
Serviços Executados	Faz-se da o descanso dos funcionarios					
Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:		<del>           José Sérgio B. Gomes            Engenheiro Civil            CREA: 34.004 - D/PE         </del>	

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Mat.: 41.498

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE




SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 21/09/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadiera		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro		Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente		Serralheiro			
Serviços Executados	Impermeabilização da laje da Caixa de água					

Prefeitura Municipal de Pau d'Alho  
 Paulo Vande Mello de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Mat.: 41.498


Visto da Contratada: José Sérgio B. Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 22/09/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	02	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	03	Serralheiro			
Serviços Executados	Assentamento de lajeiras e lajeiras sanitarias					

  
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vandelei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 41.494

Visto da Contratada:

  
 José Sérgio B. Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 23/09/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	02	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	03	Serralheiro			
Serviços Executados	Assentamento de laçãos e laçãos sanitários					
Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:		José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE	

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 41.398

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 24/09/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	02	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	04	Serralheiro			
Serviços Executados	Hoje estamos realizando a colocação das arandelas e fazenda e rampa.					
Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:		José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE	

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat. 41.498

José Sérgio Bezerra Gomes  
Engenheiro Civil  
CREA: 34.004 - D/PE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 25/09/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista	01		
	Pedreiro		Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	03	Serralheiro			
Serviços Executados	estamos colocando os refletores da obra.					
Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:		José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE	

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Mat. 41.498

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 26/09/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado			Encanador		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro			Pintor		
	Armador			Vidraceiro		
	Servente			Serralheiro		
Serviços Executados	folha se da o descanso dos funcionarios					
Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:		José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D PE	

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Mat.: 41.498

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP				DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM				Data: 27/09/2020			
OBRA:		UBS BELÉM		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO				Manhã			
INÍCIO				Tarde			
PRAZO RESTANTE				Noite			
Equipam.	Betoneira						
	Maquita				Lixadeira		
	Parafuzadeira				Furadeira		
Pessoal	Descrição		Quant.		Descrição		Quant.
	Engenheiro				Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado				Encanador		
	Carpinteiro				Eletricista		
	Pedreiro				Pintor		
	Armador				Vidraceiro		
	Servente				Serralheiro		
Serviços Executados	Hoje se dá o descanso das funcionárias						

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Mat.: 41.498

Visto Fiscalização: *[assinatura]*  
 Visto da Contratada: *[assinatura]*  
 José Sérgio B. Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE  
 José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 28/09/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	02	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	04	Serralheiro			
Serviços Executados	Colocação das sabinetiras					
Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:		José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE	

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Mat.: 41.498

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE



SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 29/09/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	02	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	04	Serralheiro			
Serviços Executados	Assentamento das lajeiras de apoio					
Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:		José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE	

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Mat.: 41.496

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 30/09/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	02	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	04	Serralheiro			
Serviços Executados	Assentamento de pisos					
Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:		José Sérgio B. Gomes		
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vandenberg de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498				Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D PE		
				José Sérgio Bezerra Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - DIPE		

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 01/10/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro		Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente		Serralheiro			
Serviços Executados	<p><i>Não está sendo feita a organização da obra</i></p>					



Visto Fiscalização:

*4-*  
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vandenir de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 41.498

Visto da Contratada:

~~José Sérgio B. Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE~~

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 02/00/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	02	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
Servente	04	Serralheiro				
Serviços Executados	Hoje está sendo feito a limpeza da obra.					
Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:		José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D PE		
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 41.498				 José Sérgio Bezerra Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - DIPE		

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 03/10/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado			Encanador		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro			Pintor		
	Armador			Vidraceiro		
	Servente			Serralheiro		
Serviços Executados	Hoje se da o descanso dos funcionários					
	Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:		José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D PE

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.498

José Sérgio Bezerra Gomes  
Engenheiro Civil  
CREA: 34.004 - D/PE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 04/10/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadiera		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro		Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente		Serralheiro			
Serviços Executados	Hoje se da a limpeza das fundações					
	Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:		José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D PE

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 47.194

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 05/10/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	02	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	04	Serralheiro			
Serviços Executados	Hoje estamos realizando a lavagem do piso					

Visto Fiscalização:

*Mr*  
 Prefeitura Municipal de Paudalho  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Mat. 41.498

Visto da Contratada:

*Mr*  
 José Sérgio B. Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D PE

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - DIPE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 06/10/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro		Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	05	Serralheiro			
Serviços Executados	Slab está sendo feita a lavagem do piso					
Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:		José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D PE	

Prefeitura Municipal de Paudalho PE  
 Paulo Van derlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 47.498

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE



SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 07/10/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro		Pintor	03		
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	05	Serralheiro			
Serviços Executados	Esta sendo feita retoques na pintura					

Visto Fiscalização:

*u*  
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Mat. 41.498

Visto da Contratada:

~~José Sérgio B. Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D PE~~

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - DIPE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 08/10/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro		01	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado			Encanador		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro		02	Pintor		
	Armador			Vidraceiro		
	Servente		04	Serralheiro		
Serviços Executados	Esta sendo feita a relação dos preços da ar condicionado					

Visto Fiscalização:

*M.*  
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Mat.: 41.498

Visto da Contratada:

*J.S.G.*  
 José Sérgio B. Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D PE

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - DIPE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 09/10/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	02	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	04	Serralheiro			
Serviços Executados	Esta sendo feito a relocação dos drenos					

Visto Fiscalização:

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vandinei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 41.498

Visto da Contratada:

~~José Sérgio B. Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE~~

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 10/10/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro		Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente		Serralheiro			
Serviços Executados	<i>Hay si da o descanso dos funcionários</i>					

Visto Fiscalização:

*[Signature]*  
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vandertel de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Mat. 41.498

Visto da Contratada:

*[Signature]*  
 José Sérgio B. Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE

*[Signature]*  
 José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 11/10/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadiera		Furadeira			
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado			Encanador		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro			Pintor		
	Armador			Vidraceiro		
	Servente			Serralheiro		
Serviços Executados	<i>Hoje se dá o descanso dos funcionários</i>					

Visto Fiscalização:


*[Assinatura]*  
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 41.498

Visto da Contratada:


*[Assinatura]*  
 José Sérgio B. Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 12/10/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	02	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	04	Serralheiro			
Serviços Executados	Estamos fazendo a colocação dos rebocos					


  
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 41.498

Visto da Contratada:


  
 José Sérgio B. Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D PE

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - DIPE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 13/10/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	02	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	04	Serralheiro			
Serviços Executados	esta sendo feita a colocação dos tampões de pia					

  
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 41.398

Visto da Contratada:

  
 José Sérgio B. Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 14/10/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	02	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	03	Serralheiro			
Serviços Executados	Esta sendo feita a colocação dos chumbros					

Visto Fiscalização: Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat. 41.498

Visto da Contratada:

~~José Sérgio B. Gomes  
Engenheiro Civil  
CREA: 34.004 - D/PE~~

José Sérgio Bezerra Gomes  
Engenheiro Civil  
CREA: 34.004 - D/PE



SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 15/10/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro		01	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado			Encanador		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro		03	Pintor		
	Armador			Vidraceiro		
	Servente		02	Serralheiro		
Serviços Executados	Esta sendo feito o teste de todas conexões					
	Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:		José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vagnerlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 47.246

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 16/10/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	02	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	03	Serralheiro			
Serviços Executados	Esta sendo feito o teste da lâmbra de água					

Visto Fiscalização:

*[Assinatura]*  
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderleide Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 1.498

Visto da Contratada:

*[Assinatura]*  
 José Sérgio B. Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - DI/PE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 17/10/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro		Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente		Serralheiro			
Serviços Executados	<i>folha de o descargo dos funcionários</i>					

Visto Fiscalização: *[assinatura]*  
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vandeir de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 41.496

Visto da Contratada:

*[assinatura]*  
 José Sérgio B. Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D PE

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - DIPE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 18/10/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado			Encanador		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro			Pintor		
	Armador			Vidraceiro		
	Servente			Serralheiro		
Serviços Executados	Hoje se deu o desmonte dos funiceiros					
Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:		José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D PE	
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanerlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat. 41.498					José Sérgio Bezerra Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - DIPE	

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 19/10/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	01	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	02	Serralheiro			
Serviços Executados	Esta sendo o teste das conexões hidráulicas					

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 41.498

Visto da Contratada: José Sérgio B. Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D PE

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 20/10/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	02	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	03	Serralheiro			
Serviços Executados	Esta sendo feita troca e reparos das canalizações com defeito.					

Visto Fiscalização:

*[Signature]*  
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 34.004

Visto da Contratada:


*[Signature]*  
 José Sérgio B. Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D PE

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE


SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 29/10/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista	02		
	Pedreiro		Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	04	Serralheiro			
Serviços Executados	Esta sendo feita os reparos necessários em algumas tomadas					
Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:		José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D PE	
Prefeitura Municipal de Paudalho Paulo Vanerlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 41.498						

José Sérgio Bezerra Gomes  
Engenheiro Civil  
CREA: 34.004 - DIPE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 30/10/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado			Encanador		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro			Pintor		
	Armador			Vidraceiro		
	Servente			Serralheiro		
Serviços Executados	Nay está sendo feita a teste da bomba de água					

  
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderley de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 41.498

Visto da Contratada:

  
 José Sérgio B. Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D PE

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - DIPE



SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 31/10/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado			Encanador		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro			Pintor		
	Armador			Vidraceiro		
	Servente			Serralheiro		
Serviços Executados	<i>Hoje se dá o descanso dos funcionários</i>					

Visto Fiscalização:

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 41.494

Visto da Contratada:

~~José Sérgio B. Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D PE~~

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - DIPE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 01/11/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro		Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente		Serralheiro			
Serviços Executados	Hoje se da o descanso dos funcionários					

Visto Fiscalização:

*[Assinatura]*  
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr.: 41.498

Visto da Contratada:

*[Assinatura]*  
 José Sérgio B. Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D PE

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - DIPE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 02/11/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	02	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	03	Serralheiro			
Serviços Executados	Hoje está sendo feito o assentamento das grades					

Visto Fiscalização:

*[Assinatura]*  
 Prefeitura Municipal de Paudalho  
 Paulo Wanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 47.498

Misto da Contratada:

*[Assinatura]*  
 José Sérgio B. Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 03/11/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadiera		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	02	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
Servente	03	Serralheiro				
Serviços Executados	Assentamento dos grades					

Visto Fiscalização:

*[Signature]*  
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 41.454

Visto da Contratada:

*[Signature]*  
 José Sérgio B. Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 04/11/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	02	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	04	Serralheiro			
Serviços Executados	Assentamento das grades					

Visto Fiscalização:

*[Assinatura]*  
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanerlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 41.498

Visto da Contratada:

*[Assinatura]*  
 José Sérgio B. Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE

*[Assinatura]*  
 José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 05/11/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadiera		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro		Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente		Serralheiro			
Serviços Executados	Assentamento das grades.					

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Mat. 47.495

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 06/11/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro		Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente		Serralheiro			
Serviços Executados	Assentamento das grades.					

Visto Fiscalização:

*[Signature]*  
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 41.498

Visto da Contratada:

*[Signature]*  
 José Sérgio B. Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS				
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 07/11/2020				
OBRA:		UBS BELÉM		Tempo	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO				Manhã			
INÍCIO				Tarde			
PRAZO RESTANTE				Noite			
Equipam.	Betoneira						
	Maquita		Lixadeira				
	Parafuzadiera		Furadeira				
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Encanador			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Vidraceiro			
	Servente			Serralheiro			
Serviços Executados	Hoje se da a distancia dos funcionários						

Visto Fiscalização:

*M.*  
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 41.492

Visto da Contratada:

*J.S.G.*  
 José Sérgio B. Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D PE

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - DIPE



SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 08/11/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadiera		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro		Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente		Serralheiro			
Serviços Executados	Hoje se da o descanso das funcionárias					

Visto Fiscalização:

*[Assinatura]*  
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vandinei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 41.100

Visto da Contratada:

*[Assinatura]*  
 José Sérgio B. Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 09/11/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	02	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	03	Serralheiro			
Serviços Executados	estamos preparando as grades para pintura					

Visto Fiscalização:

~~Paulo Vanderlei de Mendonça Filho~~  
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Engenheiro Civil  
 M. 41.25-

Visto da Contratada:

~~José Sérgio B. Gomes~~  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 10/11/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	02	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	03	Serralheiro			
Serviços Executados	Estamos preparando as grades para pintura.					

Visto Fiscalização:

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 41.498

Visto da Contratada:

José Sérgio B. Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 11/11/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	02	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	03	Serralheiro			
Serviços Executados	Estamos dando a primeira mão nas grades.					

Visto Fiscalização:

*[Signature]*  
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Mat. 41.398

Visto da Contratada:

*[Signature]*  
 José Sérgio B. Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D PE

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - DIPE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 12/11/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	02	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	03	Serralheiro			
Serviços Executados	Estamos dando a primeira limpeza nas grades.					

Visto Fiscalização: Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
M= 07.498

Visto da Contratada:

~~José Sérgio B. Gomes  
Engenheiro Civil  
CREA: 34.004 - D/PE~~

José Sérgio Bezerra Gomes  
Engenheiro Civil  
CREA: 34.004 - D/PE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 13/11/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	02	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	03	Serralheiro			
Serviços Executados	Estamos dando a primeira demão nas grades.					

Visto Fiscalização:

Prefeitura Municipal de Paudalópolis  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 21.114

Visto da Contratada:

José Sérgio B. Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D PE

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - DIPE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 14/11/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro		Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente		Serralheiro			
Serviços Executados	Hoje se da o deslargo dos funcionários					
Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:		José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D PE		
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat. 21.295						

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - DIPE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 15/11/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro		Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente		Serralheiro			
Serviços Executados	<i>folha de dia e descanso dos funcionários</i>					
	Visto Fiscalização: Prefeitura Municipal de Paulo Vitorino Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE			Visto da Contratada:		José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE



SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 16/11/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro		Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente		Serralheiro			
Serviços Executados	Estamos fazendo a pintura das grades.					

Visto Fiscalização:

~~Prefeitura Municipal de Paudalho  
Paulo Van derlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat. 41.149~~

Visto da Contratada:

~~José Sérgio B. Gomes  
Engenheiro Civil  
CREA: 34.004 - D PE~~

José Sérgio Bezerra Gomes  
Engenheiro Civil  
CREA: 34.004 - DIPE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 17/11/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	02	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	03	Serralheiro			
Serviços Executados	Estamos realizando a pintura das grades					
Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:		José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D PE		
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vandetei de Mendonça Filho Engenheiro Civil M. 4. 104				José Sérgio Bezerra Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE		

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 18/11/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	02	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	03	Serralheiro			
Serviços Executados	Estamos dando alguns retoques na pintura					

Visto Fiscalização:

Prefeitura Municipal de Paudalino/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat. 31.394

Visto da Contratada:

José Sérgio B. Gomes  
Engenheiro Civil  
CREA: 34.004 - D/PE

José Sérgio Bezerra Gomes  
Engenheiro Civil  
CREA: 34.004 - D/PE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 19/11/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado			Encanador		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro			Pintor		
	Armador			Vidraceiro		
	Servente			Serralheiro		
Serviços Executados	<i>Estamos realizando retoques nos rejuntas</i>					

Visto Fiscalização:

*[Assinatura]*  
 Prefeitura Municipal de Paudalino/PE  
 Paulo Vanderci de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 41.251

Visto da Contratada:

~~José Sérgio B. Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D PE~~

*[Assinatura]*  
 José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 20/11/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	02	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	02	Serralheiro			
Serviços Executados	Estamos fazendo a troca de algumas pedras de porcelanato.					
Visto Fiscalização:		Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vandinei de Mendonça Filho Engenheiro Civil M. 21.205		Visto da Contratada:		José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D PE

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - DIPE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 21/11/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro		Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente		Serralheiro			
Serviços Executados	Hoje se da o descanso dos funcionários					
Visto Fiscalização: Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil M3.41.099			Visto da Contratada:		José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE	

José Sérgio Bezerra Gomes  
Engenheiro Civil  
CREA: 34.004 - D/PE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 22/10/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro		Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente		Serralheiro			
Serviços Executados	<i>Hoje se dá o descanso dos funcionários</i>					

Visto Fiscalização:

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 498

Visto da Contratada:

~~José Sérgio B. Gomes~~  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D PE

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - DIPE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS				
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 23/11/2020				
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte	
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã				
INÍCIO			Tarde				
PRAZO RESTANTE			Noite				
Equipam.	Betoneira						
	Maquita		Lixadeira				
	Parafuzadeira		Furadeira				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador				
	Carpinteiro		Eletricista				
	Pedreiro	02	Pintor				
	Armador		Vidraceiro				
	Servente	03	Serralheiro				
Serviços Executados	Estamos rejuntando algumas pedras de porcelanato.						
Visto Fiscalização:		Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 41.498		Visto da Contratada:		José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE	

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE



SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 24/11/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	02	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	03	Serralheiro			
Serviços Executados	Estamos fazendo traços de pastilhas 10x10					

Visto Fiscalização: *[assinatura]*  
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr.: 1.498

Visto da Contratada:

*[assinatura]*  
 José Sérgio B. Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D PE

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - DIPE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 25/11/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	02	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	03	Serralheiro			
Serviços Executados	Começamos a fazer a limpeza da obra.					
Visto Fiscalização:		Prefeitura Municipal de Pauçano/PE Paylo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mst. 41.498	Visto da Contratada:		José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D PE	

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - DIPE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 26/11/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro		01	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado			Encanador		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro		02	Pintor		
	Armador			Vidraceiro		
	Servente		03	Serralheiro		
Serviços Executados	Estamos fazendo a limpeza da obra.					

Visto Fiscalização Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 241

Visto da Contratada:

José Sérgio B. Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D PE

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 27/11/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	02	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	03	Serralheiro			
Serviços Executados	<i>Estamos fazendo a limpeza da obra.</i>					
	Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:		
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Van der Mende de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 41.205			José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE			

José Sérgio Bezerra Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 34.004 - D/PE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 28/11/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro			Almojarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado			Encanador		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro			Pintor		
	Armador			Vidraceiro		
	Servente			Serralheiro		
Serviços Executados	<i>Stop se da o descanso dos funcionários</i>					

Visto Fiscalização: Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho

Visto da Contratada:

José Sérgio B. Gomes  
Engenheiro Civil  
CREA: 34.004 - D PE

Engenheiro Civil  
M31 41 498

José Sérgio Bezerra Gomes  
Engenheiro Civil  
CREA: 34.004 - D/PE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 29/11/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro		Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente		Serralheiro			
Serviços Executados	Hoje se da o descanso dos funcionários					

Visto Fiscalização:

Paulo Vanderleide Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat. 41.498

Visto da Contratada:

José Sérgio B. Gomes  
Engenheiro Civil  
CREA: 34.004 - D PE

José Sérgio Bezerra Gomes  
Engenheiro Civil  
CREA: 34.004 - DIPE

SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			DIARIO DE OBRAS			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			Data: 30/11/2020			
OBRA:	UBS BELÉM		Tempo	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Betoneira					
	Maquita		Lixadeira			
	Parafuzadeira		Furadeira			
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro		01	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado			Encanador		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro		02	Pintor		
	Armador			Vidraceiro		
	Servente		04	Serralheiro		
Serviços Executados	Hoje foi realizada a limpeza final da obra.					
Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:		José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D PE	
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 41.204					José Sérgio Bezerra Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - DIPE	
